

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 1 de 118

## II INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Julio – septiembre 2022

### Introducción

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre: julio a septiembre 2022 con el fin de documentar el informe trimestral de seguimiento sobre el avance de los procesos de ejecución de los Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Rural, según lo definido en el Decreto 2364 del 2015, artículo 25 numeral 4.

El informe desarrolla 5 acápite enmarcados en temas como seguimiento de proyectos donde se evidencia el estado y el porcentaje de avance. Desarrolla el capítulo de monitoreo, que evidencia los proyectos monitoreados durante el trimestre, así mismo se presentan los indicadores que miden el cumplimiento de las acciones a desarrollar y los niveles de cubrimiento de los proyectos de acuerdo con variables definidas por la Dirección. Adicionalmente se presenta el capítulo de alertas, aquellas que fueron objeto de identificación dentro del trimestre y las acumuladas a la fecha, con los planes de mejoramiento que se han formulado producto de las alertas abiertas de acuerdo con lo establecido en el reglamento que entró en vigencia el 1 enero del 2020. El capítulo de lecciones aprendidas identificadas en el ejercicio de seguimiento y monitoreo a los proyectos como medida de acciones de mejora o buenas prácticas, culminando con las conclusiones que se consideran relevante en el ejercicio del informe por cada uno de los acápite descritos.

### Alcance

Presentar la información generada mediante la aplicación del procedimiento de monitoreo seguimiento, y control a los PIDAR y los avances de los procesos de ejecución de los proyectos cofinanciados.

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 2 de 118

## Tabla de Contenido

<b>1.</b>	<b>Seguimiento de los proyectos</b> .....	<b>3</b>
1.1	Estado y porcentaje de avance de los proyectos .....	3
1.2.	Distribución de proyectos por UTT .....	15
1.3	No. de Proyectos con Seguimiento .....	17
1.4	Proyectos con plan de Fortalecimiento Asociativo .....	18
1.5	Indicadores de gestión y de producto (Proyectos en ejecución) .....	22
<b>2.</b>	<b>Monitoreo</b> .....	<b>23</b>
2.1	Monitoreo Unidades Técnicas Territoriales - Conclusiones y Observaciones .....	24
2.2	Monitoreo por entidad ejecutora .....	42
2.3	Información de los proyectos monitoreados durante el trimestre .....	49
2.4	Indicador avance de los proyectos .....	51
2.5	Indicador estado de los proyectos monitoreados .....	51
2.6	Modificaciones al Plan de inversión .....	52
2.7	Cumplimiento y promedio en tiempos de ejecución .....	53
2.8	Indicadores de resultados (Proyectos cerrados) .....	54
2.8.1	Calidad de vida .....	54
2.8.2	Mejoramiento de Conocimiento .....	55
2.8.3	Satisfacción .....	56
2.8.4	Aumento en los ingresos .....	57
2.8.5	Percepción de la ADR .....	57
<b>3.</b>	<b>Alertas y Planes de Mejoramiento</b> .....	<b>58</b>
3.1	Alertas .....	58
3.2	Planes de mejoramiento .....	107
<b>4.</b>	<b>Lecciones Aprendidas</b> .....	<b>110</b>
4.1	Total de lecciones aprendidas en el trimestre .....	111
4.2	Lecciones Aprendidas por proyecto .....	113
4.3	Descripción ampliada de las lecciones aprendidas .....	114
<b>5.</b>	<b>Conclusiones</b> .....	<b>116</b>

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 3 de 118

## 1. Seguimiento de los proyectos

En cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento y Control, se han realizado las acciones pertinentes para la recolección y análisis de información de la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural- PIDAR, que permite verificar el avance y desempeño, en relación con el cronograma, los planes de inversión e indicadores de los productos, contenidos en los documentos que soportan su estructuración.

El desarrollo de estas acciones de seguimiento permite, primero, presentar el avance físico y el estado del proyecto frente a sus objetivos definidos, segundo, identificar situaciones de riesgo que generen alertas y a su vez acciones correctivas, y tercero, identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas.

Para la recolección y análisis de la información de ejecución de los PIDAR, la Dirección realizó los monitoreos IN HOUSE, los monitoreos UTT, las reuniones de retroalimentación con las Unidades Técnicas Territoriales – UTT y la verificación de la documentación de ejecución reportada en el Módulo de Gestión de Proyectos de la Vicepresidencia de Integración Productiva, dichas acciones en el marco del tercer trimestre de la vigencia 2022.

Actualmente la Dirección de Seguimiento y Control tiene 416 proyectos en su universo, de los cuales se encuentran en estado de ejecución 111, en 32 departamentos, en el que se destacan PIDAR de tipo asociativo, estratégico nacional, sentencia y territorial distribuidos en las 13 Unidades Técnicas Territoriales que definió la ADR.

### 1.1 Estado y porcentaje de avance de los proyectos

De acuerdo con lo consultado en el Módulo de Gestión de la Vicepresidencia de Integración Productiva – VIP, a continuación, se enlista el estado y porcentaje de avance que presentan los 416 proyectos, objeto de seguimiento durante el periodo del presente informe:

Tabla No. 1: Proyectos en Seguimiento

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
150	8 del 2020	Cerrado	100%
27	105 del 2018	Cerrado	100%
119	106 del 2018	Cerrado	100%
50	107 del 2018	Cerrado	100%
118	108 del 2018	Cerrado	100%
111	109 del 2018	Cerrado	100%
87	110 del 2018	Cerrado	100%
62	118 del 2018	Cerrado	100%
96	119 del 2018	Cerrado	100%
88	120 del 2018	Cerrado	100%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
91	121 del 2018	Cerrado	100%
63	122 de 2018	Cerrado	100%
60	123 del 2018	Cerrado	100%
61	124 del 2018	Cerrado	100%
693	132 del 2018	Cerrado	100%
72	134 del 2018	Cerrado	100%
70	135 del 2018	Cerrado	100%
101	136 del 2018	Cerrado	100%
64	137 del 2018	Cerrado	100%
113	138 del 2018	Cerrado	100%
124	139 del 2018	Cerrado	100%
102	140 del 2018	Cerrado	100%
80	141 del 2018	Cerrado	100%
47	155 del 2018	Cerrado	100%
67	156 del 2018	Cerrado	100%
59	198 del 2018	Cerrado	100%
120	199 del 2018	Cerrado	100%
104	200 del 2018	Cerrado	100%
94	201 del 2018	Cerrado	100%
109	202 del 2018	Cerrado	100%
79	203 del 2018	Cerrado	100%
78	204 del 2018	Cerrado	100%
129	205 del 2018	Cerrado	100%
81	206 del 2018	Cerrado	100%
108	207 del 2018	Cerrado	100%
89	208 del 2018	Cerrado	100%
116	210 del 2018	Cerrado	100%
106	211 del 2018	Cerrado	100%
77	212 del 2018	Cerrado	100%
471	240 del 2018	Cerrado	100%
83	241 del 2018	Cerrado	100%
92	242 del 2018	Cerrado	100%
69	244 del 2018	Cerrado	100%
97	245 del 2018	Cerrado	100%
136	246 del 2018	Cerrado	100%
132	270 del 2018	Cerrado	100%
142	298 del 2018	Cerrado	100%
159	341 del 2018	Cerrado	100%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
156	342 del 2018	Cerrado	100%
114	343 del 2018	Cerrado	100%
135	344 del 2018	Cerrado	100%
151	345 del 2018	Cerrado	100%
143	346 del 2018	Cerrado	100%
117	347 del 2018	Cerrado	100%
621	349 del 2018	Cerrado	100%
144	350 del 2018	Cerrado	100%
100	352 del 2018	Cerrado	100%
172	402 del 2018	Cerrado	100%
166	403 del 2018	Cerrado	100%
155	404 del 2018	Cerrado	100%
149	456 del 2018	Cerrado	100%
259	463 del 2019	Cerrado	100%
278	464 del 2019	Cerrado	100%
154	497 del 2018	Cerrado	100%
133	498 del 2018	Cerrado	100%
319	500 del 2018	Cerrado	100%
307	506 del 2018	Cerrado	100%
320	507 del 2018	Cerrado	100%
179	508 del 2018	Cerrado	100%
559	527 del 2018	Cerrado	100%
178	528 del 2018	Cerrado	100%
125	529 del 2018	Cerrado	100%
157	543 del 2018	Cerrado	100%
323	544 del 2018	Cerrado	100%
348	546 del 2018	Cerrado	100%
160	547 del 2018	Cerrado	100%
123	548 del 2018	Cerrado	100%
358	565 del 2018	Cerrado	100%
357	566 del 2018	Cerrado	100%
339	501 del 2018	Cerrado	100%
371	579 del 2019	Cerrado	100%
165	590 del 2018	Cerrado	100%
308	602 del 2018	Cerrado	100%
174	603 del 2018	Cerrado	100%
175	604 del 2018	Cerrado	100%
322	605 del 2018	Cerrado	100%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
130	607 del 2018	Cerrado	100%
318	614 del 2018	Cerrado	100%
721	623 del 2019	Cerrado	100%
346	624 del 2019	Cerrado	100%
338	631 del 2018	Cerrado	100%
131	632 del 2018	Cerrado	100%
173	633 del 2018	Cerrado	100%
152	634 del 2018	Cerrado	100%
342	573 del 2018	Cerrado	100%
311	649 del 2018	Cerrado	100%
343	574 del 2018	Cerrado	100%
336	687 del 2018	Cerrado	100%
349	688 del 2018	Cerrado	100%
390	724 del 2018	Cerrado	100%
170	758 del 2018	Cerrado	100%
145	790 del 2018	Cerrado	100%
315	601 del 2018	Cerrado	100%
366	629 del 2018	Cerrado	100%
362	630 del 2018	Cerrado	100%
345	635 del 2018	Cerrado	100%
744	998 del 2019	Cerrado	100%
5	1215 del 2017	Cerrado	100%
7	1216 del 2017	Cerrado	100%
367	638 del 2018	Cerrado	100%
12	1218 del 2017	Cerrado	100%
6	1219 del 2017	Cerrado	100%
1	1220 del 2017	Cerrado	100%
15	1221 del 2017	Cerrado	100%
2	1234 del 2017	Cerrado	100%
17	1250 del 2017	Cerrado	100%
33	1251 del 2017	Cerrado	100%
18	1254 del 2017	Cerrado	100%
30	1255 del 2017	Cerrado	100%
21	1256 del 2018	Cerrado	100%
24	1261 del 2017	Cerrado	100%
38	1263 del 2017	Cerrado	100%
26	1264 del 2017	Cerrado	100%
8	1267 del 2017	Cerrado	100%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
14	1268 del 2017	Cerrado	100%
45	1290 del 2017	Cerrado	100%
13	1299 del 2017	Cerrado	100%
9	1300 del 2017	Cerrado	100%
37	1301 del 2017	Cerrado	100%
43	1302 del 2017	Cerrado	100%
34	1303 del 2017	Cerrado	100%
19	1304 del 2017	Cerrado	100%
10	1305 del 2017	Cerrado	100%
11	1306 del 2017	Cerrado	100%
368	650 del 2018	Cerrado	100%
3	1322 del 2017	Cerrado	100%
46	1340 del 2017	Cerrado	100%
23	1351 del 2017	Cerrado	100%
25	1401 del 2017	Cerrado	100%
28	1406 del 2017	Cerrado	100%
31	1438 del 2017	Cerrado	100%
53	1439 del 2017	Cerrado	100%
39	1440 del 2017	Cerrado	100%
40	1441 del 2017	Cerrado	100%
41	1447 del 2017	Cerrado	100%
44	1452 del 2017	Cerrado	100%
20	1453 del 2017	Cerrado	100%
32	1468 del 2017	Cerrado	100%
54	1474 del 2017	Cerrado	100%
36	1490 del 2017	Cerrado	100%
16	1491 del 2017	Cerrado	100%
48	1522 del 2017	Cerrado	100%
73	1540 del 2017	Cerrado	100%
75	1542 del 2017	Cerrado	100%
66	1546 del 2017	Cerrado	100%
58	1556 del 2017	Cerrado	100%
57	1578 del 2017	Cerrado	100%
84	1586 del 2017	Cerrado	100%
56	1598 del 2017	Cerrado	100%
76	1601 del 2017	Cerrado	100%
22	1217 del 2017	Cerrado	100%
4	1307 del 2017	Cerrado	100%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
2018	997 del 2019	Cerrado	98%
324	825 del 2019	Cerrado	96%
147	354 del 2018	Cerrado	95%
372	458 del 2019	Cerrado	95%
252	462 del 2019	Cerrado	95%
146	499 del 2018	Cerrado	95%
341	637 del 2018	Cerrado	95%
763	791 del 2019	Cerrado	95%
837	794 del 2019	Cerrado	95%
2166	795 del 2019	Cerrado	95%
354	826 del 2019	Cerrado	95%
29	836 del 2018	Cerrado	95%
2908	996 del 2019	Cerrado	95%
353	822 del 2019	Cerrado	95%
42	1587 del 2017	Cerrado	95%
645	833 del 2019	Cerrado	94%
250	820 del 2019	Cerrado	94%
380	821 del 2019	Cerrado	94%
454	340 del 2020	Cerrado	91%
284	255 del 2020	Cerrado	88%
93	496 del 2018	Cerrado	85%
312	504 del 2018	Cerrado	70%
859	231 del 2020	Cerrado	40%
195	877 del 2019	Cerrado	36%
350	575 del 2018	Ejecutado esperando cierre	100%
49	104 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%
316	503 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%
309	578 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%
352	636 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%
369	759 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%
382	793 del 2019	Ejecutado esperando cierre	94%
169	824 del 2019	Ejecutado esperando cierre	89%
799	257 del 2020	En ejecución	100%
285	461 del 2019	En ejecución	100%
276	580 del 2019	En ejecución	100%
865	10 del 2020	En ejecución	99,87%
51	117 del 2018	En ejecución	95%
137	209 del 2018	En ejecución	95%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
90	243 del 2018	En ejecución	95%
3146	321 del 2021	En ejecución	95%
552	351 del 2018	En ejecución	95%
434	460 del 2019	En ejecución	95%
313	576 del 2018	En ejecución	95%
134	348 del 2018	En ejecución	93,22%
526	298 del 2020	En ejecución	90%
3035	314 del 2020	En ejecución	90%
378	459 del 2019	En ejecución	90%
2020	233 del 2020	En ejecución	87%
3037	69 del 2021	En ejecución	80%
1862	232 del 2020	En ejecución	80%
469	256 del 2020	En ejecución	80%
539	297 del 2020	En ejecución	80%
140	299 del 2018	En ejecución	80%
3034	313 del 2020	En ejecución	80%
3120	365 del 2021	En ejecución	80%
364	799 del 2018	En ejecución	80%
2203	9 del 2020	En ejecución	75%
1209	229 del 2020	En ejecución	75%
310	651 del 2018	En ejecución	70,12%
3070	193 del 2021	En ejecución	70%
167	401 del 2018	En ejecución	70%
359	567 del 2018	En ejecución	70%
360	686 del 2018	En ejecución	69,0%
1804	807 del 2019	En ejecución	62%
153	577 del 2018	En ejecución	60%
68	271 del 2018	En ejecución	55,0%
2154	361 del 2020	En ejecución	55%
2199	372 del 2020	En ejecución	55%
158	606 del 2018	En ejecución	55%
2165	805 del 2019	En ejecución	55%
619	806 del 2019	En ejecución	55%
3156	96 del 2022	En ejecución	55%
3032	173 del 2021	En ejecución	54%
2085	792 del 2019	En ejecución	54%
327	827 del 2019	En ejecución	54%
2152	341 del 2020	En ejecución	51%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
719	858 del 2019	En ejecución	51%
2005	299 del 2020	En ejecución	50%
516	878 del 2019	En ejecución	50%
3147	432 del 2021	En ejecución	50%
3175	557 del 2021	En ejecución	50%
3255	569 del 2021	En ejecución	50%
3173	574 del 2021	En ejecución	50%
3125	351 del 2021	En ejecución	45%
3217	547 del 2021	En ejecución	40%
402	830 del 2019	En ejecución	40%
419	325 del 2020	En ejecución	39%
231	832 del 2019	En ejecución	38%
3128	492 del 2021	En ejecución	31%
2974	143 del 2021	En ejecución	30%
2234	144 del 2021	En ejecución	30%
171	228 del 2020	En ejecución	30%
3038	315 del 2020	En ejecución	30%
3154	315 del 2021	En ejecución	30%
3039	316 del 2020	En ejecución	30%
738	373 del 2020	En ejecución	30%
168	622 del 2019	En ejecución	30%
3169	577 del 2021	En ejecución	30%
365	823 del 2019	En ejecución	30%
264	831 del 2019	En ejecución	30%
3261	616 del 2021	En ejecución	30%
3076	95 del 2021	En ejecución	30%
3272	314 del 2022	En ejecución	30%
3155	291 del 2021	En ejecución	26%
3102	172 del 2021	En ejecución	25%
3103	175 del 2021	En ejecución	25%
3127	220 del 2021	En ejecución	25%
3036	342 del 2020	En ejecución	25%
1021	879 del 2019	En ejecución	25%
189	880 del 2019	En ejecución	25%
3266	246 del 2022	En ejecución	25%
740	296 del 2020	En ejecución	23%
2946	300 del 2020	En ejecución	23%
3116	229 del 2021	En ejecución	22%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
3031	343 del 2020	En ejecución	22%
2206	834 del 2019	En ejecución	22%
2906	360 del 2020	En ejecución	20%
854	374 del 2020	En ejecución	20%
1915	376 del 2020	En ejecución	20%
3245	154 del 2022	En ejecución	20%
3172	393 del 2021	En ejecución	16%
3178	528 del 2021	En ejecución	15%
3152	330 del 2021	En ejecución	13%
3151	292 del 2021	En ejecución	10%
3024	312 del 2020	En ejecución	10%
1855	375 del 2020	En ejecución	10%
3003	245 del 2022	En ejecución	8%
3157	552 del 2021	En ejecución	4%
3171	568 del 2021	En ejecución	3%
3267	247 del 2022	En ejecución	2%
3105	174 del 2021	En ejecución	0%
3112	191 del 2021	En ejecución	0%
3117	192 del 2021	En ejecución	0%
3104	194 del 2021	En ejecución	0%
3163	329 del 2021	En ejecución	0%
3168	337 del 2021	En ejecución	0%
3160	383 del 2021	En ejecución	0%
317	502 del 2018	En ejecución	0%
148	505 del 2018	En ejecución	0%
3218	546 del 2021	En ejecución	0%
3268	244 del 2022	En ejecución	0%
3289	249 del 2022	En ejecución	0%
3315	306 del 2022	En ejecución	0%
3212	481 del 2021	Notificado	20%
3220	483 del 2021	Notificado	18%
3107	553 del 2021	Notificado	16%
3195	556 del 2021	Notificado	8%
3258	579 del 2021	Notificado	6%
3336	403 del 2022	Notificado	6%
3130	559 del 2021	Notificado	5%
3301	238 del 2022	Notificado	4%
3150	272 del 2021	Notificado	3%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
3278	235 del 2022	Notificado	3%
3319	319 del 2022	Notificado	3%
3320	323 del 2022	Notificado	3%
3311	324 del 2022	Notificado	3%
3276	325 del 2022	Notificado	3%
3329	327 del 2022	Notificado	3%
3321	331 del 2022	Notificado	3%
3313	401 del 2022	Notificado	2%
3317	402 del 2022	Notificado	2%
3204	451 del 2021	Notificado	1%
3208	452 del 2021	Notificado	1%
3288	355 del 2022	Notificado	1%
3141	273 del 2021	Notificado	0%
3207	479 del 2021	Notificado	0%
3333	326 del 2022	Notificado	0%
3314	329 del 2022	Notificado	0%
3338	332 del 2022	Notificado	0%
3310	342 del 2022	Notificado	0%
3331	343 del 2022	Notificado	0%
3307	353 del 2022	Notificado	0%
3180	428 del 2022	Notificado	0%
3026	199 del 2021	Socializado	20%
671	358 del 2020	Socializado	20%
1904	359 del 2020	Socializado	20%
3214	477 del 2021	Socializado	16%
3203	478 del 2021	Socializado	14%
3183	346 del 2021	Socializado	12%
3188	545 del 2021	Socializado	12%
3131	469 del 2021	Socializado	12%
3211	472 del 2021	Socializado	12%
3077	218 del 2021	Socializado	10%
3140	219 del 2021	Socializado	10%
3191	348 del 2021	Socializado	10%
3153	480 del 2021	Socializado	10%
3025	440 del 2021	Socializado	10%
3197	448 del 2021	Socializado	10%
3215	488 del 2021	Socializado	10%
3253	617 del 2021	Socializado	10%

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
3300	237 del 2022	Socializado	10%
3280	229 del 2022	Socializado	10%
3158	548 del 2021	Socializado	9%
3148	550 del 2021	Socializado	9%
3193	449 del 2021	Socializado	8%
3194	450 del 2021	Socializado	8%
3162	470 del 2021	Socializado	8%
3210	484 del 2021	Socializado	8%
3206	485 del 2021	Socializado	8%
3164	486 del 2021	Socializado	8%
3200	493 del 2021	Socializado	8%
3129	494 del 2021	Socializado	8%
3121	570 del 2021	Socializado	8%
3119	575 del 2021	Socializado	8%
3273	243 del 2022	Socializado	8%
3159	392 del 2021	Socializado	6%
3293	341 del 2022	Socializado	6%
3292	354 del 2022	Socializado	6%
3192	430 del 2021	Socializado	5%
3229	476 del 2021	Socializado	5%
3165	487 del 2021	Socializado	5%
3170	412 del 2021	Socializado	5%
3286	231 del 2022	Socializado	4%
3176	591 del 2021	Socializado	3%
3298	230 del 2022	Socializado	3%
3349	426 del 2022	Socializado	2%
3143	230 del 2021	Socializado	0%
3122	271 del 2021	Socializado	0%
3186	347 del 2021	Socializado	0%
3145	384 del 2021	Socializado	0%
3139	391 del 2021	Socializado	0%
3144	431 del 2021	Socializado	0%
3149	433 del 2021	Socializado	0%
3111	468 del 2021	Socializado	0%
3167	471 del 2021	Socializado	0%
3137	482 del 2021	Socializado	0%
3201	489 del 2021	Socializado	0%
3202	490 del 2021	Socializado	0%


Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
3209	491 del 2021	Socializado	0%
3190	495 del 2021	Socializado	0%
3198	554 del 2021	Socializado	0%
3138	551 del 2021	Socializado	0%
3161	549 del 2021	Socializado	0%
3174	576 del 2021	Socializado	0%
3219	578 del 2021	Socializado	0%
3222	558 del 2021	Socializado	0%
3118	67 del 2022	Socializado	0%
3029	103 del 2022	Socializado	0%
3205	188 del 2022	Socializado	0%
3296	248 del 2022	Socializado	0%
3271	250 del 2022	Socializado	0%
3269	236 del 2022	Socializado	0%
3306	239 del 2022	Socializado	0%
3318	240 del 2022	Socializado	0%
3312	241 del 2022	Socializado	0%
3274	242 del 2022	Socializado	0%
3324	228 del 2022	Socializado	0%
3281	305 del 2022	Socializado	0%
3305	308 del 2022	Socializado	0%
3328	328 del 2022	Socializado	0%
3308	330 del 2022	Socializado	0%
3177	427 del 2022	Socializado	0%
723	260 del 2020	Suspendido	50%
3101	231 del 2021	Suspendido	0%

Fuente: elaboración propia

Con base en la tabla presentada, a continuación, se muestra los estados en los que se concentran los proyectos en seguimiento:

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 15 de 118

Gráfica No. 1: Estado de los proyectos

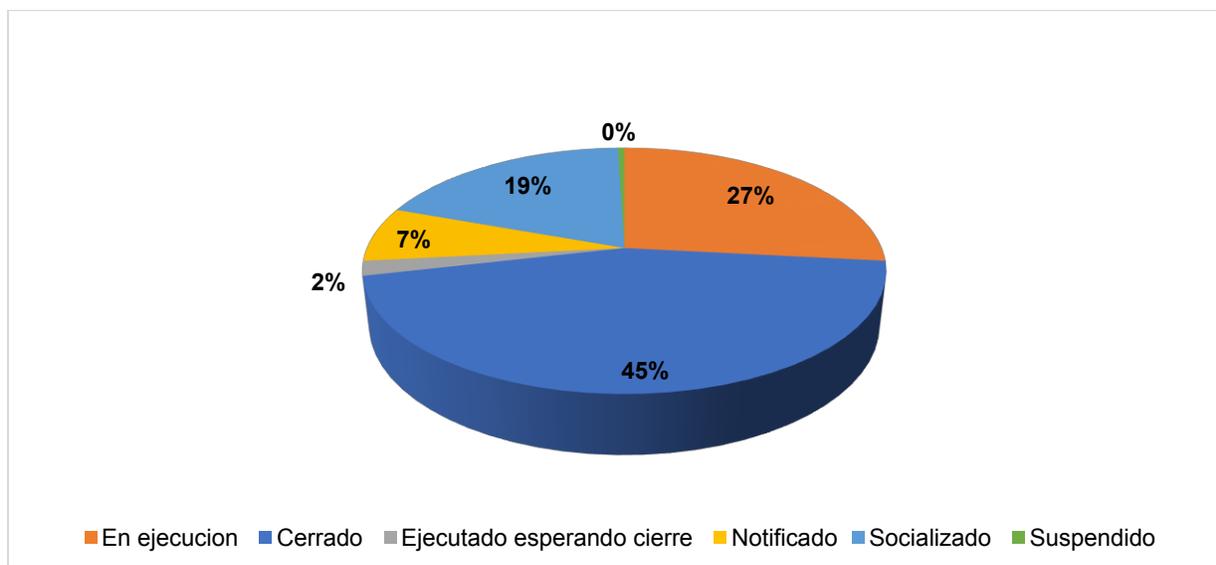

Fuente: elaboración propia

Para aplicar el esquema de monitoreo, seguimiento y control a los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial – PIDAR, se definen los siguientes estados de los proyectos para el seguimiento:

- Notificado: proyecto con acto protocolizado de notificación, sin socialización.
- Socializado: proyecto con acto protocolizado de notificación y socialización.
- En ejecución: proyecto en desarrollo de las actividades propias del POA.
- Ejecutado esperando cierre: proyecto con ejecución al 100% sin acto protocolario de cierre.
- Suspendido: proyecto que se encuentra interrumpido en su ejecución por alguna causa técnica, social o política que impide su normal desarrollo de actividades, o que se encuentra sin ejecución de actividades superior a 4 meses no contempladas en el cronograma, o que se encuentra en proceso de ajustes.
- Cerrado: proyecto con Acto protocolario de Cierre administrativo y financiero.
- Revocado: proyecto con Acto protocolario de Revocación del proyecto de cofinanciación.

## 1.2. Distribución de proyectos por UTT


A continuación, se muestra el estado de ejecución de proyectos por cada Unidad Técnica Territorial:

Tabla No. 2: Proyectos por UTT

No. Proyectos por UTT		
No.	Unidad Técnica Territorial Departamentos de Cobertura	No. de Proyecto en el UTT
Territorial 1	Magdalena, Cesar y La Guajira	42
Territorial 2	Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	32
Territorial 3	Córdoba y Sucre	23
Territorial 4	Norte de Santander y Santander	19
Territorial 5	Antioquia y Chocó	41
Territorial 6	Caldas, Quindío y Risaralda	24
Territorial 7	Arauca, Boyacá y Casanare	32
Territorial 8	Tolima	18
Territorial 9	Cauca y Valle del Cauca	49
Territorial 10	Nariño y Putumayo	49
Territorial 11	Huila y Caquetá	32
Territorial 12	Meta y Vichada	29
Territorial 13	Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	26
<b>TOTAL</b>		<b>416</b>

Fuente: elaboración propia

Gráfica No. 2: Participación porcentual de Proyectos por UTT

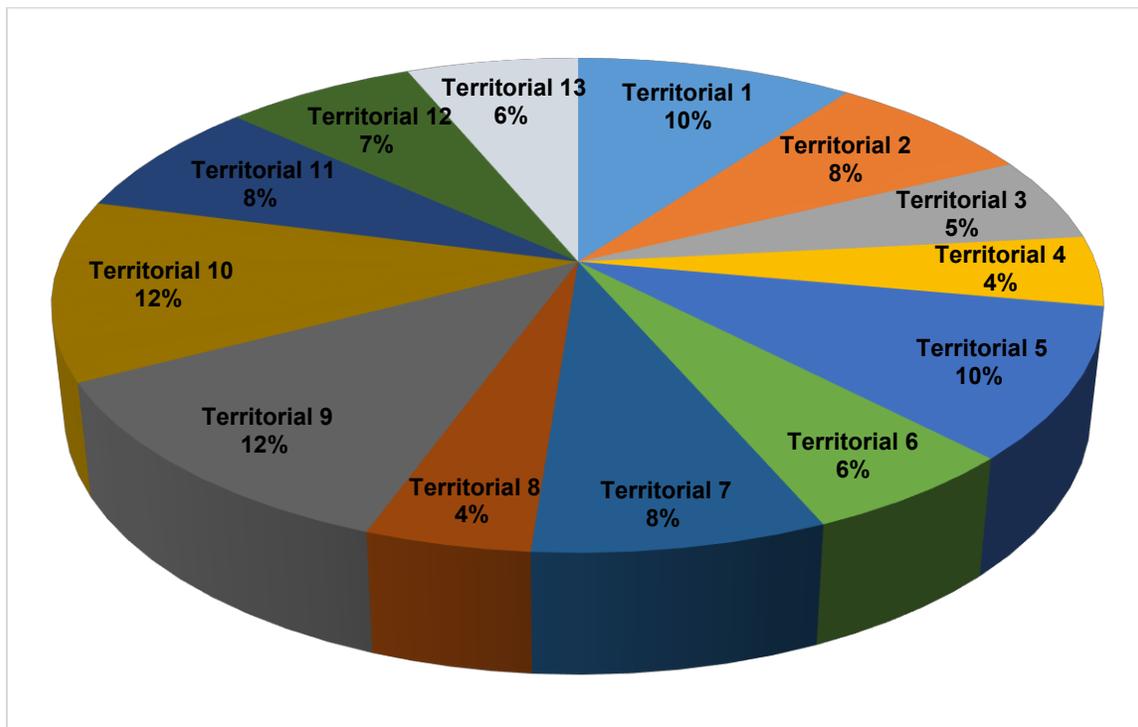

Fuente: elaboración propia

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 17 de 118

De lo anterior, se evidencia que las Unidades Técnicas Territoriales - UTT No. 10, 9, 1 y 5, correspondientes a los departamentos de Nariño – Putumayo, Cauca - Valle del Cauca, Magdalena - Cesar - La Guajira y Antioquia – Choco, tienen la mayor asignación de proyectos, con 49, 49, 42 y 41 PIDAR respectivamente; y la Territorial con menor número de PIDAR cofinanciados, corresponde a la UTT 8, en el departamento del Tolima, con 18 proyectos.

De los proyectos que ha cofinanciado la ADR, a la fecha se encuentran cinco proyectos revocados, dos en la UTT No. 5 con cobertura en Antioquia - Chocó, identificado con número de Banco de Proyectos 183, Resolución 545 de julio de 2018 y Banco de Proyectos 163, Resolución 366 de 30 de mayo de 2018, el tercero en la UTT No. 8 con cobertura en el departamento del Tolima, que, se identifica con número de Banco de Proyectos 314, Resolución 542 del julio de 2018, el cuarto en la UTT No. 10 con cobertura Nariño - Putumayo, con número de Banco de proyectos 2989, Resolución 326 de 3 de diciembre de 2020 y el quinto en la UTT No. 12 con cobertura en Meta - Vichada, con número de Banco de Proyectos 321, Resolución 639 de 9 de julio de 2018, los cuales no hacen parte del conteo total de proyectos en inventario.

### 1.3 No. de Proyectos con Seguimiento

Para el tercer trimestre del presente año, la Dirección de Seguimiento y Control, realizó un total de 96 visitas. Las mismas, fueron priorizadas de acuerdo con los criterios definidos en el Procedimiento, presentando la mayor cobertura en los departamentos de Nariño con 13 visitas, Cesar con 9, Cauca con 7, Bolívar, Boyacá y Huila con 6 visitas respectivamente.

Tabla No. 3: Proyecto con seguimiento

<b>Proyectos con Seguimiento (visitas)</b>	
<b>Departamento</b>	<b>No. proyectos visitados</b>
Antioquia	3
Arauca	3
Atlántico	1
Bolívar	6
Boyacá	6
Caldas	2
Caquetá	1
Casanare	1
Cauca	7
Cesar	9
Choco	3
Córdoba	3
Cundinamarca	3
Guainía	1
Guaviare	2
Huila	6

La Guajira	1
Magdalena	4
Meta	4
Nariño	13
Norte de Santander	3
Putumayo	4
Risaralda	1
Santander	1
Sucre	3
Tolima	5

Fuente: elaboración propia

#### 1.4 Proyectos con plan de Fortalecimiento Asociativo

La Dirección de Seguimiento y Control, en el inventario de proyectos en monitoreo, seguimiento y control, evidencia que, de los 416 proyectos, 124 cuentan con plan de fortalecimiento asociativo. Es importante aclarar que el Plan de Fortalecimiento Asociativo fue definido con el Acuerdo 10 de 2019 que rige desde el 1 de enero de 2020, los proyectos que han sido cofinanciados a partir de esta fecha deben contar con dicho plan. Los proyectos que cuentan con plan de fortalecimiento se detallan a continuación.

Tabla No. 4: Plan de fortalecimiento de asociativo

No. Proyecto BP	No. Resolución	UTT
3032	173	2
3037	69	8
3070	193	6
3077	218	7
3101	231	13
3102	172	2
3103	175	2
3104	194	5
3105	174	5
3107	553	9
3111	468	13
3112	191	13
3116	229	9
3117	192	5
3119	575	9

No. Proyecto BP	No. Resolución	UTT
3120	365	2
3121	570	2
3122	271	12
3125	351	2
3127	220	5
3129	494	10
3130	559	10
3131	469	10
3137	482	7
3138	551	7
3139	391	7
3140	219	7
3141	273	7
3143	230	12
3144	431	4
3145	384	12
3147	432	6
3148	550	1
3149	433	7
3150	272	7
3151	292	7
3152	330	1
3153	480	1
3154	315	2
3155	291	8
3157	552	1
3158	548	1
3159	392	4
3160	383	7
3161	549	4
3162	470	11
3163	329	13
3164	486	11
3165	487	11
3167	471	13

No. Proyecto BP	No. Resolución	UTT
3169	577	1
3170	412	7
3171	568	3
3172	393	9
3173	574	6
3174	576	4
3175	557	6
3176	591	6
3183	346	9
3186	347	9
3188	545	1
3190	495	13
3191	348	9
3192	430	9
3193	449	9
3194	450	9
3195	556	9
3197	448	9
3198	554	13
3200	493	10
3203	478	9
3204	451	9
3206	485	10
3207	479	9
3208	452	9
3209	491	9
3210	484	9
3211	472	10
3212	481	9
3214	477	9
3215	488	9
3217	547	1
3218	546	3
3219	578	7
3220	483	9

No. Proyecto BP	No. Resolución	UTT
3222	558	3
3229	476	11
3258	579	9
3003	245	2
3286	231	10
3269	236	7
3306	239	7
3318	240	11
3312	241	7
3274	242	11
3273	243	1
3324	228	5
3280	229	6
3281	305	7
3315	306	3
3305	308	2
3272	314	8
3319	319	9
3320	323	9
3311	324	9
3276	325	9
3333	326	12
3329	327	8
3328	328	12
3314	329	4
3308	330	11
3321	331	9
3278	235	1
3288	355	9
3292	354	6
3293	341	6
3307	353	5
3310	342	7
3313	401	1
3317	402	1

No. Proyecto BP	No. Resolución	UTT
3336	403	6
3349	426	10
3331	343	12

Fuente: elaboración propia


Actualmente la Dirección de Seguimiento y Control se encuentran realizando seguimiento al plan de fortalecimiento asociativo, con base en los soportes disponibles en las fuentes de información

### 1.5 Indicadores de gestión y de producto (Proyectos en ejecución)

En el tercer trimestre de 2022, se realizó el seguimiento y medición de 1.151 reportes de indicadores, correspondiente a 184 proyectos, para ello, la información se recopiló en la matriz de indicadores, obteniendo 501 reportes de indicadores de gestión (44%), 544 de producto (47%) y 106 indicadores de resultado (9%), cada indicador está relacionado con el respectivo Marco lógico del PIDAR.

Del grupo de indicadores de gestión y de producto analizados, se accedió información para la medición del 35% de los indicadores de gestión y 26% de los indicadores de producto; la no medición a de los indicadores restantes, se sustenta en la falta de generación de información, teniendo en cuenta el estado de ejecución de los Proyectos, que no permite la medición de los indicadores, en atención a que no se cuenta con información en el Módulo de Gestión o no hay ejecución de actividades que alimentan los indicadores.

Gráfica No. 3: Información de indicadores de gestión y producto

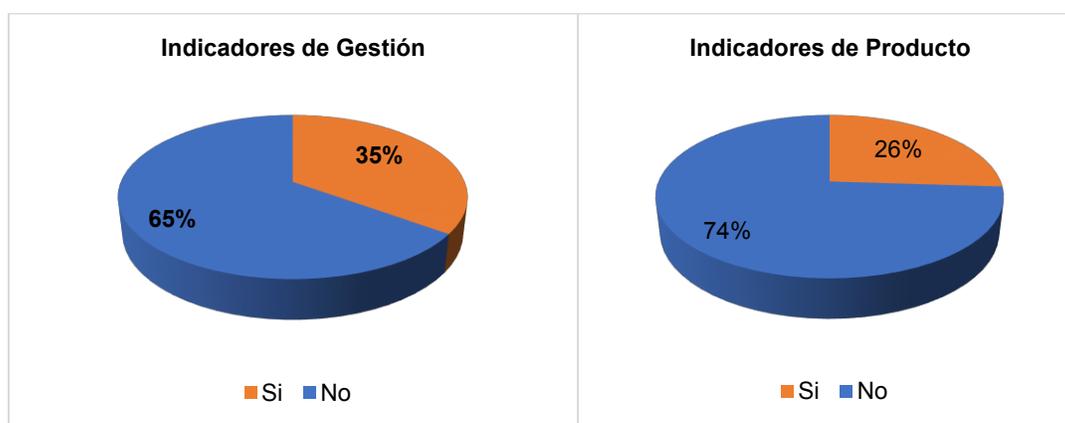


Fuente: elaboración propia

## 2. Monitoreo

De conformidad con los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control, durante el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre, se llevó a cabo el monitoreo IN HOUSE de 110 proyectos, que corresponde al 26% de los PIDAR cofinanciados.

Gráfica No. 4: No. de Proyectos Monitoreados

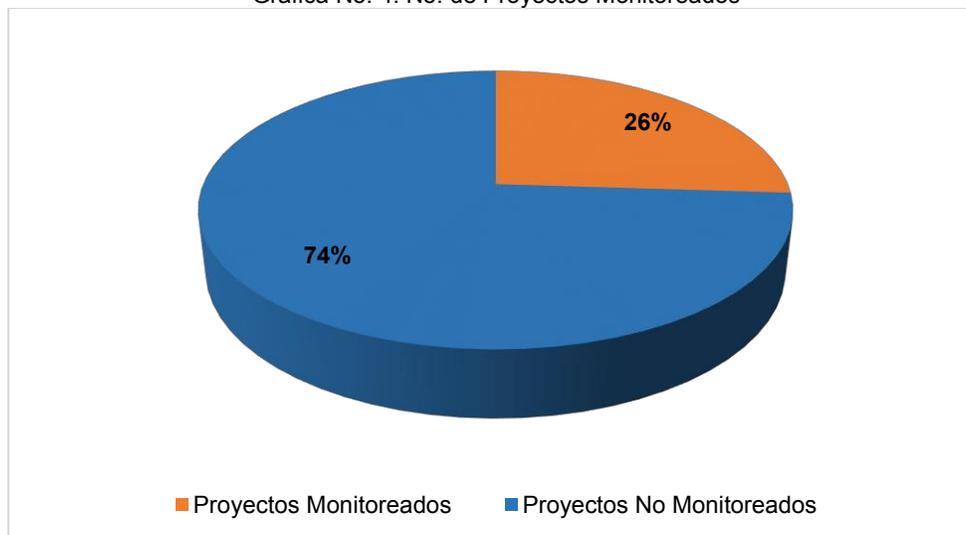

Fuente: elaboración propia

A continuación, se relaciona la tabla que detalla los proyectos objeto de monitoreo para el trimestre de julio a septiembre de 2022.

Tabla No. 5: Proyectos Monitoreados por UTT

No. UTT	Cantidad de proyectos monitoreados	Valor cofinanciado	Beneficiarios contactados	Cantidad de alertas identificadas
1	11	\$13.378.658.481	108	0
2	11	\$9.263.660.585	117	4
3	7	\$18.804.857.280	129	0
4	7	\$ 9.331.264.031	78	2
5	10	\$8.796.614.088	78	3
6	7	\$8.443.533.899	68	3
7	8	\$6.603.845.392	76	0
8	6	\$14.425.008.948	64	5
9	9	\$9.779.643.283	87	1
10	13	\$16.199.703.552	110	1
11	4	\$8.248.472.923	19	0
12	10	\$11.109.105.972	79	0
13	7	\$5.105.261.635	67	0
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>\$139.489.630.069</b>	<b>1080</b>	<b>19</b>

Fuente: elaboración propia

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 24 de 118

\*\* solo se relaciona una vez el valor de la cofinanciación de los PIDAR con Resolución 823 (UTT 5) y 807 (UTT 12); dado que estos fueron intervenidos durante los meses de julio y septiembre del presente trimestre.

Con base en la tabla anterior, el monitoreo IN HOUSE, se lleva a cabo sobre 110 proyectos de los 416 PIDAR cofinanciados por la ADR, en razón a criterios de priorización definidos por la Dirección (tiempos de seguimiento, número de seguimientos y monitoreos de los PIDAR), con base en la operatividad de la Dirección y el recurso humano disponible.

De la misma manera en el desarrollo del monitoreo para el trimestre de reporte, se lograron contactar efectivamente 1080 beneficiarios a quienes a través del monitoreo telefónico se les realizaron las preguntas definidas en el Formato de Monitoreo IN HOUSE, sobre el PIDAR correspondiente, para identificar las percepciones y niveles de satisfacción; los resultados se ven reflejados en el presente informe.

## 2.1 Monitoreo Unidades Técnicas Territoriales - Conclusiones y Observaciones

### Unidad Técnica Territorial No. 1

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 42 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 1, se realizó el proceso de monitoreo a 11 de ellos (resoluciones 341 de 2020, 376 de 2021, 401 de 2018, 402 de 2018, 793 de 2018, 358 de 2020, 330 de 2020, 557 de 2021, 229 de 2020, 359 de 2020 y 552 de 2021), así mismo, se afirma que la UTT entregó información de la totalidad de los PIDAR intervenidos, en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

En desarrollo del mecanismo de monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 341 de 2020:** *Siete de los beneficiarios del sector nuevo, manifestaron inconformidades con el Proyecto, con respecto a las entregas de los ovinos; dado que no se ha realizado la entrega de totalidad los ovinos y las gallinas. Mediante las consultas realizadas, se tiene programado para el mes de septiembre las entregas de los ovinos.*

**Resolución No. 376 de 2021:** *los beneficiarios manifestaron estar con la mejor actitud para trabajar en las labores de siembra, para que el Proyecto sea un éxito; por otra parte, manifiestan sentirse inconformes por la demora en la entrega de los activos productivos ya que los tiempos para la siembra están pasando, lo cual afecta en el buen desarrollo del establecimiento de la plantación, dado que se requiere de las aguas lluvias para la siembra.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 25 de 118

**Resolución No. 401 de 2018:** *en general los beneficiarios, se encuentran a la espera de que se culmine la construcción de los beneficiaderos de café, dado que a la fecha falta la instalación de las escaleras y la instalación del sistema de recolección de aguas mieles.*

**Resolución No. 402 de 2018:** *los beneficiarios expresaron haber recibido los servicios de inseminación para los semovientes, haber recibido los activos productivos contemplados en el plan de inversión del PIDAR y asistencia técnica. Como única observación que se tiene es que el % de preñez mediante la técnica de inseminación fue baja; una beneficiaria manifestó que, de 12 animales inseminados, solo quedaron preñadas 2 vacas.*

**Resolución No. 793 de 2018:** *los beneficiarios se encuentran satisfechos con la ejecución del Proyecto, manifiestan haber mejorado su el proceso productivo del mango, cuentan con la logística para desarrollar su comercialización y resaltan la calidad de las asistencias técnicas. Con los excedentes que se generaron en el PIDAR, fueron utilizados en la adquisición de insumos para la manutención de los cultivos.*

**Resolución No. 358 de 2020:** *en general los beneficiarios se encuentran a la expectativa del comienzo del PIDAR, manifiestan su compromiso y las ganas de que el Proyecto se desarrolle y llegue a feliz término. A la fecha no se ha iniciado con la ejecución del plan de inversión y/o entrega de activos productivos.*

**Resolución No. 330 de 2020:** *en general los beneficiarios se encuentran a la expectativa del comienzo del PIDAR, manifiestan su compromiso y las ganas de que el Proyecto se desarrolle y llegue a feliz término. A la fecha no se ha iniciado con la ejecución del plan de inversión y/o entrega de activos productivos.*

**Resolución No. 557 de 2021:** *Los beneficiarios se encuentran a la expectativa del desarrollo y entrega de los insumos para el cultivo de banano; a la fecha se dio inicio de los talleres de extensión agrícola sobre fertilización.*

**Resolución No. 229 de 2020:** *4 beneficiarios manifestaron que les robaron las embarcaciones con los motores; las cuales lograron recuperar pagando un rescate y les tocó repararlas porque las encontraron averiadas, en cuanto a los motores prefirieron que se perdieran para evitar problemas personales. En la actualidad están pescado con un motor arrendado, conservan las embarcaciones y los demás activos productivos que le entregaron.*

**Resolución No. 359 de 2020:** *actualmente las 4 unidades de sistemas de producción ovina, están recibiendo los talleres agrícolas y pecuarios, insumos, capacitaciones y las herramientas contempladas en el plan de inversión del PIDAR. Los beneficiarios a la fecha se encuentran realizando las adecuaciones de suelo para la siembra de los bancos de proteína.*

**Resolución No. 552 de 2021:** *los beneficiarios manifiestan estar contentos con la ejecución del PIDAR, a la fecha han recibido capacitaciones, herramientas, semilla certificada de ahuyama y un tractor. A la fecha ya se inició con las labores de preparación de suelo para algunos beneficiarios.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 26 de 118

## Unidad Técnica Territorial No. 2

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 32 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 2, se realizó el proceso de monitoreo a 11 de ellos (resoluciones No. 172 de 2021, 245 de 2022, 104 de 2018, 351 de 2021, 570 del 2021, 505 de 2018, 799 de 2018, 175 de 2021, 246 de 2022, 173 de 2021 y 247 de 2022), así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 10 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

Producto del mecanismo monitoreo, se identificaron 4 alertas, una por Gestión de la información al PIDAR Resolución No. 172 con fecha de 12 de julio de 2022, la segunda, por Gestión de la información al PIDAR Resolución No. 505 con fecha de 18 de agosto de 2022 y la tercera y cuarta por Gestión del tiempo y Gestión de los recursos, al PIDAR con Resolución No. 246 de fecha 28 de septiembre de 2022.

Se observa que aun está pendiente de cargar información relacionada con las ejecuciones de los PIDAR en el módulo de gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 172 de 2021:** *En general, los beneficiarios se encuentran agradecidos con la Agencia y están esperando el inicio y entrega de los componentes del PIDAR. Algunas personas manifiestan su preocupación por los extensos tiempos que ha tardado el Proyecto en ejecutarse.*

**Resolución No. 245 de 2022:** *los beneficiarios del PIDAR conocen con claridad el Proyecto; estado, componentes y situación actual. Por otra parte, manifiestan la necesidad de contar con mayores estrategias de comunicación y divulgación entre los asociados para mantenerlos al tanto del estado y compromisos propios del PIDAR.*

**Resolución No. 104 de 2018:** *en términos generales los beneficiarios se encuentran satisfechos con el desarrollo del Proyecto, pese algunos percances ocurridos en el comienzo como son: la calidad de las semillas, condiciones climáticas, periodos de siembra por fuera de los establecidos, pérdida en la siembra y retraso en la cosecha; situaciones que fueron subsanadas y actualmente muchos están a la espera de recoger su primera cosecha de mango hilaza.*

**Resolución No. 351 de 2021:** *los beneficiarios se encuentran a la expectativa de las entregas de los activos productivos. La Sra. Francia Vivianco - representante legal de Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Villanueva Bolívar – ANUC Villanueva, expresa que se entregó toda la documentación requerida por la UTT 2, para el cumplimiento de los requisitos previos, así como, los soportes para la construcción de los términos de referencias y la publicación de estos, de igual manera se logró realizar las respectivas convocatorias.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 27 de 118

**Resolución No. 570 de 2021:** *En términos generales, los beneficiarios se encuentran satisfechos con el desarrollo del Proyecto, sin embargo, algunos manifiestan que hace falta mejorar los procesos de comunicación entre la cooperativa y los beneficiarios.*

*El beneficiario Eder Jesús González Morales expresó su descontento por no tener ni idea sobre el Proyecto y por no recibir ninguna información, hasta el punto de creer que no hacía parte de la lista de beneficiarios.*

*La Representante Legal de la Cooperativa COOPROCAL señala que la beneficiaria Beatriz Yolanda Mercado Villa renunció al Proyecto y que está en el proceso para presentar los documentos de su remplazo.*

**Resolución No. 505 de 2018:** *los beneficiarios del PIDAR se encuentran conformes, no obstante, algunos, siguen expresando que la semilla “fue de mala calidad” por lo que fue menester optar por la siembra de maíz criollo blanco y amarillo, esto, con el fin de garantizar la sostenibilidad del Proyecto. Esta situación ha generado molestia entre algunos beneficiarios ya que el nivel de producción de esta clase de semilla es menor que la planteada en el marco lógico, adicional, esto requirió mayor inversión en jornales.*

*El señor Rafael Díaz Tapias manifiesta que el antiguo operador de reservorios de agua lo hizo firmar un recibo a satisfacción, sin embargo, nunca le realizaron la obra. Frente a este caso, el 10 de agosto de 2022 se solicitó a la UTT No. 2 vía correo electrónico verificar la situación que expone el beneficiario.*

**Resolución No. 799 de 2018:** *los beneficiarios manifestaron que a la fecha se ha realizado la entrega de animales, insumos, alimento concentrado y medicamentos.*

*Las personas reconocen que, por conflictos internos entre los mismos beneficiarios de la organización y la entrega no oportuna de los activos productivos, esto generó desmotivación y desinterés al interior del PIDAR.*

**Resolución No. 175 de 2021:** *En general los beneficiarios muestran interés por el Proyecto y se encuentran a la expectativa del comienzo del mismo; reconocen que el retraso se debe, en parte, a la dificultad de encontrar proveedores que quieran participar en estos Proyectos.*

**Resolución No. 246 de 2022:** *Las beneficiarias se mostraron muy entusiasmadas y esperan que este Proyecto les ayude a mejorar la calidad de vida; de igual manera manifiestan su preocupación por la tardanza en la ejecución del PIDAR.*

**Resolución No. 173 de 2021:** *los beneficiarios, se encuentran expectantes con el Proyecto y muestran de alguna manera agradecimiento con los actores y cofinanciadore. Actualmente las personas manifiestan estar en la etapa de siembra y manteniendo del cultivo; por tanto, a la fecha no han tenido la primera cosecha de ñame.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 28 de 118

**Resolución No. 247 de 2022:** *las beneficiarias están a la espera de la entrega de los animales e insumos. Han adelantado la siembra de semillas que tienen en la zona, aun no se les entregado los activos productivos contemplado en el plan de inversión del PIDAR.*

### Unidad Técnica Territorial No. 3

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 23 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 3, se realizó el proceso de monitoreo a 7 de ellos (resoluciones No. 834 de 2019, 117 de 2018, 686 de 2018, 805 de 2019, 372 de 2020, 568 de 2021 y 546 de 2021), así mismo, se afirma que la UTT entregó información de la totalidad de los proyectos intervenidos, el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 834 de 2019:** *Los beneficiarios del Proyecto, manifiestan estar muy inconforme por que el PIDAR no arranca, y sienten preocupación por que se pueda cancelar, y se devuelvan los recursos a la ADR.*

**Resolución No. 117 de 2018:** *los beneficiarios manifiestan que a la fecha se ha realizado el encierro de la boca de la quebrada y se han entregado algunos artículos de pesca. Sin embargo, algunas personas manifestaron gran inconformidad por los retrasos en la ejecución del Proyecto y la poca comunicación con el representante legal del PIDAR, la falta de algunas entregas de insumos y materiales.*

**Resolución No. 686 de 2018:** *los beneficiarios contactados manifestaron, que durante la ejecución del PIDAR, se ha venido realizando la entrega de los activos productivos contemplados en el PIDAR y la realización de talleres en costos de producción.*

**Resolución No. 805 de 2019:** *Los beneficiarios manifestaron, que han recibido gran parte de los activos productivo, algunos manifiestan la no preparación de sus lotes para la siembra de la semilla de pasto, pero en el módulo de gestión existe un acta de la preparación de todo los lotes.*

**Resolución No. 372 de 2020:** *Los beneficiarios contactados manifestaron estar a gusto, con los avances del PIDAR, expresaron que a la fecha han recibido capacitaciones, asistencia técnica, se realizó la preparación de los lotes y la entrega y siembra de la semilla de maíz y ñame.*

**Resolución No. 568 de 2021:** *En general los beneficiarios expresan su inconformismo con el PIDAR, dado que el tiempo pasa y el Proyecto a la fecha no presenta avances significativos; lo cual causa descontenta en las personas e incertidumbre acerca de la ejecución del mismo.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 29 de 118

**Resolución No. 546 de 2021:** *los beneficiarios manifiestan su inconformidad con el Proyecto, dado que se presentan demoras en su ejecución y a la fecha no han recibido los activos productivos que se contemplan en el plan de inversión del PIDAR.*

#### **Unidad Técnica Territorial No. 4**

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 19 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 4, se realizó el proceso de monitoreo a 6 de ellos (resoluciones No. 879 de 2019, 009 de 2020, 880 de 2019, 827 de 2019, 580 de 2019, 342 de 2020 y 431 del 2021), así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 1 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

Producto del mecanismo monitoreo, se identificaron dos alertas, una por Gestión del Tiempo al PIDAR Resolución No. 879 con fecha de 12 de julio de 2022 y otra, por Gestión del Tiempo al PIDAR Resolución No. 827 con fecha de 18 de agosto de 2022.

Respecto de la información suministrada por la Vicepresidencia de Integración Productiva mediante el módulo de gestión, se observó que aún están pendiente de subir algunos soportes de las evidencias de la ejecución del PIDAR, sin embargo, se requiere el cargue de toda la información asociada a los Proyectos de manera que se puede asegurar la medición de los indicadores

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 879 de 2019:** *En general los Beneficiarios del PIDAR, se encuentran inconformes por la demora en el comienzo de la ejecución del Proyecto; a la fecha no se ha realizado la entrega de los activos productivos contemplado en el plan de inversión.*

**Resolución No. 009 de 2020:** *Los beneficiarios, manifiestan estar contentos con la ejecución del PIDAR, a la fecha han recibido los activos productivos contemplados en el plan de inversión y la asistencia técnica; lo que ha permitido poner en marcha los procesos agroindustriales de la Asociación.*

**Resolución No. 880 de 2019:** *No se pudo realizar el monitoreo telefónico en las calidades que exige la ADR ya que la representante legal vive en la zona selvática del Catatumbo y no hay señal de teléfono celular, se intentó comunicación en tres ocasiones, pero no fue posible. A la fecha el PIDAR se encuentra en estado de ejecución con un avance del 25%, presenta un avance del 18% en activos productivos, 0% en asistencia técnica y 0% en contrapartida.*

**Resolución No. 827 de 2019:** *los beneficiarios, manifiestan estar agradecidos con el proyecto, pero inconformes por lo demora en entrega y puesta en marcha del centro de acopio de leche.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 30 de 118

**Resolución No. 580 de 2019:** los beneficiarios de las asociaciones MORACAR Y ACIFRUC manifiestan que se encuentran muy agradecidos con el Proyecto; pero los beneficiarios de la asociación ASPIJAC manifestaron su inconformismo por la maquina desgranadora de frijol entregada, dado que esta presenta fallas y no funciona.

**Resolución No. 342 de 2020:** los beneficiarios en general, manifiestan que han empezado a recibir los activos productivos contemplados en el PIDAR y las asistencias técnicas. Sin embargo, expresan su inconformismo debido a las demoras en el avance del Proyecto.

**Resolución No. 431 de 2021:** En general los beneficiarios se encuentran agradecidos con la ADR y a la expectativa de un mayor avance del PIDAR, a la fecha se tiene un avance del 0% en los bloques de activos productivos, asistencia técnica y contrapartida.

### Unidad Técnica Territorial No. 5

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 43 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 5, se realizó el proceso de monitoreo a 10 de ellos (resoluciones No. 343 de 2020, 174 de 2021, 830 de 2019, 192 de 2021, 300 de 2020, 360 de 2020, 823 de 2019(2), 10 de 2020), así mismo, se afirma que la UTT entregó información de la totalidad de los Proyectos intervenidos, el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

Producto del mecanismo monitoreo, se identificaron 2 alertas, una por Gestión del Tiempo al PIDAR Resolución No. 830 con fecha de 30 de agosto de 2022 y otra por Gestión del tiempo y Gestión de la información, al PIDAR RES No. 316 con fecha del 30 de agosto de 2022.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 343 de 2020:** Todos los beneficiarios contactados conocen los alcances del Proyecto, entiende la participación de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, como ente cofinanciador, manifiestan que existe muy buena comunicación por parte del representante legal, están conformes con la entrega de los activos productivos, en este caso, fertilizantes de producción para café, igualmente todos están satisfechos con la asistencia técnica y todos reconocen que este Proyecto les va a mejorar su calidad de vida.

**Resolución No. 174 de 2021:** los beneficiarios informan que hay cambio del representante legal y se va a realizar una asamblea para sustituirlo, por ahora el vicepresidente de la junta cumple con esa función, todos los beneficiarios contactado tienen inconformidad por las demoras en la entrega de los activos productivos. Sin embargo, entienden que las demoras se deben a asuntos de trámites para la consecución de los materiales, pero les avisaron que pronto harán de nuevo la convocatoria, manifiestan que a pesar de esta situación este Proyecto les mejora su calidad de vida, todos los beneficiarios contactados ya cuentan con el predio listo para el establecimiento de acuerdo a sus obligaciones como contrapartida.

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 31 de 118

**Resolución No. 830 de 2019:** *Los beneficiarios contactados manifiestan por una parte no conocer el Proyecto y por otro parte descontento con las cooperativas cafeteras, por la falta de comunicación y/o información sobre el Proyecto. Solo dos personas contestaron que conocían el PIDAR, manifestando alegría por el gran beneficio que va a generar a los productores de café.*

**Resolución No. 192 de 2021:** *en general los beneficiarios expresan conocer muy bien el Proyecto, que participaron en la socialización de este y reconocen que este PIDAR les mejorara su calidad de vida, ya que el cultivo de la mora tecnificado aumenta los rendimientos y rentabilidad. Las personas ya tienen el terreno preparado y ya han empezado a realizar la siembra de las moras.*

**Resolución No. 316 de 2020:** *Las 4 personas contactadas, conocen del Proyecto, afirman que fue socializado, sin embargo no tienen claro cuando es la duración del tiempo del mismo ya que las demoras han hecho que pierdan las cuentas, consideran que el PIDAR ha perdido impacto, que se quedaron con los terrenos preparados y los materiales tanto vegetal como herramientas los han entregado de manera muy lenta, cuestionan la falta de acompañamiento técnico por la no contratación oportuna de los técnicos para la asistencia técnica, consideran muy mala la comunicación, hacen tiempo no se reúnen y no saben cómo proceder, valoran el acompañamiento de la ADR, pero lo perciben más desde el punto administrativo, mas no desde el punto de vista técnico. Mencionaron que ya entregaron buena parte de la herramienta pero que alguna ya está desgastada porque hace meses hicieron esa entrega, igualmente afirman haber recibido las plantas de plátano y cacao, pero insisten en la falta de asistencia técnica.*

**Resolución No. 300 de 2020:** *el listado de los beneficiarios del PIDAR reportados en el formato F-EFP 002 Caracterización población beneficiaria donde se registran los 34 beneficiarios, solo cuenta con 7 beneficiarios con número telefónico, dificultando el cumplimiento mínimo para el muestreo telefónico. A demás, se debe estar actualizando los números telefónicos, ya que 4 de estos, contestaron como número equivocado. se le solicitó por vía correo electrónico al apoyo a la supervisión una base de datos actualizada con números telefónicos, donde contestó por vía telefónica que la mayoría de los beneficiarios no tienen número telefónico directo y el que tiene, mantiene sin cobertura cuando están en el resguardo.*

**Resolución No. 360 de 2020:** *los beneficiarios manifiestan su satisfacción con el Proyectos, a la fecha han recibido las herramientas y parte de los insumos que se contemplan en el plan de inversión; actualmente ya han empezado a cosechar el arroz sin contratiempos y consideran que el PIDAR va a impactar de manera positiva su calidad de vida, mejorando su situación económica y alimentaria.*

**Resolución No. 823 de 2019 (intervención de julio):** *los beneficiarios manifiestan que se les entrego todo el material vegetal, insumos y herramientas establecidas en el Proyecto, manifiesta que existe muy poca comunicación con el representante legal, lo que dificulta el trabajo en equipo, expresan la importancia de trabajar antes a la adecuación de suelos con zonas de drenaje, ya que las inundaciones en época de invierno afectan las actividades agrícolas en esta región. Las personas tienen mucha expectativa con el cultivo de coco ya que están pensando en establecer un centro de transformación en aceite y cumplir así con todo el ciclo de producción y*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 32 de 118

*transformación, agradecen la participación y acompañamiento del ADR como entidad de cofinanciación.*

**Resolución No. 823 de 2019 (intervención de septiembre):** *De las 3 llamadas contestadas, solo 1 beneficiario manifestó que estaba muy contento con el Proyecto y, que le entregaron todos los activos productivos.*

*2 beneficiarios manifestaron que ya no hacen parte del PIDAR. Manuel Dionicio González Moreno, expresa que desde el principio se retiró, ya que se encuentra en la ciudad de Medellín hace aproximadamente 5 años y, por qué el Proyecto no contemplaba pago de los jornales para el establecimiento y mantenimiento del cultivo. El beneficiario Elvis James Ramírez Gurumende, manifestó que, solo le dieron \$500.000 en efectivo y con esa plata alcanzó a comprar 500 palmas de coco y las sembró, pero no le entregaron más material vegetal, tampoco le dieron insumo, ni ha tenido visita de asistencia técnica, por eso tomo la decisión de retirarse del Proyecto.*

**Resolución No. 10 de 2020:** *de los 13 beneficiarios contactados, Todos están de acuerdo en que el Proyecto es de gran importancia e impacta bastante la región, 2 de ellos manifiestan que quedo mal ubicado, 5 manifiestan que no están activos en el Proyecto y que por lo tanto no están muy informados sobre el PIDAR en general ; 8 manifiestan no tener conocimiento de la duración del Proyecto , ni lo que se va a entregar, y tampoco sobre la Agencia de Desarrollo Rural - ADR , todos conocen la representante legal, pero que no se han creado canales de comunicación con ella para estar bien informados, 10 de los 13 beneficios contactados, dicen no haber recibido asistencia técnica , ni tampoco haber asistido a talleres o capacitaciones.*

*En general se observa falta de información a todos los beneficiarios con respecto a los avances de la ejecución lo que genera falta empoderamiento y relacionamiento de los beneficiarios con la Corporación, la mayoría manifiesta que no tienen conocimiento de los avances del Proyecto y tampoco de ADR y UNODC. Es muy importante fortalecer los canales de difusión y de información con los beneficiarios.*

### **Unidad Técnica Territorial No. 6**

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 24 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 6, se realizó el proceso de monitoreo a 7 de ellos (resoluciones No. 321 de 2021, 193 de 2021, 298 de 2020, 229 de 2022, 557 de 2021, 569 de 2021 y 432 de 2022), así mismo, se afirma que la UTT entregó información de la totalidad de los proyectos intervenidos, el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

Producto del mecanismo monitoreo, se identificaron las siguientes alertas:

Gestión de la información al PIDAR Resolución No. 193 con fecha de 15 de julio de 2022.

Gestión del Tiempo al PIDAR Resolución No. 569 con fecha de 15 de julio de 2022.

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 33 de 118

Gestión del Tiempo al PIDAR Resolución No. 298 con fecha de 08 de agosto de 2022.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 321 de 2021:** Los beneficiarios, mostraron su alta expectativa con el desarrollo del PIDAR, ya han recibido visitas por parte de los asistentes técnicos en sus predios y se encuentran a la espera que sean entregados los activos productivos, para empezar a transformar el café producido en la finca y así mejorar su nivel de vida y el de toda su familia.

**Resolución No. 193 de 2021:** *las beneficiarias están a gusto con lo entregado por la ADR, a la fecha, todas las personas contactadas están muy satisfechas con lo realizado en el Proyecto, se han realizado entregas a 146 de las 154 productoras, quedando el resto a la espera de procesos administrativos por abandono de sus predios o fallecimiento.*

*Se están realizando al mismo tiempo capacitaciones con el SENA, las cuales les terminaran de dar los conocimientos necesarios, para hacer el perfil de tasa y realizar la comercialización como café de origen, como es el objetivo del proyecto.*

**Resolución No. 298 de 2020:** *los beneficiarios están muy a gusto con lo entregado por la ADR, a la fecha, todas las personas contactadas están muy contentas con lo realizado en el Proyecto.*

*En los TDR al vivero se le solicitó mora sin tuna, y muchas de las plantas resultaron con tuna, igual realizaron la siembra y están dando manejo y control cultural; en el momento la mora ya está sembrada y entró en la primera producción en muy pequeña cantidad, y no de muy buena calidad ya que la ola invernal no permite que se haya una buena calidad de la fruta; ya se entregó toda la madera para el tutorado, este se encuentra ya instalado y se está dando manejo cultural al cultivo.*

**Resolución No. 229 de 2022:** *los beneficiarios se encuentran a la expectativa del desarrollo del proyecto, esperan que se realicen las entregas; conocen lo que se les va a entregar por parte del Proyecto y tienen toda la disposición para el trabajo y para hacer que el proyecto continúe creciendo una vez se acabe el tiempo de ejecución de 12 meses.*

**Resolución No. 557 de 2021:** *los beneficiarios están muy a gusto con lo presentado por la Agencia y tienen toda la expectativa de que va a suceder una vez se termine la implementación del Proyecto, inicie la asistencia técnica y se reactive la venta de panela pulverizada al aliado comercial.*

*En el momento no se está produciendo panela pulverizada, porque el aliado comercial no ha vuelto a pedir producto y tienen un pedido por recoger en uno de los trapiches comunitarios del Proyecto; y por otro motivo, que no se tiene las instalaciones necesarias para poder realizar la producción de la panela pulverizada y están a la espera de tener las mejoras y los activos productivos, para seguir realizando la producción.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 34 de 118

**Resolución No. 569 de 2021:** *los beneficiarios manifiestan tener mucha expectativa con el desarrollo del PIDAR, ya han empezado a recibir visitas por parte de los asistentes técnicos en sus predios y se están realizando las entregas de los activos productivos, tienen todo el convencimiento que el Proyecto va ser un éxito y les va ayudar a mejorar sus condiciones de vida y las de toda su familia.*

Resolución No. 422 de 2022: *Los beneficiarios se encuentran satisfechos con la ejecución del PIDAR, sin embargo, resaltan que el Proyectos ha tenido muchos retrasos y cambios; lo cual ha retrasado la ejecución.*

### **Unidad Técnica Territorial No. 7**

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 32 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 7, se realizó el proceso de monitoreo a 8 de ellos (resoluciones No. 651 de 2018, 634 de 2018, 248 de 2022, 383 2021, 239 de 2022, 219 de 2021, 606 de 2018 y 878 2020), así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 2 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

Producto del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas a los PIDAR intervenidos durante los meses de julio a septiembre.

Se observa que pendiente el cargue de información de las ejecuciones de los PIDAR en el módulo de gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 651 de 2018:** *en general los beneficiarios manifestaron estar conformes con los avances del Proyecto; a la fecha se les ha entregado insumos, equipos, herramientas, maquinaria y han recibido asistencia técnica y capacitaciones.*

Resolución No. 634 de 2018: *los beneficiarios manifestaron tener conocimiento de la entrega de un tractor, aunque no tienen claras las especificaciones de lo que tendrían que recibir.*

*El señor Luis Enrique Ortiz, afirma estar retirado del Proyecto.*

**Resolución No. 248 de 2022:** *las beneficiarias tienen conocimiento del Proyecto. En general, señalaron haber asistido a la socialización y estar a espera de la ejecución de las actividades y entrega de insumos del PIDAR.*

**Resolución No. 383 de 2021:** *los beneficiarios contactados indicaron que, a pesar de que aún no se ha dado comienzo a la ejecución del PIDAR, no presentan inconformidades diferentes a los tiempos que se habían comunicado para dar inicio al Proyecto. Manifestaron tener conocimiento frente a los objetivos del PIDAR, sin embargo, no tienen claro cuándo va a*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 35 de 118

comenzar la ejecución de este, ni cuáles son exactamente los activos productivos que se van a entregar.

**Resolución No. 239 de 2022:** *la totalidad de los beneficiarios contactados manifestaron tener conocimiento de los objetivos del Proyecto, activos productivos que van a recibir y reconocen a la ADR como entidad cofinanciadora del PIDAR. Actualmente las personas están avanzando con las adecuaciones de terreno (preparación y siembra de pasto) asociado a la contrapartida.*

**Resolución No. 219 de 2021:** *los beneficiarios se encuentran a la expectativa del desarrollo del Proyecto, ya que pretenden realizar labores comerciales que les permita mejorar sus ingresos a futuro y mejorar la calidad de vida de sus familias.*

**Resolución No. 606 de 2018:** *los beneficiarios expresan que la adquisición de los activos productivos se encuentra en proceso de invitación a licitar IAL, que se ha hecho entrega de la picadora y se encuentran en espera de los tanques para el reservorio de agua y los beneficiarios se encuentran esperando el cierre, ya que el tiempo desde la cofinanciación hasta el tiempo de la ejecución los tiene ansiosos de ver la culminación del Proyecto.*

**Resolución No. 878 de 2020:** *los beneficiarios han manifestado que ya se ha hecho entrega de las máquinas de ordeño y los saladeros que estaban pendientes por recibir. La mayoría confirma haber recibido las herramientas, insumos, equipos y asistencia técnica que debieron ser entregados según el plan de inversión. Algunos afirman no estar conformes con la calidad de las guadañas, ya que no son aptas para trabajo pesado. Todos señalan estar satisfechos con los talleres y capacitaciones, aunque no se ha cumplido con el cronograma inicial.*

### **Unidad Técnica Territorial No. 8**

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 19 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 8, se realizó el proceso de monitoreo a 6 de ellos (resoluciones No. 244 de 2022, 249 de 2022, 67 de 2022, 361 de 2020, 616 de 2021 y 617 de 2021), así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 2 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

Resultado del mecanismo monitoreo, se identificaron las siguientes alertas por Gestión de las adquisiciones, Gestión de la calidad, Gestión de costos, Gestión de la información y Gestión del tiempo, al PIDAR RES No. 361 con fecha del 05 de julio de 2022.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 244 de 2022:** *Se evidencia la motivación de las mujeres por recibir este Proyecto y poder trabajar en ello desde sus predios, pero todas no tienen claridad del tiempo de duración del PIDAR.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 36 de 118

**Resolución No. 249 de 2022:** *las beneficiarias manifiestan agrado por el Proyecto y se siente contentas de poder trabajar en sus propias tierras; aunque presentan dudas acerca de la duración del PIDAR.*

**Resolución No. 67 de 2022:** *se evidencia motivación por parte de los beneficiarios por recibir este Proyecto y poder trabajar en ello, en sus cultivos de cacao; aunque todos no tienen claridad del tiempo de duración del PIDAR, por lo que se recomienda realizar boletines o reuniones informativas del estado del Proyecto.*

**Resolución No. 361 de 2020:** *de los 13 beneficiarios contactados, estos manifestaron no tener mucho conocimiento acerca del PIDAR, dado que desde la socialización del mismo no les han vuelto a dar información del Proyecto.*

**Resolución No. 616 de 2021:** *los beneficiarios manifiestan la importancia de las obras civiles realizadas a la fecha; aunque algunas personas manifestaron no tener mucho conocimiento acerca de avances del PIDAR.*

**Resolución No. 617 de 2021:** *los beneficiarios manifiestan la importancia de las obras civiles para mejorar los canales del distrito de riego de Asoprado; estos resaltan no tener conocimiento de los avances que se tienen a la fecha.”*

### **Unidad Técnica Territorial No. 9**

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 49 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 9, se realizó el proceso de monitoreo a 9 de ellos (resoluciones No. 576 de 2018, 375 de 2020, 144 de 2021, 832 de 2019, 143 de 2021, 220 de 2021, 346 de 2021, 228 de 2021 y 575 de 2021), así mismo, se afirma que la UTT no entregó información de los formatos de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

Producto del mecanismo monitoreo, se identificó la siguiente alerta por Gestión de la información al PIDAR Resolución No. 228 con fecha de 4 de agosto de 2022.

Respecto de la información suministrada por la Vicepresidencia de Integración Productiva mediante el módulo de gestión, se observó que aún están pendiente de subir algunos soportes de las evidencias de la ejecución del PIDAR, sin embargo, se requiere el cargue de toda la información asociada a los Proyectos de manera que se puede asegurar la medición de los indicadores

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de algunos de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 576 de 2018:** *Lo beneficiarios contactados manifestaron tener conocimiento del Proyecto al cual están vinculados, informan que a la fecha han recibido el kit de herramientas,*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 37 de 118

*insumos y material vegetal; aunque la calidad de la semilla no fue la mejor. Actualmente están recibiendo la asistencia técnica proporcionada por el PIDAR.*

**Resolución No. 375 de 2020:** *de los 11 los beneficiarios contactados manifiestan que han recibido talleres y capacitaciones, por parte del PIDAR. Por otra parte, el 50% de las personas contactadas manifestaron no haber asistido a la reunión de socialización y no haber sido citados para más reuniones del Proyecto.*

**Resolución No. 144 de 2021:** *los beneficiarios contactados manifiestan no haber recibido capacitaciones, con relación a la entrega de estudio suelos estos ya fueron entregados de manera parcial a las personas. En general los beneficiarios señalan que los deberían invitar a todas las reuniones o comités, que se realicen con relación al PIDAR.*

**Resolución No. 832 de 2019:** *los beneficiarios se muestran expectantes por la importancia de este Proyecto para el beneficio de la comercialización de café. Las personas resaltan que como acuerdo del mismo PIDAR, se les debe comprar la producción de café a todos los afiliados sin importar el volumen de producción.*

**Resolución No. 143 de 2021:** *los beneficiarios contactados de manera general, manifiestan estar vinculados de manera activa al PIDAR y haber recibido el material necesario para la construcción del beneficiadero de café. Sin embargo, algunos beneficiarios contactados expresan no estar recibiendo la asistencia técnica por parte de los profesionales contratados para dicha labor.*

**Resolución No. 220 de 2021:** *los beneficiarios en general, manifiestan estar contento con la ejecución del PIDAR a la fecha y haber participado en la socialización del mismo; sin embargo, expresan que el PIDAR presenta demoras en la ejecución.*

**Resolución No. 346 de 2021:** *todos los beneficiarios contactados expresaron estar a la expectativa de cómo se va a desarrollar el Proyecto, puesto que a la fecha no ha iniciado su ejecución. Sin embargo, las personas se encuentran motivadas y con gran interés.*

**Resolución No. 228 de 2021:** *los beneficiarios se encuentran a la expectativa de la construcción y dotación del molino, con el objetivo de generar valor agregado a su producción.*

*Han participado activamente en cada uno de los comités técnicos locales, como en lo nacionales; pero no ven que los procesos administrativos ante la UTT sean ágiles, estas demoras en cada uno de las decisiones, ha conllevado a que el PIDAR se encuentre desfinanciado al momento del monitoreo*

**Resolución No. 575 de 2021:** *Todos los beneficiarios contactados expresaron que conocen tanto el proyecto como las semillas que les van a entregar, pero no recuerdan que más les van a entregar, de los activos que se proyectaron como entregables y que están estipulados dentro del POA.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 38 de 118

## Unidad Técnica Territorial No. 10

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 50 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 10, se realizó el proceso de monitoreo a 13 de ellos (resoluciones No. 256 de 2020, 313 de 2020, 496 de 2018, 232 de 2020, 340 de 2020, 492 de 2021, 472 de 2021, 493 de 2021, 325 de 2020, 255 de 2020, 481 de 2021, 494 de 2021 y 484 de 2021), así mismo, se afirma que la UTT entregó la totalidad de información en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

Producto del mecanismo monitoreo, se identificó la siguiente alerta por Gestión del tiempo al PIDAR RES No. 313 con fecha de 19 de julio de 2022.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 256 de 2020:** *las beneficiarias contactadas manifiestan estar contentas con la ejecución del PIDAR, están pendientes de la entrega de los últimos activos productivos y de esta manera se dé el cierre del Proyecto.*

**Resolución No. 313 de 2020:** *la comunidad se muestra satisfecha y expectante con la producción de plátano, a su vez, manifiestan preocupación por el periodo de lluvias, que conlleva al crecimiento del Río Caquetá y pérdidas de los cultivos.*

**Resolución No. 496 de 2018:** *los beneficiarios contactados manifiestan estar satisfechos con la ejecución del PIDAR y actualmente se encuentran en proceso de escritura del lote en Córdoba (plata de procesamiento), que pertenece al municipio y tramitan que el laboratorio (Guachucal), quede a nombre de la Asociación y no del resguardo.*

**Resolución No. 232 de 2020:** *en general los beneficiarios manifiestan estar satisfechos con el Proyecto y ratifican haber recibido 4 ovejas, guanga o telar, además de insumos (fertilizante mineral y orgánico y semillas de pasto), capacitaciones y visita por personal técnico a sus fincas.*

**Resolución No. 340 de 2020:** *los beneficiarios en general manifestaron satisfacción con el Proyecto y ven el mismo como una excelente alternativa productiva para su zona. Están a la espera de la cosecha de banano que se avecina.*

**Resolución No. 492 de 2021:** *los beneficiarios contactados conocen el Proyecto al cual están vinculados, están a la espera de la ejecución de las obras y empezar a cumplir con los compromisos adquiridos. Solicitan mayor información sobre los avances del PIDAR.*

**Resolución No. 472 de 2021:** *En general los beneficiarios se encuentran a la expectativa del comienzo del PIDAR, a la fecha no han recibido activos productivos; dados que están en la elaboración de los TDR de los mismos.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 39 de 118

**Resolución No. 493 de 2021:** *dada la cobertura telefónica en la zona, solo se pudo contactar un beneficiario, el cual manifiesta que actualmente no ha comenzado la ejecución física del Proyecto, dado que no se ha reunido la totalidad de la documentación de los requisitos habilitantes.*

**Resolución No. 325 de 2020:** *en general los beneficiarios manifestaron su insatisfacción con el PIDAR, dado que pasa el tiempo y no se evidencia avances significativos al interior del mismo.*

**Resolución No. 255 de 2020:** *la totalidad de los beneficiarios contactados manifestaron estar satisfechos con el PIDAR, haber recibido los activos productivos a satisfacción y estar agradecidos con la ADR.*

**Resolución No. 481 de 2021:** *los beneficiarios manifiestan estar agradecido con la ejecución del PIDAR, pero les gustaría que este avanzara más rápido.*

**Resolución No. 494 de 2021:** *las personas manifiestan estar contentas de pertenecer al PIDAR y estar a la expectativa de que este comience su ejecución.*

**Resolución No. 484 de 2021:** *los beneficiarios se encuentran expectantes del cumplimiento de documentación pendiente para comenzar la ejecución y que se puedan entregar los componentes del Proyecto.*

### **Unidad Técnica Territorial No. 11**

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 32 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 11, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos (resoluciones No. 470 de 2021, 503 de 2018, 476 de 2021 y 486 de 2021), así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 2 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

Respecto de la información suministrada por la Vicepresidencia de Integración Productiva mediante el módulo de gestión, se observó que aún están pendiente de subir algunos soportes de las evidencias de la ejecución del PIDAR, sin embargo, se requiere el cargue de toda la información asociada a los Proyectos de manera que se puede asegurar la medición de los indicadores

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución No. 470 de 2021:** *los beneficiarios contactados tienen conocimiento del Proyecto, sus objetivos y el alcance del mismo.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 40 de 118

*La beneficiaria Olga Quintero Pineda, mencionó que se retira del Proyecto por temas de salud, sin embargo, no se evidenció en el módulo de gestión de la VIP, la solicitud de renuncia y sustitución de la misma.*

*Resolución No. 503 de 2018: los beneficiarios manifestaron que las novillas que les entregaron en el proyecto la mayoría no cumplieron con la expectativa de producción de leche al día, sin embargo, estas fueron remplazadas por vacas de mejor producción leche (Producen 8 litros día/vaca). Adicionalmente estas vacas se han reproducido haciendo que se cuente con más ganado en los predios y de esta manera aumentar los ingresos y contar con un predio con pasto adecuado para la alimentación del ganado.*

*Resolución No. 476 de 2021: los beneficiarios contactados, conocen el PIDAR al cual están vinculados, los activos productivos que van a recibir, la duración del Proyecto y reconocen a la ADR, como entidad que cofinancia esta iniciativa.*

*Resolución No. 486 de 2021: los beneficiarios manifiestan su agradecimiento con la ADR, dado que la asociación no contaba con los equipos necesarios para realizar un buen manejo en el beneficio del café y gracias a la entrega de los activos productivos, van a poder mejorar la calidad del café y por ende la calidad de vida de las personas asociadas al Proyecto.*

## **Unidad Técnica Territorial No. 12**

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 29 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 12, se realizó el proceso de monitoreo a 10 de ellos (resoluciones No. 374 de 2020, 807 de 2019 (1), 199 de 2021, 230 de 2021, 567 de 2018, 384 de 2021, 373 de 2020, 578 de 2018 y 271 de 2021), así mismo, se afirma que la UTT no entregó información de los formatos de seguimiento a la implementación F-IMP-006 006 / F-IMP-014.

En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución 374 de 2020:** *los beneficiarios contactados manifestaron haber recibido la canoa y dan cuenta del recibo de la máquina de hielo y están esperando la entrega de los motores para poder empezar con las labores de extracción.*

**Resolución 807 de 2019 (intervención de julio):** *los beneficiarios contactados manifestaron que el proyecto ha tenido demoras en las entregas de los activos productivos, ya varias personas tienen sus novillas preñadas y está en aumento su pie de cría. Por otra parte, las personas manifestaron, que no todos recibieron asistencia técnica, como lo tenía contemplado el Proyecto.*

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 41 de 118

**Resolución 199 de 2021:** *los beneficiarios están a la espera de que se logre llevar a cabo la ejecución y que no haya más demoras; es una asociación que deja ver que trabajan en equipo, nadie habla a título personal, siempre fue diciendo "NOSOTROS" y todos los beneficiarios contactados expresaron que estaban dispuestos a realizar aportes económicos para llevar a feliz término el Proyecto y que sea para mostrar. Es importante para ellos el fortalecimiento asociativo más que el individual.*

**Resolución 230 de 2021:** *los beneficiarios contactados manifestaron no tener conocimiento acerca del PIDAR y otros que no tienen conocimiento del Proyecto desde el día que se realizó la socialización del mismo.*

**Resolución 567 de 2018:** *los beneficiarios se encuentran muy agradecidos con la ADR, dado que, gracias a la entrega del banco de maquinaria, han podido prestar un servicio a la comunidad y les ha permitido obtener ingresos económicos adicionales a su organización.*

**Resolución 384 de 2021:** *los beneficiarios, manifestaron estar a la expectativa de la entrega de los activos productivos contemplado en el POI; también expresaron que consideran que con la ejecución de este Proyecto van a mejorar sus condiciones de vida.*

**Resolución 373 de 2020:** *todos los beneficiarios contactados expresaron que han recibido todo lo referente a insumos, semillas, equipos, asistencia técnica y talleres. Solo dos personas presentaron inconformidad, dado que las semillas entregadas no les germinaron.*

**Resolución 807 de 2019 (intervención de septiembre):** *los beneficiarios expresaron su descontento de la manera en que se propuso la entrega de los toros, debido a la no entrega a todos de la plata para la compra de ellos, como lo habían propuesto; algunos dicen que no saben si los compraron o no, porque no los han visto.*

**Resolución 578 de 2018:** *los beneficiarios manifiestan que el representante legal anterior William Navia, les negó la entrega de las guadañas aduciendo que tenía retrasos con la siembra de las plántulas y a otros beneficiarios les negó el derecho a la entrega de una machetes. Actualmente los beneficiarios se encuentran en la búsqueda de un comprado, debido al deterioro en la negociación de con Condimentos El Rey.*

**Resolución 271 de 2021:** *Todos los beneficiarios contactados expresaron que conocen tanto el proyecto como las entregas de los activos que se proyectaron como entregables y que están estipulados dentro del POA.*

### **Unidad Técnica Territorial No. 13**

Durante el tercer trimestre de 2022, de los 26 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 13, se realizó el proceso de monitoreo a 7 de ellos (resoluciones No. 792 de 2019, 554 de 2021, 337 de 2021, 468 de 2021, 877 de 2019, 250 de 2022 y 191 de 2021), así mismo, se afirma que la UTT

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 42 de 118

entregó información de 8 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 / F-IMP-014.

En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de los PIDAR monitoreados:

**Resolución 792 de 2019:** *los beneficiarios contactados, se encuentran satisfechos con la ejecución del Proyecto y están haciendo uso de los tractores y accesorios entregados.*

**Resolución 554 de 2021:** *solo se puedo contactar un solo beneficiario, por problemas de cobertura de señal telefónica; este manifestó que se encuentra pendiente que el PIDAR comience su ejecución y considera que tendrá grandes beneficios técnicos y económicos.*

**Resolución 337 de 2021:** *los beneficiarios contactados, manifiestan estar satisfechos con el PIDAR, a pesar de los retrasos que ha tenido con la entrega de los activos productivos contemplados en el POI. Sin embargo, reconocen que los equipos entregados por cada familia van a mejorar la producción.*

**Resolución 368 de 2021:** *los beneficiarios se encuentran a la expectativa del inicio del PIDAR y manifiestan que en la zona la señal de teléfono es muy débil; además no es habitual el uso y manejo de equipos electrónicos, dadas las creencias étnicas.*

**Resolución 877 de 2019:** *las personas contactadas se encuentran satisfechos con la ejecución del PIDAR y resaltan la calidad de las asistencias técnicas impartidas por parte de los profesionales contratados para el desarrollo del Proyecto.*

**Resolución 250 de 2022:** *las beneficiarias contactadas reconocen las actividades, tiempos de ejecución y alcance de lo definido en el PIDAR. Existe gran desconocimiento de la cofinanciación y aportes por parte de ADR, FEDEGAN, SENA y Gobernación.*

**Resolución 191 de 2021:** *las beneficiarias, manifiestan un total agrado con la ejecución del PIDAR, resaltan que ya han terminado las capacitaciones de 40 horas, impartida por parte del SENA.*

## 2.2 Monitoreo por entidad ejecutora

En los proyectos monitoreados para el tercer trimestre, se observa que el 69% de la ejecución se realiza mediante ejecución directa, el cual tiene 75 proyectos, seguido del cooperante Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, el cual tiene 29 proyectos; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO es el cooperante con menor número de proyectos

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
	Código: F-SCP-028	Versión: 1

Página 43 de 118

Tabla No. 6: Información monitoreo por entidad ejecutora

Nombre entidad ejecutora	Cantidad de proyectos monitoreados	Valor cofinanciado	Cantidad de alertas
EJECUCIÓN DIRECTA	76	77.574.131.766	13
UNODC	29	56.431.615.989	6
FAO	5	5.483.882.314	0
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>\$139.489.630.069</b>	<b>19</b>

Fuente: elaboración propia

A continuación, se relaciona la información correspondiente a las instancias ejecutoras, con base en el número de proyectos monitoreados por cada convenio y la alerta que se tramitó en desarrollo del mecanismo de monitoreo IN HOUSE

Tabla No. 7: Información monitoreo entidad ejecutora por convenio

Cooperante/ Convenio	Cantidad de proyectos monitoreados	Valor cofinanciado	Cantidad de alertas
<b>FAO</b>	<b>5</b>	<b>5.483.882.314</b>	<b>0</b>
Convenio Cooperación Internacional No.FAO-749-2017	3	4.416.749.314	0
Convenio Cooperación Internacional No.FAO-517-2017	2	1.067.133.000	0
<b>EJECUCIÓN DIRECTA</b>	<b>76</b>	<b>77.574.131.766</b>	<b>13</b>
Resolución 342 de 2018	-	\$891.187.224	0
Resolución 793 de 2019	-	\$731.059.536	0
Resolución 792 de 2019	-	\$3.085.065.566	0
Resolución 805 de 2019	-	\$5.688.272.966	0
Resolución 807 de 2019 (1)	-	\$2.660.584.566	0
Resolución 827 de 2019	-	\$1.680.654.458	1
Resolución 823 de 2019 (1)	-	\$726.088.566	0
Resolución 834 de 2019	-	\$3.602.193.458	0
Resolución 830 de 2019	-	\$1.958.743.384	1
Resolución 832 de 2019	-	\$2.966.390.566	0
Resolución 879 de 2019	-	\$539.761.989	1
Resolución 880 de 2019	-	\$471.684.566	0
Resolución 878 de 2019	-	\$496.390.566	0

Calle 43 # 57 - 41 CAN Bogotá, Colombia  
Línea de Atención  
PBX: (57) + (1) + 7482227

www.adr.gov.co - @ADR\_Colombia  
atencionalciudadano@adr.gov.co

Resolución 877 de 2019	-	\$537.114.828	0
Resolución 229 de 2020	-	\$1.038.911.827	0
Resolución 228 de 2020	-	\$1.957.583.268	1
Resolución 232 de 2020	-	\$927.159.225	0
Resolución 256 de 2020	-	\$580.793.562	0
Resolución 255 de 2020	-	\$340.667.725	0
Resolución 300 de 2020	-	\$350.534.225	0
Resolución 298 de 2020	-	\$325.871.475	1
Resolución 316 de 2020	-	\$406.612.225	2
Resolución 325 de 2020	-	\$4.414.669.919	0
Resolución 313 de 2020	-	\$506.644.725	1
Resolución 341 de 2020	-	\$770.382.314	0
Resolución 343 de 2020	-	\$551.212.569	0
Resolución 340 de 2020	-	\$1.332.301.113	0
Resolución 172 de 2021	-	\$528.109.794	1
Resolución 173 de 2021	-	\$268.171.579	0
Resolución 175 de 2021	-	\$1.528.109.794	0
Resolución 174 de 2021	-	\$178.633.434	0
Resolución 192 de 2021	-	\$525.147.092	0
Resolución 193 de 2021	-	\$808.302.794	1
Resolución 191 de 2021	-	\$329.578.309	0
Resolución 219 de 2021	-	\$173.925.396	0
Resolución 220 de 2021	-	\$828.109.794	0
Resolución 271 de 2021	-	\$92.889.894	0
Resolución 330 de 2021	-	\$445.350.000	0
Resolución 230 de 2021	-	\$652.961.417	0
Resolución 337 de 2021	-	\$82.265.794	0
Resolución 346 de 2021	-	\$1.821.972.364	0
Resolución 351 de 2021	-	\$791.803.818	0
Resolución 570 de 2021	-	\$500.000.000	0
Resolución 577 de 2021	-	\$707.527.510	0
Resolución 383 de 2021	-	\$163,821,178	0
Resolución 384 de 2021	-	\$695.493.729	0
Resolución 431 de 2021	-	\$232.765.794	0
Resolución 432 de 2021	-	\$767.171.794	0
Resolución 472 de 2021	-	\$698.807.794	0
Resolución 470 de 2021	-	\$713.417.294	0
Resolución 468 de 2021	-	\$186.579.894	0
Resolución 492 de 2021	-	\$1.557.741.763	0

Resolución 494 de 2021	-	\$199.855.294	0
Resolución 493 de 2021	-	\$673.120.083	0
Resolución 484 de 2021	-	\$490.109.788	0
Resolución 481 de 2021	-	\$2.007.832.560	0
Resolución 476 de 2021	-	\$2.034.354.027	0
Resolución 486 de 2021	-	\$3.000.701.602	0
Resolución 546 de 2021	-	\$3.742.697.068	0
Resolución 552 de 2021	-	\$1.400.950.294	0
Resolución 557 de 2021	-	\$2.555.627.470	0
Resolución 554 de 2021	-	\$470.972.744	0
Resolución 568 de 2021	-	\$1.210.549.285	0
Resolución 569 de 2021	-	\$3.198.163.682	1
Resolución 575 de 2021	-	\$289.991.014	0
Resolución 229 de 2022	-	\$367.148.684	0
Resolución 245 de 2022	-	\$581.270.000	0
Resolución 246 de 2022	-	\$470.423.000	2
Resolución 247 de 2022	-	\$700.000.000	0
Resolución 248 de 2022	-	\$279.000.000	0
Resolución 239 de 2022	-	\$705.664.430	0
Resolución 244 de 2022	-	\$740.064.953	0
Resolución 249 de 2022	-	\$354.968.597	0
Resolución 250 de 2022	-	\$413.684.500	0
<b>UNODC</b>	<b>29</b>	<b>56.431.615.989</b>	<b>6</b>
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-197-2016	2	1.284.477.000	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-518-2017	3	6.255.588.100	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-684-2017	11	15.431.186.764	1
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-785-2017	3	7.760.748.900	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-289-2018	9	25.071.404.701	5
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-356-2021	1	628.210.524	0
<b>Total, general</b>	<b>110</b>	<b>\$139.489.630.069</b>	<b>19</b>

Fuente: Elaboración propia

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 46 de 118

Como se observa en la tabla anterior, se llevó a cabo monitoreo sobre 110 PIDAR, que se cofinancian mediante ejecución directa, cooperante UNODC a través de 6 convenios y FAO a través de 2 convenios; dicho ejercicio dio origen a la apertura de 25 alertas, las cuales fueron tramitada en el presente año, por parte de la Dirección.

Nota: Las alertas levantadas a los PIDAR con Resolución 806 (3), 299 (1) y 577(2) son producto de intervenciones realizadas en el segundo trimestre; estas son relacionadas dado que, surtido el tiempo de verificación jurídica, estas fueron notificadas a la UTT correspondientes durante julio y agosto del 2022.

Tabla No. 8: Alertas tramitadas en el marco del monitoreo

Cooperante/ Convenio	Cantidad de proyectos monitoreados	Valor cofinanciado	Cantidad de alertas
<b>FAO</b>	<b>5</b>	<b>5.483.882.314</b>	<b>0</b>
Convenio Cooperación Internacional No.FAO-749-2017	3	4.416.749.314	0
Convenio Cooperación Internacional No.FAO-517-2017	2	1.067.133.000	0
<b>EJECUCIÓN DIRECTA</b>	<b>76</b>	<b>77.574.131.766</b>	<b>13</b>
Resolución 342 de 2018	-	\$891.187.224	0
Resolución 793 de 2019	-	\$731.059.536	0
Resolución 792 de 2019	-	\$3.085.065.566	0
Resolución 805 de 2019	-	\$5.688.272.966	0
Resolución 807 de 2019 (1)	-	\$2.660.584.566	0
Resolución 827 de 2019	-	\$1.680.654.458	1
Resolución 823 de 2019 (1)	-	\$726.088.566	0
Resolución 834 de 2019	-	\$3.602.193.458	0
Resolución 830 de 2019	-	\$1.958.743.384	1
Resolución 832 de 2019	-	\$2.966.390.566	0
Resolución 879 de 2019	-	\$539.761.989	1
Resolución 880 de 2019	-	\$471.684.566	0
Resolución 878 de 2019	-	\$496.390.566	0
Resolución 877 de 2019	-	\$537.114.828	0
Resolución 229 de 2020	-	\$1.038.911.827	0
Resolución 228 de 2020	-	\$1.957.583.268	1
Resolución 232 de 2020	-	\$927.159.225	0
Resolución 256 de 2020	-	\$580.793.562	0
Resolución 255 de 2020	-	\$340.667.725	0
Resolución 300 de 2020	-	\$350.534.225	0
Resolución 298 de 2020	-	\$325.871.475	1
Resolución 316 de 2020	-	\$406.612.225	2
Resolución 325 de 2020	-	\$4.414.669.919	0
Resolución 313 de 2020	-	\$506.644.725	1

Resolución 341 de 2020	-	\$770.382.314	0
Resolución 343 de 2020	-	\$551.212.569	0
Resolución 340 de 2020	-	\$1.332.301.113	0
Resolución 172 de 2021	-	\$528.109.794	1
Resolución 173 de 2021	-	\$268.171.579	0
Resolución 175 de 2021	-	\$1.528.109.794	0
Resolución 174 de 2021	-	\$178.633.434	0
Resolución 192 de 2021	-	\$525.147.092	0
Resolución 193 de 2021	-	\$808.302.794	1
Resolución 191 de 2021	-	\$329.578.309	0
Resolución 219 de 2021	-	\$173.925.396	0
Resolución 220 de 2021	-	\$828.109.794	0
Resolución 271 de 2021	-	\$92.889.894	0
Resolución 330 de 2021	-	\$445.350.000	0
Resolución 230 de 2021	-	\$652.961.417	0
Resolución 337 de 2021	-	\$82.265.794	0
Resolución 346 de 2021	-	\$1.821.972.364	0
Resolución 351 de 2021	-	\$791.803.818	0
Resolución 570 de 2021	-	\$500.000.000	0
Resolución 577 de 2021	-	\$707.527.510	0
Resolución 383 de 2021	-	\$163.821.178	0
Resolución 384 de 2021	-	\$695.493.729	0
Resolución 431 de 2021	-	\$232.765.794	0
Resolución 432 de 2021	-	\$767.171.794	0
Resolución 472 de 2021	-	\$698.807.794	0
Resolución 470 de 2021	-	\$713.417.294	0
Resolución 468 de 2021	-	\$186.579.894	0
Resolución 492 de 2021	-	\$1.557.741.763	0
Resolución 494 de 2021	-	\$199.855.294	0
Resolución 493 de 2021	-	\$673.120.083	0
Resolución 484 de 2021	-	\$490.109.788	0
Resolución 481 de 2021	-	\$2.007.832.560	0
Resolución 476 de 2021	-	\$2.034.354.027	0
Resolución 486 de 2021	-	\$3.000.701.602	0
Resolución 546 de 2021	-	\$3.742.697.068	0
Resolución 552 de 2021	-	\$1.400.950.294	0
Resolución 557 de 2021	-	\$2.555.627.470	0
Resolución 554 de 2021	-	\$470.972.744	0
Resolución 568 de 2021	-	\$1.210.549.285	0
Resolución 569 de 2021	-	\$3.198.163.682	1
Resolución 575 de 2021	-	\$289.991.014	0
Resolución 229 de 2022	-	\$367.148.684	0
Resolución 245 de 2022	-	\$581.270.000	0
Resolución 246 de 2022	-	\$470.423.000	2
Resolución 247 de 2022	-	\$700.000.000	0
Resolución 248 de 2022	-	\$279.000.000	0
Resolución 239 de 2022	-	\$705.664.430	0
Resolución 244 de 2022	-	\$740.064.953	0
Resolución 249 de 2022	-	\$354.968.597	0
Resolución 250 de 2022	-	\$413.684.500	0
<b>UNODC</b>	<b>29</b>	<b>56.431.615.989</b>	<b>6</b>

Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-197-2016	2	1.284.477.000	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-518-2017	3	6.255.588.100	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-684-2017	11	15.431.186.764	1
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-785-2017	3	7.760.748.900	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-289-2018	9	25.071.404.701	5
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-356-2021	1	628.210.524	0
<b>Total general</b>	<b>110</b>	<b>\$139.489.630.069</b>	<b>19</b>

Fuente: elaboración propia

A continuación, se relaciona la información correspondiente a las instancias ejecutoras, con base en el número de proyectos monitoreados por cada convenio y la alerta que se tramitó en desarrollo del mecanismo de monitoreo IN HOUSE.

Tabla No. 9: Relación de Alertas identificadas en el Monitoreo

No. BP	No. Resolución	Tipo de alerta	Fecha de tramite
<b>UTT 2</b>			
3102	172	Alerta Gestión de la información del proyecto.	12 de julio de 2022.
148	505	Alerta Gestión de la información del proyecto.	18 de agosto de 2022.
3266	246	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	28 de septiembre de 2022.
3266	246	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	28 de septiembre de 2022.
<b>UTT 4</b>			
1021	879	Alerta Gestión del tiempo del proyecto	12 de julio de 2022.
327	827	Alerta Gestión del tiempo del proyecto	18 de agosto de 2022.
<b>UTT 5</b>			
402	830	Alerta Gestión del tiempo del proyecto	30 de agosto de 2022.
3039	316	Alerta Gestión de la información del proyecto	30 de agosto de 2022.
3039	316	Alerta Gestión del tiempo del proyecto	30 de agosto de 2022.
<b>UTT 6</b>			
3070	193	Alerta Gestión de la información del proyecto.	15 de julio de 2022.
3255	569	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	15 de julio de 2022.
526	298	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	08 de agosto de 2022.
<b>UTT 8</b>			

2154	361	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	5 de julio de 2022
2154	361	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	5 de julio de 2022
2154	361	Alerta Gestión de costos del proyecto.	5 de julio de 2022
2154	361	Alerta Gestión de la información del proyecto.	5 de julio de 2022
2154	361	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	5 de julio de 2022
<b>UTT 9</b>			
619	806	Alerta Gestión de la información del proyecto.	25 de julio de 2022
619	806	Alerta Gestión de otros factores.	25 de julio de 2022
619	806	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	4 de agosto de 2022.
171	228	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	4 de agosto de 2022.
2005	299	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	8 de agosto de 2022.
<b>UTT 10</b>			
3034	313	Alerta Gestión del tiempo del proyecto	19 de julio de 2022
<b>UTT 13</b>			
153	577	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	15 de julio de 2022.
153	577	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	15 de julio de 2022.

Fuente: elaboración propia

Tabla No. 10: Estado de los proyectos monitoreados por entidad ejecutora

Convenio que lo respalda	Año de inicio	Estado del proyecto					
		No. Proyectos notificados	No. Proyectos socializados	No. Proyectos ejecutados	No. Proyectos ejecutados esperando cierre	No. Proyectos cerrados	No. Proyectos suspendidos
UNODC	2018	0	4	22	2	1	0
FAO	2018	0	0	4	1	0	0
EJECUCIÓN DIRECTA	2019	0	19	55	1	1	0

Fuente: elaboración propia

### 2.3 Información de los proyectos monitoreados durante el trimestre

- Ejecución directa.

De los 76 proyectos que se están ejecutando bajo esta modalidad, el 25% (19 PIDAR), se encuentran en estado de socializado, el 72.4% (55 PIDAR), se encuentran en estado de ejecución, el 1.3% (1 PIDAR), se encuentran en ejecutado esperando cierre y el 1.3% (1 PIDAR), se encuentran en estado de cierre.

Durante el monitoreo a los diferentes PIDAR, se realizó el levantamiento de trece alertas, a los proyectos con resoluciones 827, 830, 879, 228, 298, 316 (2), 313, 172, 193, 569,

246 (2); bajo las tipologías de Gestión del tiempo del PIDAR, Gestión de la información y Gestión de otros factores del PIDAR; dado los retrasos en el cumplimiento del cronograma de actividades consignado en el módulo de gestión de la VIP, la falta de entrega de activos productivos, los incrementos superiores al 10% en las actividades contempladas en el PIDAR y la falta de cargue de información en el módulo de gestión de la VIP. Estas alertas fueron tramitadas, durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, por parte de la Dirección de Seguimiento y Control.

Mediante el control ciudadano, se contactaron 720 beneficiarios, a quienes se le realizaron preguntas asociadas al estado del PIDAR, con el objetivo de validar el estado de mismo y tener una percepción de los beneficiarios en la ejecución de los Proyectos.

- **Convenio UNODC**

De los 29 proyectos que se están ejecutando bajo este convenio, el 14% (4 PIDAR), se encuentra en estado socializado, el 76% (22 PIDAR), se encuentra en estado de ejecución, el 7% (2 PIDAR), se encuentran en ejecutado esperando cierre. y el 3% (1 PIDAR), se encuentra suspendido.

Durante el monitoreo a los diferentes PIDAR, se realizó el levantamiento de seis alertas, a los proyectos con resoluciones 361 (5) y 505; bajo las tipologías de Gestión del tiempo del PIDAR, Gestión de las adquisiciones, Gestión de la información, Gestión de la calidad y Gestión de los costos; dado a los retrasos en el cumplimiento del cronograma de actividades consignado en el módulo de gestión de la VIP, la falta de entrega de activos productivos y la falta de cargue de información en el módulo de gestión de la VIP. Estas alertas fueron tramitadas, durante los meses de julio y agosto del presente año, por parte de la Dirección de Seguimiento y Control.

Mediante el control ciudadano, se contactaron 308 beneficiarios, a quienes se le realizaron preguntas asociadas al estado del PIDAR, con el objetivo de validar el estado de mismo y tener una percepción de los beneficiarios en la ejecución de los Proyectos.

- **Convenio FAO**

De los 5 proyectos que se están ejecutando bajo este convenio, el 20% (1 PIDAR), se encuentra en estado de ejecución y el 80% (4 PIDAR), se encuentra en estado de ejecutado esperando cierre.

Durante el ejercicio de monitoreo, a los diferentes PIDAR, los profesionales de la Dirección de Seguimiento y Control no identificaron alertas a los PIDAR objeto de intervención.

Mediante el control ciudadano, se contactaron 52 beneficiarios, a quienes se le realizaron preguntas asociadas al estado del PIDAR, con el objetivo de validar el estado de mismo y tener una percepción de los beneficiarios en la ejecución de los Proyectos.

En los proyectos monitoreados en etapa de Ejecución de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 operados bajo la modalidad de cooperantes y ejecución directa, se evidencia que han superado el tiempo máximo de ejecución correspondiente a 12 meses, se presenta la misma situación en algunos de los proyectos cofinanciados en 2022, cofinanciados bajo la modalidad Fondo Mujer Emprende – FME, con un tiempo de ejecución de 2 meses.

## 2.4 Indicador avance de los proyectos

Durante el tercer trimestre del año 2022, se realizó monitoreo y seguimiento a 184 Proyectos, asociados a **206 informes de seguimiento y control**, que corresponde a 110 monitoreos IN HOUSE, 60 visitas iniciales, 16 visitas de seguimiento en ejecución y 20 visitas de cierre, cada uno de ellos, cuenta con el informe y la respectiva matriz de indicadores; el porcentaje de avance se distribuye de la siguiente manera, 80 proyectos, equivalente al ( 43,5% ), presentan un estado de avance hasta un 15% de ejecución, 45 proyectos (24,5% ), tienen un avance de ejecución entre el 16% y el 50%, 39 proyectos (21%), una ejecución entre el 51% y el 99% y 20 proyectos (11%), con una ejecución al 100%.

## 2.5 Indicador estado de los proyectos monitoreados


Se relaciona el estado de los 184 proyectos en monitoreo, seguimiento y control durante el periodo, 11% de los proyectos están en estado cerrado, 3% ejecutados esperando cierre, 53% en ejecución, 33% socializados y 0% suspendidos.

Tabla No.11: Estado del proyecto y número de proyectos monitoreados

Estado del proyecto	Número de proyectos monitoreados	%
Cerrado	20	11%
Ejecutado esperando cierre	5	3%
En ejecución	98	53%
Socializado	61	33%
Suspendido	0	0%

Fuente: elaboración propia

Gráfica N° 5: Estados de los proyectos monitoreados

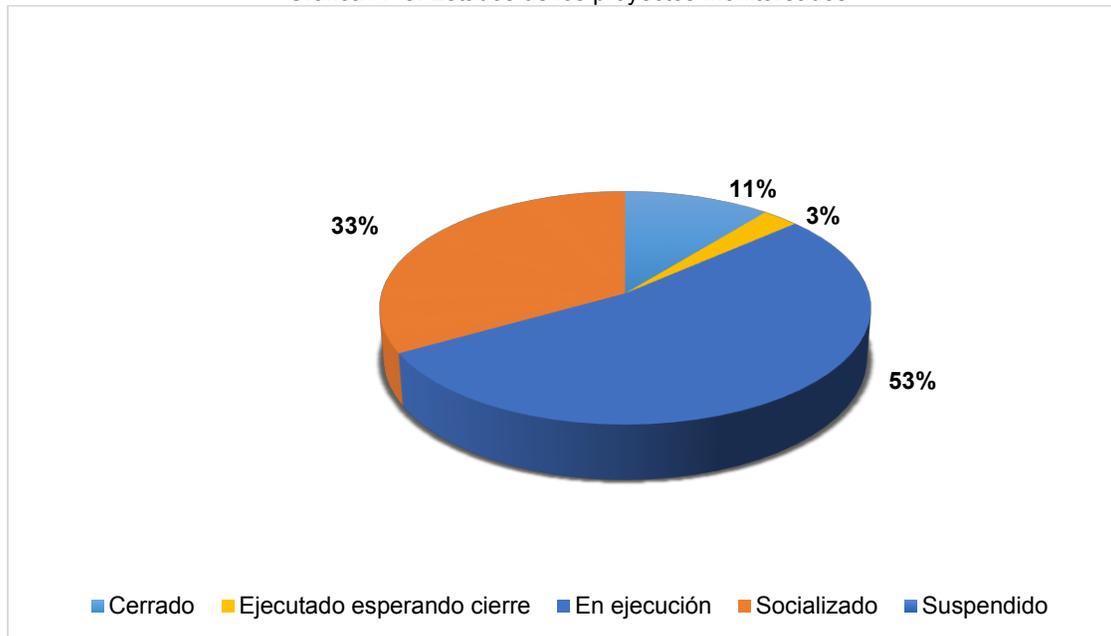

Fuente: elaboración propia


## 2.6 Modificaciones al Plan de inversión

Para el análisis de la modificación en el plan de inversión, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Se realizó monitoreo y seguimiento a 184 proyectos.
- Se solicitó a los Gestores, la información de cada una de las 13 Unidades Técnicas Territoriales – UTT.
- Se constató que todo lo que fue objeto de análisis se alineara al reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial.
- El monitoreo, seguimiento y control a los proyectos de inversión, se basa como mínimo en la verificación del cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones de conformidad con la información contenida en los documentos que soportan la estructuración.

Resultado de este análisis, durante el presente trimestre, se reporta que, de 184 proyectos con monitoreo y seguimiento, 108 presentaron modificación en los planes de inversiones, lo que corresponde al 59% y 76 proyectos no presentaron modificaciones, equivalente al 41% del total.

Gráfica N° 6: Modificaciones al plan de inversión

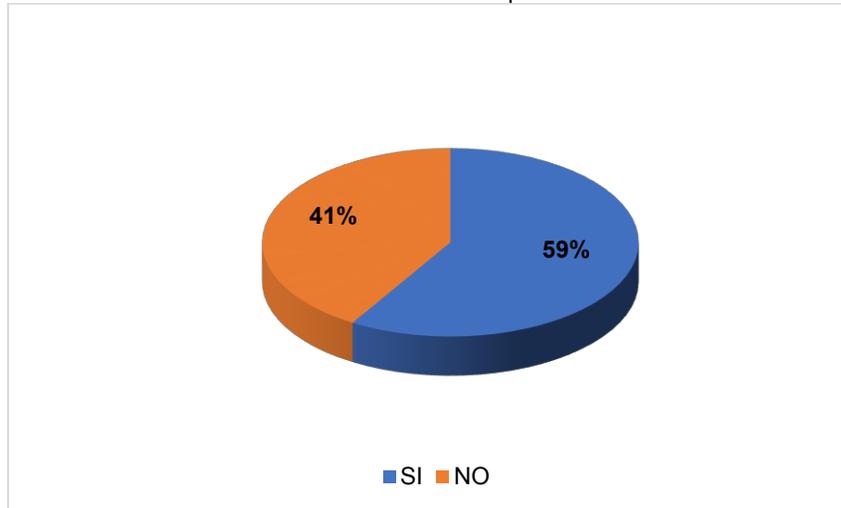

Fuente: elaboración propia


## 2.7 Cumplimiento y promedio en tiempos de ejecución

Teniendo en cuenta lo indicado en el reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial; el monitoreo, seguimiento y control a los proyectos de inversión, se basa como mínimo en la verificación del cumplimiento del cronograma para la ejecución de los PIDAR, propuesto en la etapa de estructuración. Resultado de dicho análisis se puede concluir que durante el trimestre se reporta que, del total de proyectos monitoreados, 70 vienen cumpliendo con los tiempos de ejecución, equivalente al 38% y en 114 proyectos, que representan el 64%, se presentó ampliación en los plazos establecidos.

Se calculó para 20 PIDAR con informe final y de cierre financiero, el promedio de días de ejecución, con la información que reposa en la Data Maestra, con el tiempo en días desde la notificación, reportado por las Unidades Técnicas Territoriales – UTT, en el último informe de seguimiento a la implementación (F-IMP-006) o de seguimiento a la ejecución PIDAR modalidad ejecución directa (F-IMP-014) y verificado en los informes finales – cierre financiero (F-IMP-007), obteniendo los siguientes resultados: El promedio de días programados para la ejecución de los PIDAR es de 344 días (11,3 meses) y el promedio encontrado de días en ejecución es de 941 días (31 meses).

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 54 de 118

Gráfica N° 7: Cumplimiento en tiempos de ejecución

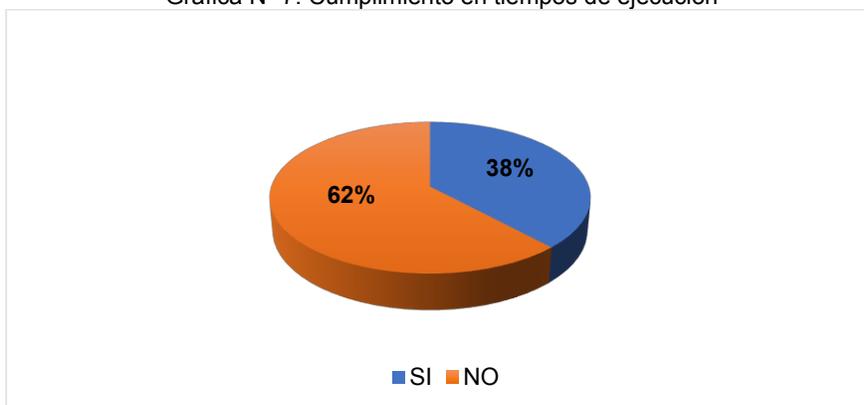

Fuente: elaboración propia

## 2.8 Indicadores de resultados (Proyectos cerrados)

El Reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial, en su numeral 10.1 MONITOREO Y SEGUIMIENTO, define que: el monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión se basa como mínimo en los indicadores y metas de gestión, producto y resultado; en este sentido, los indicadores de resultado son aquellos que cuantifican los efectos relacionados con la implementación del proyecto, buscando medir los cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros (DNP, 2018).

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, se aplicó la encuesta de cierre a 239 personas beneficiarias de 30 PIDAR. Esta información fue tabulada, teniendo como fuentes de verificación del ejercicio de la Dirección, la revisión del informe de cierre y la matriz de indicadores de cada uno de los proyectos, como mecanismo para verificar el cumplimiento de los bienes y servicios entregados, a través de la implementación de los componentes y actividades del proyecto, permitiendo evidenciar el cambio en las condiciones de bienestar y percepción de los beneficiarios.

Las preguntas se enfocaron a evaluar el nivel de satisfacción que se tiene sobre la ejecución del PIDAR, se indagó el nivel de mejora en las condiciones de vida, la mejora en los conocimientos propios de la línea productiva atendida, satisfacción propia sobre el proyecto, percepción de aumento frente a sus ingresos después de la ejecución del proyecto y el nivel de acompañamiento por parte de la ADR en el desarrollo del proyecto.


Con la aplicación de la encuesta, se obtienen los siguientes resultados:

### 2.8.1 Calidad de vida

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 55 de 118

Para este indicador fueron encuestadas 239 personas beneficiarias en 20 proyectos, a las cuales se les preguntó - califique de 1 a 5 si el proyecto mejoró su calidad de vida ( 5 es la calificación más alta y 1 la más baja); con lo cual se obtuvo que el 82%, correspondiente a 196 beneficiarios, dieron una calificación de “mucho” (5), siendo esta la calificación más alta en cuanto a la percepción mejoramiento de la calidad de vida después de implementado el proyecto, el 18%, 42 beneficiarios, dieron una calificación de “algo”.

Gráfica N° 8: Calidad de vida




Fuente: elaboración propia

## 2.8.2 Mejoramiento de Conocimiento

De los 239 beneficiarios encuestados, 199 beneficiarios, correspondiente al 83%, respondieron que, con la ejecución del proyecto, mejoraron mucho su conocimiento, 39 beneficiarios, equivalente al 15,5%, manifestaron que aumentaron algo su conocimiento, una persona, equivalente al 1,5%- manifestó que muy poco mejoró su conocimiento.

Gráfica N° 9: Mejoramiento de Conocimiento




Fuente: elaboración propia

### 2.8.3 Satisfacción

Para este indicador se realizó la siguiente pregunta a los beneficiarios encuestados: califique su satisfacción con los productos recibidos en el proyecto; obteniendo como resultado que el 76%, correspondiente a 181 beneficiarios, dieron una calificación de excelente, 58 personas entrevistadas, equivalente al 24%, manifestaron como buena la satisfacción con los productos recibidos en el proyecto.

Gráfica N° 10: Satisfacción




Fuente: elaboración propia

### 2.8.4 Aumento en los ingresos

El 69% de las personas (166 beneficiarios) a las cuales se les realizó la pregunta: ¿El desarrollo del proyecto aumento sus ingresos?, respondieron que con el proyecto aumentó mucho su nivel de ingresos. El 26% (63 beneficiarios) consideraron que sus ingresos aumentaron algo. El 3%, que corresponde a 6 personas, consideraron que muy poco habían aumentado sus ingresos y 4 personas entrevistadas, equivalente al 2%, manifestaron que en nada se habían aumentado sus ingresos. Para este análisis, se debe tener en cuenta, que la mayoría de los proyectos se encontraban en fase de ejecución y por encontrarse en fase de implementación, no se ha llegado a la etapa de producción y de comercialización del producto correspondiente.

Gráfica N° 11: Aumento en los ingresos




Fuente: elaboración propia

### 2.8.5 Percepción de la ADR

Con este indicador al realizar la siguiente pregunta: ¿La ADR brindó acompañamiento en el proceso de desarrollo del proyecto?, se midió el grado de acompañamiento por parte de la ADR, ante lo cual 239 entrevistados, equivalente al 100%, manifestaron sentirse acompañados por parte de la Agencia durante la ejecución de los proyectos.

Gráfica N° 12: Percepción



Fuente: elaboración propia

### 3. Alertas y Planes de Mejoramiento

#### 3.1 Alertas

La Dirección de Seguimiento y Control ha identificado y tramitado desde el inicio de la gestión de alertas y con corte a 30 de septiembre del 2022, un total de 651 alertas, 504 se encuentran en estado “Cerrada” y 147 permanecen en estado “Abierta”.

De acuerdo con lo anterior, se relaciona el consolidado de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR con la identificación y trámite de alertas a partir del monitoreo, seguimiento y control, el origen y los estados de las alertas al corte del trimestre.

Tabla N° 12: Alertas

Estado (Cerrado – Abierta)	UTT	No. Res	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	209	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	243	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	243	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20

Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	401	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	402	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	501	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	635	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	229	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	02-08-21	En segunda visita de seguimiento se evidencia que los activos (embarcaciones) entregados al PIDAR se han vendido.	02-08-21
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	824	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	15-12-21	El proyecto fue estructurado para ejecutarse en 12 meses, y a la fecha de apertura de alerta, lleva 16 meses de ejecución con un retraso de 4 meses.	15-12-21
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	793	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	13-12-21	Alerta relacionada con atrasos en los tiempos de ejecución del PIDAR.	13-12-21
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	824	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	24-12-21	Alerta relacionada por el incumplimiento de las metas de los indicadores del PIDAR (de resultado, de producto y de gestión) establecidas en la formulación del mismo.	24-12-21
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	824	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24-12-21	En el módulo de gestión no se observa el registro de las actividades de contrapartida comprometidas en el proyecto.	24-12-21
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	824	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	28-12-21	Inconformidad con el proceso de comunicación del proyecto en relación a que aseguran no los llaman para las capacitaciones ni para las jornadas de trabajo	28-12-21
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	229	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	02-05-22	En segunda visita de seguimiento	02-05-22
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	229	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	02-05-22	En segunda visita de seguimiento	02-05-22
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	229	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	02-05-22	En segunda visita de seguimiento	02-05-22
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	229	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	02-05-22	Alerta relacionada con un retraso en los tiempos de ejecución del PIDAR, de 6 meses y 23 días, a la fecha de apertura de la alerta en Visita In Sitio.	02-05-22
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	229	Alerta Gestión de otros factores.	Otro	02-05-22	Alerta relacionada por el incumplimiento de lo señalado en la resolución de cofinanciación en el artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios y la Organización. Visita In Sitio.	02-05-22
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	229	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Otro	02-05-22	Alerta relacionada con el incumplimiento de las metas de los indicadores del PIDAR (de resultado, producto y gestión) establecidas en la formulación del mismo.	02-05-22
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	358	Alerta Gestión de la	Otro	07-06-22	Falta información que permita realizar las actividades de seguimiento y control.	07-06-22

			información del proyecto.				
Abierta	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	358	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	07-06-22	A la fecha de apertura de la Alerta el proyecto no ha iniciado, ni presenta avances técnicos ni financieros, presentando un retraso de 15 meses	07-06-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	104	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	14-08-20	Alerta relacionada con la mortalidad de material vegetal del proyecto.	14-08-20
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	104	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	505	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	636	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	03-09-20	Alerta relacionada con información aportada por el rte legal acerca de predios con limitantes para la implementación del PIDAR y con el inconformismo de beneficiarios que no han recibido activos del PIDAR.	03-09-20
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	636	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	636	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	799	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	997	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	997	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	24-12-20	Alerta relacionada con los tiempos de ejecución del proyecto	24-12-2020
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	636	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	22-12-21	Alerta relacionada con la información incompleta que permita realizar la medición de los indicadores, soportes de asistencia técnica, certificado de contrapartida y soportes que acrediten	22-12-21
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	799	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	27-02-22	Alerta relacionada con la falta de los cerdos en el PIDAR.	27-02-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	233	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	07-04-22	El PIDAR supero los 12 meses, para su ejecución.	07-04-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	233	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	31-03-22	Falta el acta entrega de los semovientes, falta las actas de asistencias técnicas y actas de los CTGL.	31-03-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	175	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Otro	02-05-22	Se observó un retraso en la compra de los activos productivos, lo cual no se está desarrollando de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de inversiones y/o cronograma de actividades	02-05-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San	175	Alerta Gestión de los	Otro	03-05-22	Se observó un retraso en la contratación del personal asociado al	03-05-22

	Andrés y providencia		recursos del proyecto.			Proyecto, esto pone en riesgo el cumplimiento de los indicadores establecidos en el marco lógico.	
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	172	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Otro	29-04-22	Alerta relacionada con un retraso en la contratación del personal asociado al Proyecto, esto pone en riesgo el cumplimiento de los indicadores establecidos en el marco lógico.	29-04-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	172	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	Otro	29-04-22	Alerta relacionada con un retraso en la compra de los activos productivos, lo cual no se esta desarrollando de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de inversiones y/o cronograma de actividades	29-04-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	315	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	25-04-22	Alerta relacionada con un atraso de seis meses sin lograr avances significativos en las actividades establecidas en el marco lógico.	25-04-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	104	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	11-05-22	Alerta relacionada por exceder el tiempo, en el que se verifica un atraso de más del 10% respecto al tiempo establecido en el cronograma de actividades o del Plan Operativo Anual de Inversiones.	11-05-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	636	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	28-06-22	Se encuentra pendiente la entrega de la totalidad de los semovientes, activos productivos y excedentes	28-06-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	636	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	Monitoreo	29-06-22	Alerta por incumplimiento de la prestación total de la asistencia técnica, no se observa la reanudación de los contratos de los tres médicos veterinarios o en su defecto la contratación de los nuevos tres profesionales para culminar con las labores de la asistencia técnica integral y las ECAS.	29-06-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	505	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	18-08-22	Alerta relacionada con la falta de información y soportes en la ejecución del PIDAR.	18-08-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	799	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Otro	25-08-22	Alerta relacionada con activos incompletos (báscula corral sin monitor) que no son utilizados.	25-08-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	245	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	Otro	26-08-22	Alerta relacionada con un retraso en la contratación del personal asociado al Proyecto	26-08-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	245	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Otro	26-08-22	Alerta relacionada con un retraso en la compra de los activos productivos (herramientas y semillas).	26-08-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	245	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	26-08-22	Alerta relacionada con un atraso de dos meses sin lograr avances significativos en las actividades descritas en el marco lógico.	26-08-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	799	Alerta Gestión de otros factores.	Otro	26-08-22	Alerta relacionada con la existencia de 7 beneficiarios que fueron sustituidos internamente y dos que se retiraron del PIDAR, sin reemplazo. Estos cambios fueron realizados internamente por la asociación, sin el debido procedo estipulado por ADR.	26-08-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	799	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Otro	30-08-22	No se encuentra actualizado el Plan de inversión, no registra en el módulo de gestión de la VIP el formato F-IMP-005 donde se acreditan las	30-08-22

						modificaciones realizadas en el comité técnico de gestión local No. 07 del 28 de mayo de 2019 (visita in situ)	
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	246	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	28-09-22	Alerta relacionada con un atraso de dos meses sin lograr avances significativos en las actividades establecidas en el marco lógico.	28-09-22
Abierta	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	246	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	Monitoreo	28-09-22	Alerta relacionada con un retraso en las actividades del personal asociado al Proyecto.	28-09-22
Abierta	3 - Córdoba y Sucre	117	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	3 - Córdoba y Sucre	117	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	23-11-20	Alerta relacionada con la información relacionada con la sustitución de beneficiarios	23-11-20
Abierta	3 - Córdoba y Sucre	117	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	23-11-20	Alerta relacionada con incumplimiento con las entregas y adecuaciones que se deben de tener en la ciénaga para el desarrollo del proyecto.	23-11-20
Abierta	3 - Córdoba y Sucre	575	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	3 - Córdoba y Sucre	805	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Abierta	3 - Córdoba y Sucre	805	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	25-12-2020	Alerta relacionada con retrasos en el tiempo de ejecución	25-12-2020
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	463	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	827	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	24-11-20	Alerta relacionada con los retrasos en el tiempo de ejecución del PIDAR	24-11-20
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	879	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	13-10-20	Alerta relacionada con denuncia por posibles irregularidades con la selección de beneficiarios notificada por entes de control (contraloría)	13-10-20
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	342	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	17-08-21	En el cronograma inicial del proyecto no se registra con claridad las actividades a desarrollar y no hay concordancia entre lo consignado en el marco lógico, pues el cronograma estipula una duración de un año y en el marco lógico de nueve meses.	17-08-21
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	879	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	27-02-22	Reiteración de Alerta por Gestión del Tiempo, no se ha ejecutado ninguna actividad dentro del proyecto constituyéndose en retraso de más del 10% en su ejecución.	27-02-22
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	879	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08-03-22	Reiteración de Alerta por Gestión de la información. Alerta relacionada con denuncia por posibles irregularidades con la selección de beneficiarios notificada por entes de control.	08-03-22
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	827	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	09-05-22	Alerta relacionada con un retraso superior al 10% en la ejecución de las actividades del PIDAR, ya que presenta 24 meses de retraso frente a los estipulado en el cronograma de actividades	09-05-22

Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	880	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	30-06-22	Alerta relacionada con un retraso de 21 meses a la fecha de emisión de la alerta con un retraso general porcentual del 175% con respecto a la línea del tiempo de ejecución.	30-06-22
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	342	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	05-07-22	Alerta relacionada con un retraso general porcentual del 25% con respecto a la línea del tiempo de ejecución del PIDAR	05-07-22
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	879	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	12-07-22	Reiteración por Gestión del Tiempo	12-07-22
Abierta	4 - Norte de Santander y Santander	827	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	18-08-22	Reiteración de esta alerta	18-08-22
Abierta	5 - Antioquia y Chocó	348	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Abierta	5 - Antioquia y Chocó	192	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	28-12-21	Alerta por retrasos en la ejecución del PIDAR e incumplimiento del cronograma de actividades.	28-12-21
Abierta	5 - Antioquia y Chocó	343	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	07-04-22	Varios beneficiarios manifestaron su retiro del proyecto y que aún figuran como beneficiarios, recibieron insumos y firmaron las actas de entrega del fertilizante	07-04-22
Abierta	5 - Antioquia y Chocó	830	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	30-08-22	Alerta presenta un retraso de 13 meses más de los contemplado, teniendo un retraso mayor del 10% respecto al tiempo establecido en el cronograma de actividades. El informe de seguimiento F-IMP 014 de julio de 2022 reporta un avance técnico del 40%.	30-08-22
Abierta	5 - Antioquia y Chocó	316	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	30-08-22	Alerta relacionada con la falta de información en el módulo de gestión, no se encuentra los documentos que permiten evidenciar de las actividades ejecutadas en la parte de asistencia técnica.	30-08-22
Abierta	5 - Antioquia y Chocó	316	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	30-08-22	Alerta relacionada con retraso en la ejecución del proyecto, lleva 18 meses de ejecución, superando el 10% de retraso en su ejecución. Aun les falta ejecutar 7 meses del componente de asistencia técnica integral	30-08-22
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	210	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	21-08-19	Alerta relacionada con la falta de capacitación del software de tipo administrativo. 20194200032033	20194200032033
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	210	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	03-08-20	Alerta relacionada con el tiempo de ejecución del PIDAR, han transcurrido 17 meses incumpliendo así el tiempo señalado para su ejecución y culminación.	03-08-20
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	210	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	31-07-20	Alerta relacionada con la información de ejecución del PIDAR.	31-07-20
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	210	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	210	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	614	Alerta Gestión de la	Monitoreo	06-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general	04-08-20

			información del proyecto.			por gestión de la información del proyecto.	
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	298	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	23-02-22	Alerta relacionada con retrasos en el tiempo de ejecución	23-02-22
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	193	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	15-07-22	Alerta relacionada con la Gestión de la información del proyecto	15-07-22
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	569	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	15-07-22	Se evidencia una situación de riesgo; debido a que, al mes de julio de 2022, el retraso del inicio de la ejecución física (entrega de activos productivos), está sobre el 20% del tiempo total de ejecución del proyecto y al momento no se ha dado inicio a la entrega de los activos productivos.	15-07-22
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	298	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-08-22	Se evidencia una situación de riesgo; debido a que, en el momento, el PIDAR presenta retraso en la terminación del proyecto de 11 meses y 18 días, con un desfase superior al 20% del tiempo total de ejecución del proyecto.	08-08-22
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	297	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	25-04-22	Surtieron cambios de orden de inversión sin modificar tiempo, lo que significa que su cierre administrativo y financiero se debió llevar a cabo durante el mes de marzo de 2022, y en el momento tiene un retraso de 26 días.	25-04-22
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	569	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Otro	31-08-22	Se pudo constatar en vista in situ, que el material vegetal de plátano (denominado colinos, cormos), no cumplía con la calidad que se esperaba	31-08-22
Abierta	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	569	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Otro	31-08-22	Se identifica que el cargue de la información de los informes de gestión no están actualizados	31-08-22
Abierta	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	878	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	21-12-21	Se identifica la ausencia de la información (actas de entrega y recibo a satisfacción, informe de seguimiento por parte de la UTT, formato F2 Caracterización población beneficiaria) de las actividades	21-12-21
Abierta	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	878	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	07-03-22	Retrasos en la ejecución de las actividades	07-03-22
Abierta	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	831	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	10-03-22	Retrasos en la ejecución de las actividades	10-03-22
Abierta	8 - Ibagué Tolima	291	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	18-03-22	Alerta relaciona con retrasos en las actividades planteadas dentro del proyecto de conformidad con el cronograma de ejecución.	18-03-22
Abierta	8 - Ibagué Tolima	361	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	05-07-22	Alerta relacionada con retrasos en la entrega de los bloques aprobados en el plan de adquisiciones.	05-07-22
Abierta	8 - Ibagué Tolima	361	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	05-07-22	Alerta relacionada con el no cumplimiento de las actividades previstas en el PIDAR, referente al desarrollo de la contrapartida.	05-07-22
Abierta	8 - Ibagué Tolima	361	Alerta Gestión de costos del proyecto.	Monitoreo	05-07-22	Alerta relacionada con un incremento en los costos de las actividades reportadas que superan el 10% del presupuesto.	05-07-22

Abierta	8- Ibagué Tolima	361	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	05-07-22	Alerta relacionada con la falta de información del remplazo de un beneficiario.	05-07-22
Abierta	8- Ibagué Tolima	361	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	05-07-22	Se evidencia un retraso mayor del 10% respecto al tiempo establecido con el cronograma de actividades y el plan operativo anual de inversiones.	05-07-22
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	576	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Alerta relacionada con inconsistencia en la documentación, que no permite evidenciar la entrega de activos productivos a beneficiario.	04-08-20
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	576	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	04-08-20	Alerta relacionada con el trámite formal de sustitución de beneficiarios del PIDAR	04-08-20
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	576	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	576	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	1474	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	17-09-19	Alerta por entrega de activos productivos a personas no reconocidas por la ADR como beneficiarios. 20194200037173	20194200037173
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	1474	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	17-09-19	Alerta relacionada con la falta de firma del ADR en actas de entrega y recibo de activos productivos. 20194200037173	20194200037173
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	1474	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	10-09-20	Alerta relacionada con la falta de información del proceso de ejecución, luego de consultar el módulo de gestión.	10-09-20
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	1556	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	16-07-20	Alerta relacionada con la falta de información que soporte la ejecución del PIDAR.	16-07-20
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	1556	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	16-07-20	Alerta relacionada con inconformismo de los beneficiarios respecto a los activos productivos recibidos.	16-07-20
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	1556	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	16-07-20	Alerta relacionada con información aportada por beneficiarios respecto a la entrega de dinero para la compra de la semilla.	16-07-20
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	1556	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	1586	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	806	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	23-09-21	A la fecha del presente seguimiento han transcurrido 8 meses a partir del 11 de octubre de 2020, fecha en la cual fue socializado el PIDAR, aclarando que el Primer Comité Técnico de Gestión Local se realizó el 13 de marzo de 2020 donde se aprobó el Plan Operativo de Inversiones POI y se definieron fechas de socialización del proyecto; revisado el cronograma de actividades planteado en el marco lógico no se observa la ejecución de actividades tales como: preparación de lotes para establecimiento de	23-09-21

						cultivos, compra de herramientas, compra de material vegetal y siembra de las áreas de cultivo, actividades que estaban previstas de ejecutar entre el segundo y quinto mes y teniendo en cuenta, que dicho	
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	228	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	24-11-21	Alerta relacionada con el incumplimiento en la ejecución de las actividades del cronograma.	24-11-21
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	299	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	24-11-21	Alerta por gestión del tiempo de ejecución del proyecto, toda vez que, las actividades en campo estipuladas en el cronograma, no se han empezado a ejecutar y estaban programadas desde el primer mes, a la fecha, el PIDAR está en último tercio del tiempo de ejecución de 12 meses.	24-11-21
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	832	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	07-06-22	Alerta relacionada con retraso en su cierre administrativo y financiero, el cual se debió llevar a cabo durante el mes de diciembre de 2021, y al momento de apertura de la alerta presenta un retraso de 23 meses.	07-06-22
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	375	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	14-06-22	Se identifica que el proyecto cuenta con una ejecución física del 10% presentando un desfase en la ejecución de actividades superior al 10%	14-06-22
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	375	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14-06-22	Se evidencia que el último F6 reportado es de fecha septiembre de 2021, adicionalmente y se han realizado cuatro CTGL de los cuales no se haya evidencia en el módulo de gestión.	14-06-22
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	806	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	25-07-22	Su cierre administrativo y financiero se debió llevar a cabo durante el mes de diciembre de 2021, y en el momento presenta un retraso de 23 meses.	25-07-22
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	806	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	25-07-22	Reclamación por parte de un beneficiario de que no se había realizado el desembolso de los recursos económicos correspondiente al valor de la compra del material vegetal de coco	25-07-22
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	806	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	04-08-22	Reiteración por Gestión del Tiempo	04-08-22
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	228	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	04-08-22	Reiteración de Alerta por Gestión del Tiempo	04-08-22
Abierta	9 - Cauca y Valle del Cauca	299	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-08-22	Reiteración de esta alerta	08-08-22
Abierta	10 - Nariño y Putumayo	325	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	02-05-22	El cronograma de actividades planteado a 12 meses, no se ha cumplido y no se observa la ejecución de actividades	02-05-22
Abierta	10 - Nariño y Putumayo	232	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	28-04-22	Alerta relacionada con el tiempo establecido en el cronograma de actividades o del Plan Operativo Anual	28-04-22
Abierta	10 - Nariño y Putumayo	313	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	19-07-22	Suscripción de contrato para la construcción de galpones sin la firma del contratista.	19-07-22
Abierta	11 - Huila y Caquetá	351	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	06-09-19	Alerta relacionada con la no ejecución de la contrapartida en la adecuación de los predios, retrasos en la	20194200039043

						ejecución de las actividades y construcción parcial de los activos productivos. Memorando 20194200039043	
Abierta	11 - Huila y Caquetá	351	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	02-09-20	Alerta relacionada con la no entrega de los activos productivos (secaderos de café).	02-09-20
Abierta	11 - Huila y Caquetá	351	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	11 - Huila y Caquetá	351	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	09-08-21	Alerta relacionada con la no entrega de los activos productivos (secaderos de café).	09-08-21
Abierta	11 - Huila y Caquetá	257	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	15-03-22	Presenta un retraso de 3.55 meses, cuando se cuenta a partir de la fecha de inicio, lo que supera el 10% del tiempo establecido por procedimiento	15-03-22
Abierta	11 - Huila y Caquetá	260	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	11-04-22	Se presenta un retraso de 8 meses a partir de la fecha de socialización	11-04-22
Abierta	12 - Meta y Vichada	567	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	12 - Meta y Vichada	578	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	26-07-19	Alerta relacionada con los retrasos en la ejecución del PIDAR por parte del cooperante. Memorando 20194200028513	20194200028513
Abierta	12 - Meta y Vichada	578	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	26-07-19	Alerta relacionada con las dudas generadas por los resultados de análisis de suelos. Memorando 20194200028513	20194200028513
Abierta	12 - Meta y Vichada	578	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	12 - Meta y Vichada	639	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	12 - Meta y Vichada	807	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	17-11-21	Alerta relacionada con el fallecimiento de un beneficiario.	17-11-21
Abierta	12 - Meta y Vichada	578	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06-12-21	Se evidencia una alerta relacionada por la falta de documentación.	06-12-21
Abierta	12 - Meta y Vichada	578	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06-12-21	Se identifica que 8 beneficiarios reportados en las actas de entrega y que recibieron activos productivos, no están dentro del listado inicial; y 24 beneficiarios que fueron contemplados inicialmente, no hay registro del recibo a satisfacción de los activos productivos.	06-12-21
Abierta	12 - Meta y Vichada	578	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	30-03-22	Reiteración de Alerta por Gestión de la información.	30-03-22
Abierta	12 - Meta y Vichada	373	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	25-04-22	Los procesos de compras y adquisiciones no se desarrollaron según los tiempos estipulados dentro del cronograma de actividades, lo que con lleva a un retraso de las demás actividades programas.	25-04-22
Abierta	12 - Meta y Vichada	807	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	24-11-21	No hay soportes de las compras, estado fitosanitario y entregas de novillas.	24-11-21

Abierta	12 - Meta y Vichada	374	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	02-09-22	Se identifican situaciones de riesgo relacionadas con la calidad de las lanchas entregadas como parte de los bienes activos para los beneficiarios.	02-09-22
Abierta	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	459	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08-09-20	Alerta relacionada con la falta de información que debe ser reportada por la supervisión del PIDAR	08-09-20
Abierta	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	459	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Abierta	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	577	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Abierta	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	577	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24-11-20	Alerta relacionada con la ausencia de información (actas de entregas)	24-11-20
Abierta	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	577	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	15-07-22	Se evidencian atrasos en el Plan de Adquisiciones, específicamente en el componente de Activos Productivos de la actividad.	15-07-22
Abierta	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	577	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	15-07-22	Presenta un retraso de más del 10% respecto al tiempo establecido en el cronograma de actividades o del Plan Operativo Anual de Inversiones.	15-07-22
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	109	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	138	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	243	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	09-10-19	Alerta relacionada con incumplimiento en la densidad de siembra definida en el Marco Lógico. 20194200041693	20194200041693
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	243	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	09-10-19	Alerta relacionada con la entrega de activos productivos en mal estado a beneficiarios 20194200041693	20194200041693
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	243	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	09-10-19	Alerta relacionada con la entrega de activos productivos a cada beneficiario. 20194200041693	20194200041693
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	243	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	09-10-19	Alerta relacionada con la falta de evidencia en soportes Records de listas técnicas y visitas realizadas. 20194200041693	20194200041693
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	243	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	09-10-19	Alerta relacionada con la entrega de dineros a beneficiarios sin claridad en su destinación. 20194200041693	20194200041693
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	243	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	09-10-19	Alerta relacionada con el incumplimiento en la siembra por falta de activos productivos. 20194200041693	20194200041693

Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	499	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	500	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	501	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	11-06-20	Alerta relacionada con especificaciones técnicas de los activos productivos del PIDAR. Memorando 20204200016153	20204200016153
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	501	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	11-06-20	Alerta relacionada con retraso en la entrega de activos productivos del PIDAR. Memorando 20204200016153	20204200016153
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	501	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	573	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	574	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	574	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	601	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	05-06-20	Alerta relacionada con la falta de evidencia que soporte trámite de reemplazo de beneficiario que manifiesta haber renunciado. Memorando 20204200015563	20204200015563
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	601	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	629	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	23-09-19	Alerta relacionada con las inquietudes de los beneficiarios en relación a las especificaciones de los activos. Memorando 20194200038343	20194200038343
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	629	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	629	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	630	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	630	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	630	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23-11-20	Alerta relacionada con la información relacionada con la sustitución de beneficiarios	23-11-20
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	635	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08-07-20	Alerta relacionada con la falta de información para trámite de sustitución de beneficiarios	08-07-20

Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	638	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	650	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con el tema de tenencia del predio y la relación jurídica de este con los beneficiarios. Memorando 20194200001663	20194200001663
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	650	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con inquietudes frente al manejo y administración del tractor para la medición de indicadores. Memorando 20194200001663	20194200001663
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	650	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	21-05-20	Alerta relacionada con el tiempo de ejecución del PIDAR. 20204200014123	20204200014123
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	650	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	21-05-20	Alerta relacionada con retrasos en adquisición de las pólizas para la maquinaria. 20204200014123	20204200014123
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	650	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	1217	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	19-03-19	Alerta relacionada con la sostenibilidad del proyecto en el tiempo y pendiente por acta de cierre. Memorando 20194200010593	20194200010593
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	1217	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	1307	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	1587	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con cambios en los activos productivos cofinanciados. 20194200001473	20194200001473
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	1587	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	18-06-20	Alerta relacionada al proceso de ejecución del PIDAR se ha extendido más de lo previsto en el marco lógico del proyecto 20204200016863	20204200016863
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	1587	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	18-06-20	Alerta relacionada con el no funcionamiento de activos productivos entregados por daño el colocarlos a operar. 20204200016863	20204200016863
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	1587	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	822	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	14-12-21	Alerta relacionada con atrasos en los tiempos de ejecución del PIDAR.	14-12-21
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	822	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	28-12-21	No se pudo observar las evidencias de los récords de las visitas de asistencia técnicas propuestas en el objetivo específico No.6	28-12-21
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	822	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	28-12-21	Una beneficiaria afirma no haber recibido las asistencias técnicas, lo que no se pudo corroborar al no estar la información de las actas y récords de asistencia técnica. impartidas.	28-12-21
Cerrada	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	822	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	28-12-21	Se verificó que la siembra de árboles para el sistema silvo pastoril no fue implementada por todos los beneficiarios.	28-12-21

Cerrada	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	233	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	31-03-22	Un atraso de dieciséis meses sin lograr avances en la adquisición de materiales de inseminación.	31-03-22
Cerrada	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	315	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	Otro	12-05-22	El personal asociado al Proyecto no ha sido contratado, y esto pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco lógico.	12-05-22
Cerrada	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	365	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	Monitoreo	03-05-22	Se evidencia un retraso en la contratación del personal de asistencia técnica.	03-05-22
Cerrada	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	365	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	10-05-22	excede el criterio orientador de la tipología de alerta por gestión del tiempo, que establece	10-05-22
Cerrada	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	365	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	Monitoreo	29-04-22	Se evidencia un retraso en la contratación del personal de asistencia técnica.	29-04-22
Cerrada	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	637	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	07-06-22	Es una reiteración de alerta por Gestión del tiempo	07-06-22
Cerrada	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	997	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	07-06-22	Alerta relacionada con la repartición de los semovientes entre los mismos beneficiarios y la falta de renunciaciones de los beneficiarios que salieron del PIDAR	07-06-22
Cerrada	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	173	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	21-06-22	Alerta relacionada con un atraso de siete meses sin lograr avances significativos en las actividades establecidas en el marco lógico.	21-06-22
Cerrada	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	172	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	12-07-22	Alerta por nueve (9) actas cargadas sin firmas, el acta No. 13 no reposa en el módulo de gestión de la VIP y hay un Acta de inicio de suscripción de contrato para la construcción de galpones sin la firma del contratista	12-07-22
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	203	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	25-11-19	Alerta por incumplimiento en la entrega de material según lo estipulado en el proyecto. 20194200050873	20194200050873
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	203	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	25-11-19	Alerta relacionada con el incumplimiento al plan de inversión 20194200050873	20194200050873
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	203	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	25-11-19	Alerta por denuncia ante Entes de control. 20194200050873	20194200050873
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	203	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	22-05-20	Alerta relacionada con el incumplimiento en la entrega de los activos productivos. Memorando 20204200014293	20204200014293
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	203	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	203	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	241	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	241	Alerta Gestión de la	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general	13-07-20

			información del proyecto.			por gestión de la información del proyecto.	
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	346	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	352	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08-07-20	Alerta relacionada con la falta de información respecto al trámite de reemplazo de beneficiarios	08-07-20
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	352	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	352	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	502	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	547	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	547	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	686	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	09-09-19	Alerta relacionada con el bajo avance en el proceso de ejecución del PIDAR. Memorando 20194200035713	20194200035713
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	686	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	14-09-20	Alerta relacionada con el retraso y las dificultades para el inicio de la ejecución del PIDAR	14-09-20
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	686	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	686	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	795	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	16-12-20	Alerta relacionada con las demoras en la ejecución del proyecto y reiteración de los retrasos	16-12-20
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	834	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	29-12-20	Alerta relacionada con retrasos en el tiempo de ejecución	29-12-2020
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1440	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-12-19	Alerta relacionada con incumplimiento de meta productiva del PIDAR en el primer año. Memorando 20194200056603	20194200056603
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1440	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-12-19	Alerta relacionada con el incumplimiento de la asistencia técnica según cronograma del PIDAR. Memorando 20194200056603	20194200056603
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1440	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-12-19	Alerta relacionada con las dificultades en la implementación del PIDAR y la ausencia de producción. Memorando 20194200056603	20194200056603
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1440	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203

Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1441	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-12-19	Alerta relacionada con incumplimiento de meta productiva del PIDAR en el primer año. Memorando 20194200056613	20194200056613
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1441	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-12-19	Alerta relacionada con el incumplimiento de la asistencia técnica según cronograma del PIDAR. Memorando 20194200056613	20194200056613
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1441	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-12-19	Alerta relacionada con las dificultades en la implementación del PIDAR y la ausencia de producción. Memorando 20194200056613	20194200056613
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1441	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1447	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	02-12-19	Alerta relacionada con la entrega de activos productivos del PIDAR. Memorando 20194200052273	20194200052273
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1447	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	02-12-19	Alerta relacionada con el retraso en el cumplimiento de la asistencia técnica del PIDAR. Memorando 20194200052273	20194200052273
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1447	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	02-12-19	Alerta relacionada con la insuficiente capacitación e inconformismo frente a la falta de claridad con el manejo de recurso para las cartillas incluidas en el presupuesto del PIDAR. Memorando 20194200052273	20194200052273
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	1447	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	996	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	25-06-21	Cronograma de gestión del proyecto consignado en el módulo de gestión de la VIP	25-06-21
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	372	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	01-09-21	Alerta relacionada por gestión del tiempo, por esperas al acuerdo 011 de 2021.	01-09-21
Cerrada	3 - Córdoba y Sucre	502	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	15-10-21	Alerta relacionada con retrasos de tres y de 2 meses respectivamente en las actividades del PIDAR.	15-10-21
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	9	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	29-03-21	Alerta relacionada con la falta de información del proyecto en el módulo de gestión	29-03-21
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	344	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	463	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	19-10-20	Alerta relacionada con el bajo avance en el proceso de ejecución del PIDAR.	19-10-20
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	464	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	498	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	580	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24-12-20	Alerta relacionada con la ausencia de información en el módulo de gestión	24-12-20
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	1306	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con	20204200011203

						asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	1306	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	1453	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	464	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	23-02-22	Alerta relacionada con un retraso de 16 meses lo que supera el 10% establecido por procedimiento.	23-02-22
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	464	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23-02-22	Reiteración de la alerta debido a que no se observa en el módulo de gestión de proyectos la totalidad de los soportes de la información.	23-02-22
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	462	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	07-04-22	Presenta un retraso de 28 meses, tomando en cuenta la fecha de emisión del presente informe el 18 de marzo de 2022.	07-04-22
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	461	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08-04-22	No se observó el certificado de contrapartida, el memorando de acuerdo entre la FAO y ASOPAC y los comités técnicos de gestión local del año 2021 solo se evidencia el comité del mes de agosto.	08-04-22
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	461	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	11-04-22	Alerta relacionada con un retraso de 27 meses respecto al tiempo establecido en el cronograma de actividades.	11-04-22
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	827	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Otro	09-05-22	Alerta relacionada con la no evidencia en el módulo de gestión la documentación completa que soporte el proceso de ejecución	09-05-22
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	9	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-06-22	Alerta relacionada con un retraso de 15 meses a la fecha de emisión del presente informe con un retraso general porcentual del 125% con respecto a la línea del tiempo de ejecución	08-06-22
Cerrada	4 - Norte de Santander y Santander	9	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	25-07-22	Reiteración de alerta por Gestión del Tiempo.	25-07-22
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	118	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	118	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	156	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	156	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	204	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14-07-20	Alerta relacionada con la falta de información y documentación relacionada que soporte y avale el cumplimiento de las contrapartidas del proyecto	14-07-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	204	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	14-07-20	Alerta relacionada con la sustitución de beneficiarios e inconformismo con las entregas	14-07-20

Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	204	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	204	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	208	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	212	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	18-08-20	Alerta documentada e informada por la UTT la cual fue tramitada por la DSYC.	18-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	212	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	246	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	271	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	27-08-20	Alerta relacionada con la falta de información acerca de la entrega de activos productivos y la falta de claridad frente a la permanencia de los beneficiarios incluidos al inicio del PIDAR.	27-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	271	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	Monitoreo	27-08-20	Alerta relacionada con el manejo de los recursos de cofinanciación del PIDAR, incumplimiento del proveedor con los análisis.	27-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	271	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	27-08-20	Alerta relacionada con el inconformismo manifestado por los beneficiarios frente al proceso de ejecución del PIDAR.	27-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	271	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	27-08-20	Alerta relacionada con presuntos manejos indebidos de los recursos del proyecto. Denuncia penal.	27-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	271	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	27-08-20	Reiteración de alerta tramitada mediante memorando No. 20204200011203 del 8 de abril de 2020.	27-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	271	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	299	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	348	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	366	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	544	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08-04-20	Alerta relacionada con el incumplimiento de actividades por parte de beneficiario. Memorando 20204200011243	20204200011243
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	544	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	20-05-20	Alcance al memorando 20204200011243	20204200013993
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	544	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con	20204200011203

						asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	544	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	545	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	01-09-20	Alerta relacionada con las alertas tramitadas por la Dirección de Seguimiento y Control el pasado 6 de noviembre de 2018 mediante memorando No. 20184200040193 las cuales fueron reiteradas el pasado 26 de febrero de 2020 a través de memorando No. 20204200007053; en los memorandos se describen situaciones asociadas a las condiciones técnicas y condiciones agroecológicas que limitan la implementación del PIDAR	01-09-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	545	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06-08-20	Alerta relacionada con la falta de información respecto a trámite de reemplazo o sustitución de beneficiarios.	06-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	545	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06-08-20	Alerta relacionada con la definición de especie a plantar que no es adecuada para las condiciones agroecológica	06-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	545	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06-08-20	Alerta relacionada con temas de cambio y reestructuración del proyecto	06-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	545	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	546	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	546	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	590	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	18-08-20	Alerta documentada e informada por la UTT la cual fue tramitada por la DSyC.	18-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	590	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	20-10-2020	Alerta relacionada con la falta de información del proceso de ejecución, luego de consultar el módulo de gestión.	
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	590	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	605	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	633	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	27-07-20	Alerta relacionada con la información reportada respecto a la ejecución del PIDAR.	27-07-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	633	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	633	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20

Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	790	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08-09-20	Alerta relacionada con la venta de los activos productivos del PIDAR por parte de beneficiaria.	08-09-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	790	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	790	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	28-12-2020	Alerta relacionada con la falta de información del proyecto en el módulo de gestión	28-12-2020
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	790	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	28-12-2020	Alerta relacionada con el cambio de beneficiarios y su proceso de formalización	28-12-2020
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1219	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1251	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1261	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1268	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1299	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	12-06-20	Alerta relacionada con el no funcionamiento de activos productivos en el proyecto. Memorando 20204200016383	20204200016383
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1299	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	12-06-20	Alerta relacionada con la falta de información que soporte la ejecución del PIDAR. Memorando 20204200016383	20204200016383
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1299	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1300	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14-07-20	Alerta relacionada con el trámite de sustitución de beneficiario.	14-07-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1300	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14-07-20	Alerta relacionada con la falta de información que soporte recibo a satisfacción de los beneficiarios del PIDAR.	14-07-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1300	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1305	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1351	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1452	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	13-08-19	Alerta relacionada con la venta de los activos productivos (guadaña) por parte de los beneficiarios. Memorando 20194200031223	20194200031223
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1452	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203

Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	1452	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	10	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	12-08-21	Alerta por gestión de otros factores relacionada con: La revisión de la obtención de los permisos ambientales por parte del CTL en el cumplimiento del Acta de compromiso y corresponsabilidad del PIDAR.	12-08-21
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	10	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	23-08-21	Alerta por Gestión de otros factores relacionada con la verificación de una situación de riesgo, referida a cambio de beneficiario por alquiler de su propiedad y otro caso por venta de su hato ganadero	23-08-21
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	343	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	30-08-21	Alerta relacionada con la sustitución de un beneficiario del PIDAR.	30-08-21
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	299	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	07-06-22	Se evidenció que el PIDAR ha tenido demora en la ejecución, desde la fecha de socialización del PIDAR	07-06-22
Cerrada	5 - Antioquia y Chocó	10	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06-07-22	Alerta relacionada con 6 contactos de beneficiarios manifiestan no hacer parte de la asociación en la actualidad por que no se sienten beneficiados, no reciben información ni capacitaciones.	06-07-22
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	108	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	10-09-19	Alerta relacionada con el incumplimiento en el cronograma de actividades para la ejecución e implementación del PIDAR. Memorando 20194200035923	20194200035923
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	108	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	06-08-20	Alerta relacionada con aspectos técnicos del material vegetal del PIDAR.	06-08-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	108	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	108	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	132	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	23-07-20	Alerta relacionada con el inconformismo frente a la calidad de activos productivos del PIDAR.	23-07-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	132	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23-07-20	Alerta relacionada con la información reportada respecto a la ejecución del PIDAR.	23-07-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	132	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	132	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	23-11-20	Alerta relacionada con el inconformismo con la semilla por la mala calidad con las plántulas de aguacate entregada a los beneficiarios	23-11-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	141	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	24-07-20	Alerta relacionada con los activos productivos entregados.	24-07-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	141	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24-07-20	Alerta relacionada con la información de consulta respecto a la ejecución del PIDAR.	24-07-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	141	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con	20204200011203

						asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	206	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24-07-20	Alerta relacionada con la información reportada respecto a la ejecución del PIDAR.	24-07-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	206	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	211	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	22-08-19	Alerta relacionada con la falta de claridad en la custodia de los bienes por recibir. 20194200032293	20194200032293
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	211	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	03-08-20	Alerta relacionada con la falta de información de proceso de ejecución en el módulo de gestión.	03-08-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	211	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	211	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	211	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29-12-2020	Alerta relacionada con la falta de información del proyecto en el módulo de gestión	29-12-2020
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	603	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	603	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	603	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29-12-2020	Alerta relacionada con la falta de información del proyecto en el módulo de gestión	29-12-2020
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	607	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	614	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	12-11-19	Alerta relacionada con el incumplimiento en los tiempos para ejecución del PIDAR. Memorando 20194200047913	20194200047913
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	614	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	12-11-19	Alerta relacionada con el tiempo y proceso de ejecución del PIDAR. Memorando 20194200047913	20194200047913
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	614	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	10-09-20	Alerta relacionada con retrasos en tiempos de ejecución del PIDAR.	10-09-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	614	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	10-09-20	Alerta relacionada con la falta de información del proceso de ejecución en el módulo de gestión.	10-09-20
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	614	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	211	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	03-08-20	Alerta relacionada con la duración del proyecto es de 12 meses. Han transcurrido 17 meses incumpliendo así el tiempo señalado para su ejecución y culminación.	03-08-20

Cerrada	202	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	456	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	19-08-20	Alerta relacionada con la falta de información respecto a trámite de reemplazo o sustitución de beneficiarios..	19-08-20
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	456	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	527	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	604	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	606	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	624	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	631	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Alerta relacionada con la falta de información en el módulo de gestión con relación a la ejecución. (sustitución de beneficiarios)	04-08-20
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	631	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Alerta relacionada con la falta de información en el módulo de gestión con relación a la contrapartida, asistencia técnica	04-08-20
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	631	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	634	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	634	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	651	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	687	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	831	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	1304	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Incumplimiento del contrato suscrito entre la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA) y la empresa Servillano Agropecuario S.A.S., cuyo representante legal es Evelio Pérez Duarte.	20204200011293

Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	1304	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	No realización de actividades del proyecto "Apoyo y fortalecimiento de nuevas siembras de la Cadena Productiva Cacao"	20204200011293
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	1304	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	218	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	31-03-22	Alerta relacionada con un retraso general de 07 meses en la ejecución del proyecto.	31-03-22
Cerrada	8- Ibagué Tolima	123	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	8- Ibagué Tolima	354	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	8- Ibagué Tolima	504	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	8- Ibagué Tolima	504	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Cerrada	8- Ibagué Tolima	529	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	8- Ibagué Tolima	529	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	8- Ibagué Tolima	1303	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta por retrasos en el proceso de ejecución del PIDAR. Memorando 20194200001473	20194200001473
Cerrada	8- Ibagué Tolima	1303	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	8- Ibagué Tolima	1340	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	8- Ibagué Tolima	1340	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	01-12-20	Alerta relacionada con el fallecimiento de una beneficiaria y la sustitución del mismo	01-12-20
Cerrada	8- Ibagué Tolima	1490	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	8- Ibagué Tolima	1578	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	8- Ibagué Tolima	361	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	30-06-21	Alerta relacionada con Gestión de la calidad del proyecto, por falta de socialización a algunos beneficiarios.	30-06-21
Cerrada	8- Ibagué Tolima	361	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	30-06-21	Alerta relacionada con Gestión de otros factores, sustitución de beneficiaria.	30-06-21
Cerrada	8- Ibagué Tolima	69	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	22-02-22	Se evidencia que se presenta retrasos en las actividades planteadas dentro del proyecto de conformidad con el cronograma de ejecución	22-02-22

Cerrada	8- Ibagué Tolima	69	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	22-02-22	Se evidencia que no se han llevado a cabo la compra de los insumos y del vehículo tipo camión que estaban previsto de acuerdo con los tiempos definidos en el Plan de Inversiones	22-02-22
Cerrada	8- Ibagué Tolima	291	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	18-03-22	Alerta relacionada con la falta los documentos que soporten la incorporación al proyecto de un Ingeniero Agrónomo, 2 Técnicos Agrícolas y un profesional con experiencia en temas socio empresariales.	18-03-22
Cerrada	8- Ibagué Tolima	361	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-03-22	Alerta relacionada con la falta documentos que ayudan para tener una visión más clara del estado de la ejecución del proyecto.	18-03-22
Cerrada	8- Ibagué Tolima	354	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	30-06-22	Alerta relacionada con la falta de información que pueda validar el cumplimiento o incumplimiento de estos indicadores	30-06-22
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	105	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	120	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	120	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1215	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	19-03-19	Alerta relacionada con el tiempo y estado de la ejecución del PIDAR. Memorando 20194200010593	20194200010593
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1215	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	09-08-19	Alerta relacionada con el cumplimiento de requisitos para ser beneficiarios del PIDAR (2 beneficiarios) Memorando 20194200030713	20194200030713
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1215	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	09-08-19	Alerta relacionada con información de la venta de un predio beneficiario del PIDAR. Memorando 20194200030713	20194200030713
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1215	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1438	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	19-03-19	Alerta por retrasos en el proceso de ejecución del PIDAR. Memorando 20194200010593	20194200010593
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1438	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1468	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	25-08-20	Alerta relacionada con la falta de información soporte del proceso de ejecución del PIDAR, situación evidenciada durante el monitoreo al PIDAR.	25-08-20
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1468	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1474	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	17-09-19	Alertas relacionada con el incumplimiento de buenas practicas, por entrega de activos a sustitutos sin	20194200037173

						aprobación y actas de recibo sin firma del ADR. 20194200037173	
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1474	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1522	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1522	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1542	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1542	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1546	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1546	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1556	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	16-07-20	Alerta relacionada con inconformismo de los beneficiarios respecto a los activos productivos recibidos.	16-07-20
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1556	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	16-07-20	Alerta relacionada con retrasos en la ejecución del PIDAR.	16-07-20
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1556	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	1586	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	622	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24-11-21	Alerta relacionada con las actas e informes no están reportadas en el módulo de gestión y no se puede verificar la información compartida en la visita.	24-11-21
Cerrada	9 - Cauca y Valle del Cauca	622	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	24-11-21	Alerta relacionada con un un retraso de 11 meses, 6 días, en la ejecución, equivalente al 93.3%.	24-11-21
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	106	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	110	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	119	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	119	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20

Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	119	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	16-12-20	Alerta relacionada con la sustitución de beneficiarios	16-12-20
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	119	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	16-12-20	Alerta relacionada con el tiempo del proyecto	16-12-20
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	140	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	140	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	199	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	23-01-19	Alerta relacionada con el incumplimiento con el área establecida en el marco lógico del proyecto. 20194200002383	20194200002383
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	199	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	23-01-19	Alerta relacionada con el favorecimiento dos veces a un mismo núcleo familiar. 20194200002383	20194200002383
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	199	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	23-01-19	Alerta relacionada con el incumplimiento del área de los predios establecida en el proyecto. 20194200002383	20194200002383
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	199	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	23-01-19	Alerta relacionada con la venta del predio con cultivos a la Alcaldía Local. 20194200002383	20194200002383
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	199	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	23-01-19	Alerta relacionada con el incumplimiento de la siembra del cultivo establecido en el proyecto 20194200002383	20194200002383
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	199	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	23-01-19	Alerta relacionada con el mal manejo de los estándares en la densidad de siembra. 20194200002383	20194200002383
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	199	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	200	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con la falta de validación y aprobación de licitación para la construcción de marraneras. 20194200001473	20194200001473
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	200	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con la suspensión de la contrapartida de la fundación Mindala por demora en los tiempos. 20194200001473	20194200001473
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	200	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con la demora en el proceso de evaluación de la IAL. 20194200001473	20194200001473
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	200	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con la demora en los procesos y acciones planteadas en el proyecto. 20194200001473	20194200001473
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	200	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	22-08-19	Alerta relacionada con el mal estado de salud de los animales. 20194200032283	20194200032283
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	200	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	22-08-19	Alerta relacionada con la falta de fortalecimiento en la comercialización a beneficiarios en el proceso de ventas. 20194200032283	20194200032283
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	200	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203

Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	201	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con el incumplimiento de requisitos por parte de algunos beneficiarios. 20194200001473	20194200001473
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	201	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	242	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	403	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	403	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	28-12-20	Alerta relacionada con la calidad de los bovinos entregados	28-12-20
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	404	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	496	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	497	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	507	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	08-08-19	Alerta relacionada con la ejecución del proceso de asistencia técnica del PIDAR. Memorando 20194200030393	20194200030393
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	507	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	08-08-19	Alerta relacionada con las condiciones técnicas para el funcionamiento de los secaderos de café. Memorando 20194200030393	20194200030393
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	507	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	08-08-19	Reiteración alerta del memorando 20184200033073. Memorando 20194200030393	20194200030393
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	507	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	548	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	758	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	06-09-19	Alerta relacionada con el uso de maquinaria (tractores) sin pólizas de riesgo o seguros, esta maquinaria fue cofinanciada en el PIDAR. Memorando PIDAR20194200035543	20194200035543
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	758	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	1216	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	1234	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203

Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	1255	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	1256	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	1267	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	1491	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	1491	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	458	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	22-10-21	Según la fuente de consulta para los avances y estados de los diferentes PIDAR, se identifica que se establecieron 10 meses de tiempo para la ejecución del Proyecto. Consultada la información, se evidencia que se socializó el 31 de agosto de 2019 y se aprobaron codificaciones en el CTGL No. 3 del 5 de octubre de 2020 lo que significa que su cierre administrativo y financiero se debió llevar a cabo durante el mes de agosto 2021.	22-10-21
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	458	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	04-11-21	Durante la visita a los predios de los beneficiarios se evidencia que las diez estructuras instaladas cuentan con la malla que se contempló en las modificaciones realizadas al plan de inversión con las siguientes características: Malla tipo gallinero: Fabricada en lambré de acero galvanizado, calibre: 23 BWG (diámetro del alambre: 0.63 mm), abertura de la malla (hueco) de 1" x 1" y altura 1.80 m que cumpla la Norma NTC 3313 (Norma para alambres y productos derivados del acero). Sin embargo, se observa que esta malla es delgada al parecer no permite templarse se observa no rígida, los amarres a la estructura que dan al piso permiten que se levante y muestra un espacio de aproximadamente 15 a 30 cm.; entre ellos. En la parte superior de la estructura lo que se une al techo presenta un espacio grande sin malla en los 4 laterales. Lo anteriormente descrito puede permitir el ingreso de comadreja, zorro y otros animales que ponen en riesgo la integridad física de las aves. Cabe anotar que a la fecha de abierta esta alerta los galpones están instalados mas no entregados y recibidos a satisfacción.	04-11-21
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	255	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	28-02-22	Alerta relacionada con que el PIDAR tiene un 48% de ejecución, durante 13 meses y que las proyecciones en el Marco Lógico hacían referencia a una ejecución de 12 meses.	28-02-22

Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	326	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	15-03-22	Alerta relacionada con retrasos en el tiempo, debido a la no aprobación de la licencia para construcción de la planta de beneficio de pollos.	15-03-22
Cerrada	10 - Nariño y Putumayo	340	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	02-05-22	Alerta relacionada con un retraso de un (1) mes catorce (14) días, teniendo en cuenta que el porcentaje que falta por ejecutar del PIDAR es del 33% y que las actividades no se están ejecutando según lo establecido en el POI y que además se están sobrepasando el tiempo inicial y de ejecución proyectado en el cronograma	02-05-22
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	107	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	121	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	09-08-19	Alerta relacionada con la entrega de activos productivos que no corresponden a las especificaciones y términos de referencia. 20194200030723	20194200030723
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	121	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	09-08-19	Alerta relacionada con inconformidades con los procesos licitatorios 20194200030723	20194200030723
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	121	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	07-10-19	Alerta relacionada con la asistencia técnica, antes de la entrega de animales 20194200040703	20194200040703
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	121	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	07-10-19	Alerta relacionada con acciones de fortalecimiento de organización. 20194200040703	20194200040703
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	121	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	124	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	24-06-20	Alerta relacionada con el inconformismo de uno de los beneficiarios. 20204200017303	20204200017303
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	124	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	155	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	198	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	205	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	24-06-20	Alerta relacionada con el inconformismo de algunos beneficiarios, en atención a la falta de información en la socialización del proceso de entrega de los equipos y elementos para la transformación primaria y secundaria de café. 20204200017483	20204200017483
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	205	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	207	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	207	Alerta Gestión de la	Monitoreo	01-12-20	Alerta relacionada con la ausencia de información en el módulo de gestión	01-12-20

			información del proyecto.				
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	298	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	17-09-19	Alerta relacionada con evidencias de bajo avance en el proceso de construcción de los secaderos incluidos en el PIDAR. Memorando 20194200037393	20194200037393
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	298	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	343	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	26-09-19	Alerta relacionada con la falta de aprobación por beneficiarios de los secaderos por inconsistencias. 20194200039043	20194200039043
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	343	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	26-09-19	Alerta relacionada con el abandono de materiales de construcción de los secaderos a la intemperie. 20194200039043	20194200039043
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	343	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	343	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	345	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	347	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	17-09-19	Alerta relacionada con posible venta del predio. 20194200037233	20194200037233
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	347	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	17-09-19	Alerta relacionada porque beneficiarios no residen en el predio donde se ejecutan las actividades del proyecto. 20194200037233	20194200037233
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	347	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	347	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	347	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	01-12-20	Alerta relacionada porque el beneficiario Octavio Ríos manifiesta que no le han entregado nada y en el acta de entrega aparece firmando	01-12-20
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	503	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08-04-20	Alerta relacionada con la entrega de semovientes sin guías de movilización...	20204200011283
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	503	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08-04-20	Alerta relacionada con: Novilla 114-17/87 del beneficiario Francisco Doncel, con resultado positivo para brucelosis.	20204200011283
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	503	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Alerta relacionada con Irregularidades en el reporte de resultados N°20190729 de los animales entregados en San José del Fragua y anomalías al momento de la entrega de los semovientes.	20204200011283
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	503	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	503	Alerta Gestión de la	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general	13-07-20

			información del proyecto.			por gestión de la información del proyecto.	
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	506	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	506	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1220	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	08-11-19	Alerta relacionada con la ejecución de actividades de asistencia técnica. Memorando 20194200077172	20194200077172
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1220	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15-06-20	Alerta relacionada con el traslado de los activos productivos por cambio de predio realizado por beneficiarios. Memorando 20204200016453	20204200016453
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1220	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1263	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1264	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1290	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1322	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	17-12-19	Alerta relacionada con la ejecución de actividades de asistencia técnica. Memorando 20194200041993	20194200041993
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1322	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1406	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	17-12-19	Alerta relacionada con la ejecución de actividades de asistencia técnica. Memorando 20194200042003	20194200042003
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1406	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	17-12-19	Alerta relacionada con la infraestructura vial en la zona la cual afecta de forma negativa los objetivos del PIDAR. Memorando 20194200042003	20194200042003
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1406	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1439	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1598	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	22-05-20	Alerta relacionada con inconformismo de los beneficiarios respecto a los activos productivos recibidos. Memorando 20204200014303	20204200014303
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1598	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1598	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20

Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1601	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	16-09-20	Alerta relacionada con la falta de información del proceso de ejecución, luego de consultar el módulo de gestión.	16-09-20
Cerrada	11 - Huila y Caquetá	1601	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	122	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24-08-20	Alerta relacionada con la información obtenida en monitoreo con respecto a la manifestación de no recibo de activos productivos por parte de una beneficiaria del PIDAR.	24-08-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	122	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	122	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	134	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	134	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	136	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con la renuncia de algunos beneficiarios y falta de informar esta situación a la VIP. 20194200001533	20194200001533
Cerrada	12 - Meta y Vichada	136	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con la demora en la entrega del activo productivo (tractor). 20194200001533	20194200001533
Cerrada	12 - Meta y Vichada	136	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta relacionada con malas características del camión de acuerdo a la necesidad y terreno para la ejecución del proyecto. 20194200001533	20194200001533
Cerrada	12 - Meta y Vichada	136	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	270	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	16-01-19	Alerta por retrasos en el proceso de ejecución del PIDAR. Memorando 20194200001663	2.01942E+13
Cerrada	12 - Meta y Vichada	270	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	09-08-19	Alerta por retrasos en el proceso de ejecución del PIDAR, según evidencia el representante de los beneficiarios. Memorando 20194200030723	20194200030723
Cerrada	12 - Meta y Vichada	270	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	02-12-19	Alerta relacionada con las demoras e inconformismo frente a la entrega de los activos productivos. Memorando 20194200052393	20194200052393
Cerrada	12 - Meta y Vichada	270	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04-08-20	Alerta relacionada con el inconformismo de los beneficiarios con aspectos de la ejecución- activos productivos del PIDAR.	04-08-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	270	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	341	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-12-19	Alerta relacionada con los retrasos en la entrega de los activos productivos del PIDAR. Memorando 20194200056513	20194200056513

Cerrada	12 - Meta y Vichada	341	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-12-19	Alerta relacionada con la ejecución del proceso de asistencia técnica del PIDAR. Memorando 20194200056513	20194200056513
Cerrada	12 - Meta y Vichada	341	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	18-12-19	Alerta relacionada con los procesos de capacitación incluidos en el PIDAR. Memorando 20194200056513	20194200056513
Cerrada	12 - Meta y Vichada	341	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	342	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	06-08-20	Alerta relacionada con el inconformismo de algunos beneficiarios respecto a los activos productivos entregados.	06-08-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	342	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	342	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	05-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	05-07-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	350	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	460	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	17-12-20	Alerta relacionada con los retrasos de ejecución del PIDAR	17-12-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	565	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	29-8-2020	Alerta relacionada con las especificaciones técnicas de los bienes entregados	29-8-2020
Cerrada	12 - Meta y Vichada	565	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29-08-20	Alerta relacionada con la falta de información del proceso de ejecución, luego de consultar el módulo de gestión.	29-8-2020
Cerrada	12 - Meta y Vichada	565	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	565	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	06-08-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	566	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	566	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	01-12-20	Alerta relacionada con el inconformismo por parte de algunos beneficiarios frente a los activos entregados	01-12-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	567	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	04-08-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	578	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18-11-19	Alerta relacionada con sustitución de beneficiaria sin debido proceso. Memorando 20194200048873	20194200048873
Cerrada	12 - Meta y Vichada	807	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	03-09-20	Alerta relacionada con el rol de concejal municipal de uno de los beneficiarios, se informa a la VIP para los fines pertinentes.	03-09-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	836	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203

Cerrada	12 - Meta y Vichada	836	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	858	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	18-11-20	Alerta relacionada con irregularidades en el proyecto	18-11-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	858	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	18-11-20	Alerta relacionada con la sustitución del beneficiario José Ángel Vargas	18-11-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	858	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	18-11-20	Alerta relacionada con la ausencia de información (actas de entregas, actas de CTL, etc)	18-11-20
Cerrada	12 - Meta y Vichada	1218	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	1250	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08-04-20	Alerta relacionada con la sustitución de beneficiarios sin debido proceso.	20204200011253
Cerrada	12 - Meta y Vichada	1250	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08-04-20	Alerta relacionada con la sustitución de beneficiarios sin debido proceso.	20204200011253
Cerrada	12 - Meta y Vichada	1250	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Alerta relacionada con la pérdida de material vegetal por muerte luego de la siembra.	20204200011253
Cerrada	12 - Meta y Vichada	1250	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	1301	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	1401	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	12 - Meta y Vichada	460	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	07-03-22	Alerta relacionada con el manejo de la información del proyecto que no permite evidenciar el avance de la ejecución de las actividades y la ejecución de los recursos	07-03-22
Cerrada	12 - Meta y Vichada	567	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08-06-22	Es una reiteración de alerta por Gestión de la información	08-06-22
Cerrada	12 - Meta y Vichada	374	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	25-04-22	Los informes de gestión, no se reportan oportunamente, o en las condiciones de calidad y cantidad solicitadas, y no se pueda verificar la información reportada	25-04-22
Cerrada	12 - Meta y Vichada	373	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	25-04-22	No se puede adelantar la verificación de la ejecución de las actividades y la correcta inversión de los recursos, por falta de documentación.	25-04-22
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	244	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	12-06-20	Alerta relacionada con la falta de documentos que soporten el proceso de sustitución formal de beneficiario. Memorando 20204200016373	20204200016373
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés,	244	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	12-06-20	Alerta relacionada con la falta de documentos que soporten el proceso de sustitución formal de beneficiario. Memorando 20204200016373	20204200016373

Cerrada	Amazonas y Guainía 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	244	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	508	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	05-10-20	Alerta relacionada con inconsistencia en la entrega de activos productivos a beneficiario.	05-10-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	508	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	05-10-20	Alerta relacionada con entregas de activos a una persona nueva en el proyecto que está en estudio de validación como beneficiario por parte de UTT	05-10-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	508	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	05-10-20	Alerta relacionada con los tiempos de ejecución del proyecto	05-10-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	508	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	05-10-20	Alerta relacionada con la falta de información del proceso de ejecución en el módulo de gestión.	05-10-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	508	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	508	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06-08-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	06-08-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	528	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	12-12-19	Alerta relacionada con retrasos en el proceso de ejecución y entrega de activos productivos del PIDAR. Memorando 20194200055273	20194200055273
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	528	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	528	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	602	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca,	602	Alerta Gestión de la	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general	13-07-20


	Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía		información del proyecto.			por gestión de la información del proyecto.	
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	632	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	27-07-20	Alerta relacionada con el cambio del cultivar de aguacate a limón el cual afecta el objetivo del PIDAR.	27-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	632	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	27-07-20	Alerta relacionada con aspecto para la medición de indicadores del PIDAR.	27-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	632	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	27-07-20	Alerta relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR.	27-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	632	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	27-07-20	Alerta relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR.	27-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	632	Alerta Gestión de costos del proyecto.	Monitoreo	27-07-20	Alerta relacionada con incremento en el costo inicial presupuestado en el PIDAR.	27-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	632	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	632	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	649	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	649	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	792	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29-12- 2020	Alerta relacionada con la falta de información del proyecto en el módulo de gestión	29-12-2020
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	1221	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimie nto	14-09-20	Alerta relacionada con la falta de información del proceso de ejecución, luego de consultar el módulo de gestión.	14-09-20

Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	1221	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	1221	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	1254	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	1302	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	1540	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	25-09-20	Alerta relacionada con la falta de información y documentación relacionada que soporte y avale el cumplimiento de las contrapartidas del proyecto.	25-09-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	1540	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08-04-20	Comunicación a VIP mediante memorando 20204200011203 con asunto: Alerta proyectos con retrasos en tiempos de ejecución.	20204200011203
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	1540	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13-07-20	Comunicación a UTT mediante correo electrónico con asunto: Alerta general por gestión de la información del proyecto.	13-07-20
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	792	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29-12-2020	No se cuenta con algún soporte que determine la renuncia de la beneficiaria y de la misma manera se esclarezca los motivos del retiro del proyecto.	29-12-2020
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	315	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	02-05-22	Póliza N° 42-45-101046889 expedida por seguros del estado S.C, vencida.	02-05-22
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	337	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	31-05-22	Se evidencia una anomalía en las fechas de adjudicación mediante Resolución y el momento de inicio de las actividades del PIDAR, ya que no es viable que primero se genere acta de inicio y posteriormente se adjudique la Resolución para el PIDAR.	31-05-22
Cerrada	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	315	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	28-04-22	Vencimiento de la póliza de seguros	28-04-22

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la siguiente gráfica, se tramitaron 15 alertas durante el mes de julio, 17 alertas durante el mes de agosto, y 3 alertas durante el mes de septiembre por parte de la Dirección de Seguimiento y Control.


Gráfica N° 13: No. Total alertas identificadas durante el trimestre

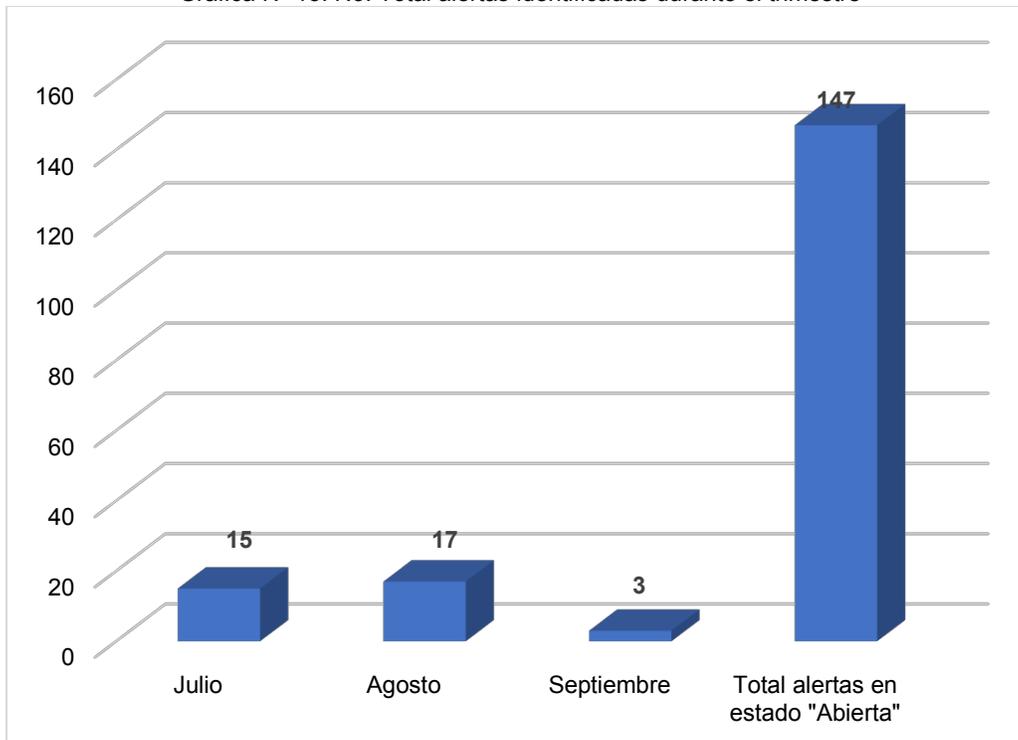

Fuente: elaboración propia

Las alertas que fueron abiertas durante el tercer trimestre de 2022 se encuentran discriminadas así: 4 alertas por gestión de la calidad, 2 alertas por gestión de los recursos, 15 alertas por gestión del tiempo, 1 alerta por gestión de los costos, 8 alertas por gestión de la información, 3 alertas por gestión de las adquisiciones y 2 alertas por gestión de otros factores.


Gráfica N° 14: Alertas por tipología

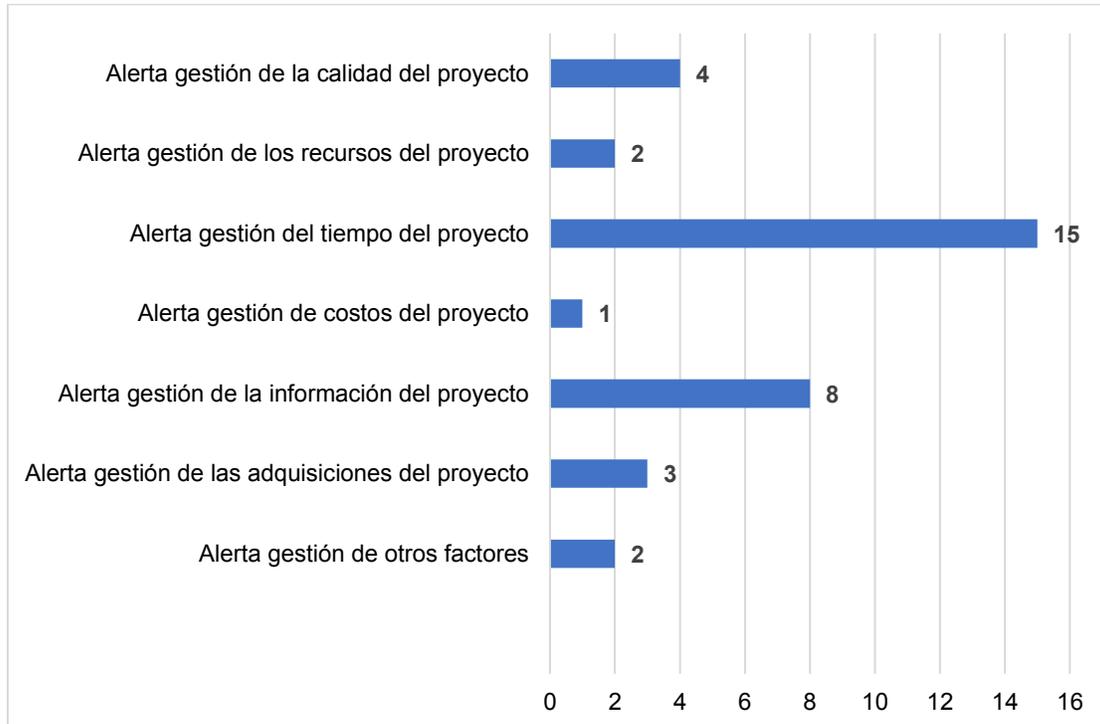

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en el siguiente gráfico, de las 35 alertas que se identificaron y tramitaron durante el tercer trimestre de 2022, la Unidad Técnica Territorial - UTT No. 2 generó el trámite de 10 alertas, mientras que para las UTT No. 1, UTT No. 3, UTT No. 7 y UTT No.11, no se tramitaron alertas.


Gráfica N° 15: Alertas por UTT

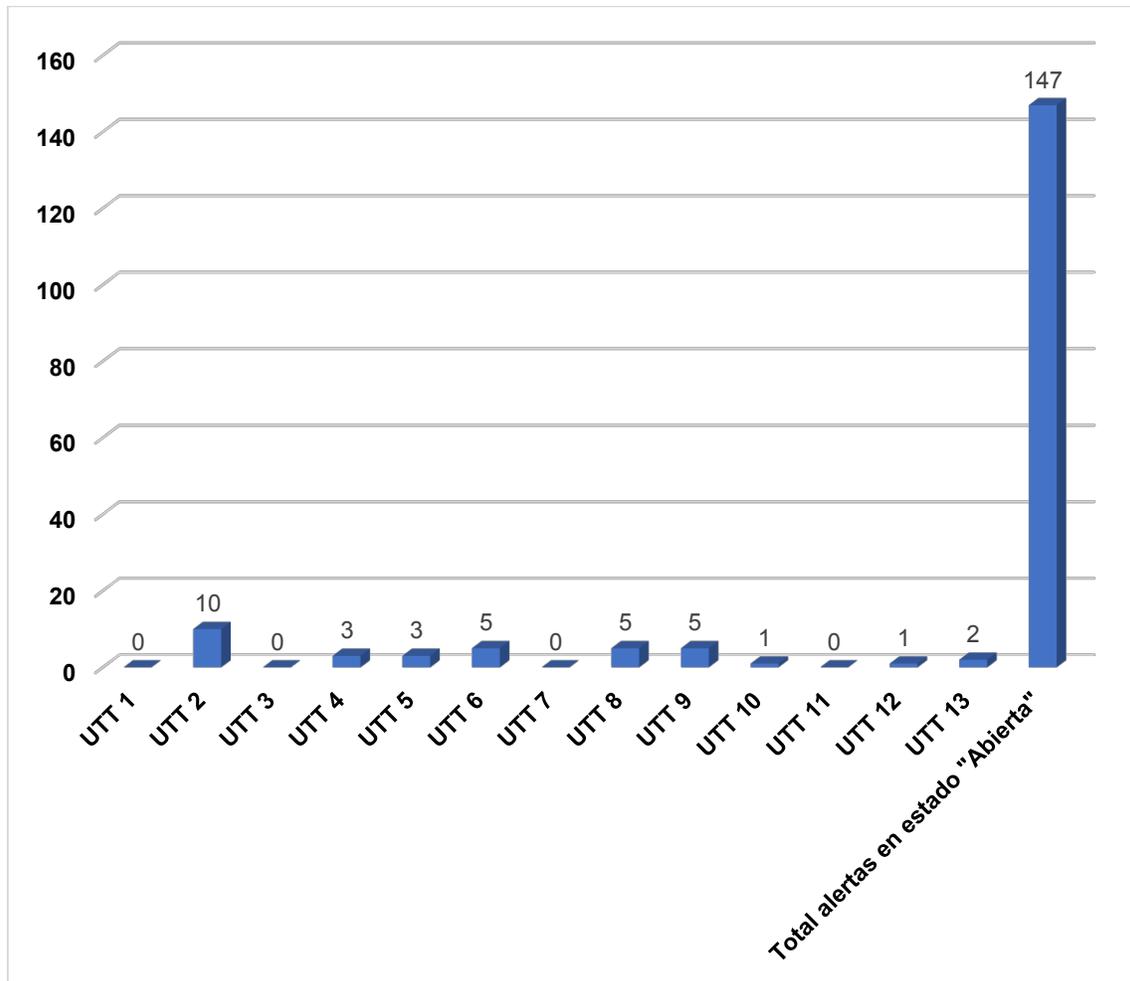

Fuente: elaboración propia

Así mismo, como se puede observar en el gráfico siguiente, que del total de los 416 PIDAR en seguimiento, 68 tienen alertas en estado "abierto" y 348 proyectos están sin alertas, lo que nos permite evidenciar que el 19.5 % de los proyectos pueden llegar a ser afectados en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas en su fase de ejecución, sin embargo, toda vez que estas situaciones fueron reportadas por la Dirección de Seguimiento y Control, se pueden tomar las medidas pertinentes para mitigar sus consecuencias, de acuerdo con lo que requiera cada caso.


Gráfica N° 16: Proyectos con alertas abiertas vs Proyectos sin alertas abiertas

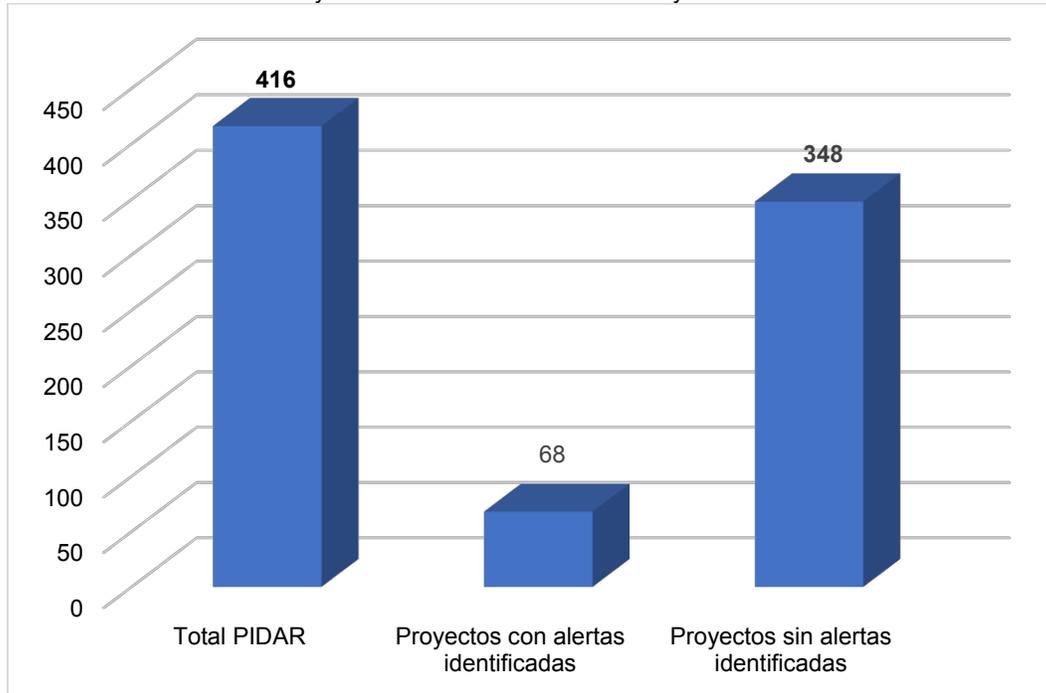

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, es importante precisar que la identificación de las alertas emitidas en los PIDAR durante este trimestre ha sido resultado de las actividades de seguimiento y monitoreo de la Dirección de la siguiente manera:

Gráfica No. 17: Alertas Identificadas en monitoreo y seguimiento durante el tercer trimestre de 2022

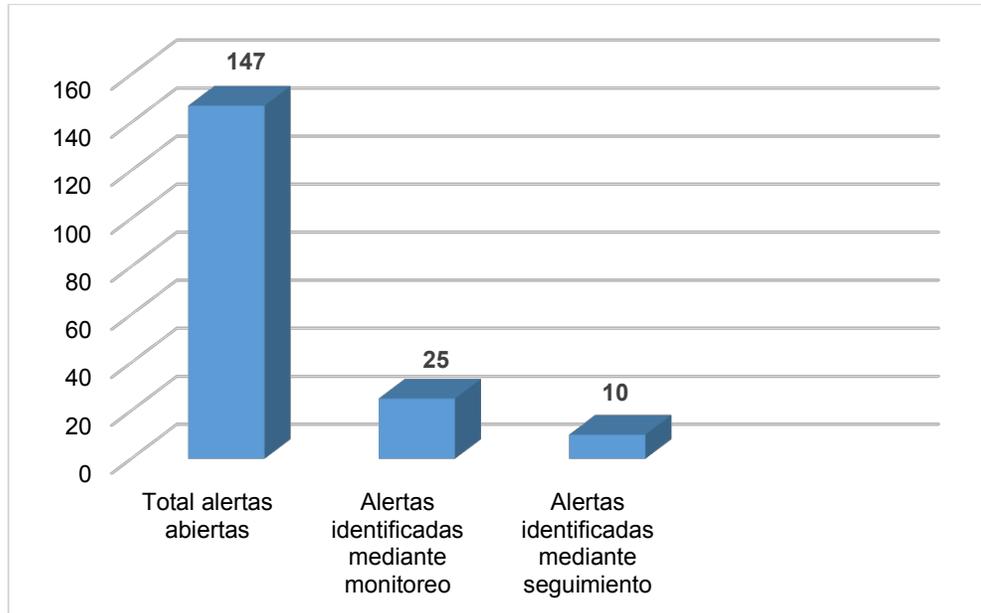


Fuente: elaboración propia

Como se puede ver en el gráfico anterior, de las 35 alertas que se abrieron durante el trimestre objeto de este informe, el 71.5% fueron identificadas a partir de monitoreo in House, mientras que el 28.5% fueron identificadas a partir del seguimiento a los PIDAR. Por tanto, se puede afirmar que fortalecer los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control, resulta adecuado, permite realizar la aplicación de cualquiera de los mecanismos o ambos de manera complementaria, garantizando la eficacia en el proceso.

Es importante mencionar que, el 10 de julio de 2020, fue aprobado el Formato de Plan de Mejoramiento, por lo tanto, las alertas que fueron identificadas y tramitadas a partir de esta fecha deben contar con este instrumento diligenciado, donde identifican las acciones correctivas que adelantará la UTT para subsanarla o mitigar sus efectos. A continuación, se presenta el balance de la entrega de los planes de mejoramiento, a los cuales se les ha realizado seguimiento, con corte al 30 de septiembre del 2022:

Gráfica N° 18: Alertas con seguimiento a plan de mejoramiento

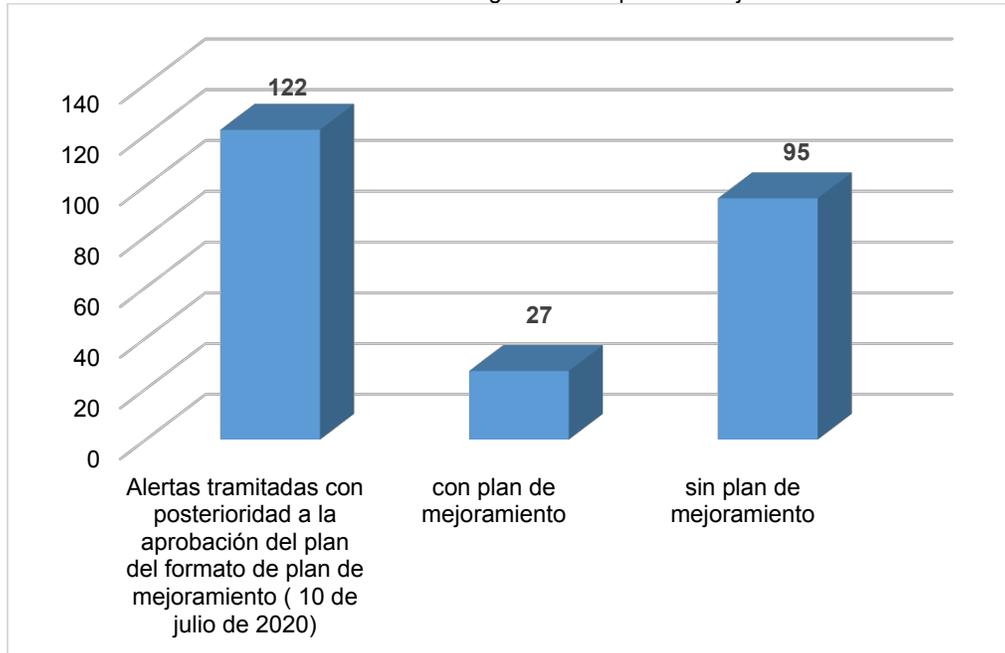

Fuente: elaboración propia

### Observaciones a Alertas

En total, para el corte del 30 de septiembre del 2022, se relaciona un acumulado de 651 alertas identificadas, de las cuales, 147 se encuentran en estado “Abierta”. De estas 147 alertas que permanecen abiertas de manera acumulada al corte del tercer trimestre de 2022, el 46% corresponde a 68 alertas, pertenece al tipo Gestión del tiempo del proyecto, y el 26% hacen referencia a 38 alertas por Gestión de la información del proyecto. De acuerdo con estas cifras, se puede deducir que las situaciones de riesgo más frecuentes dentro de los PIDAR en seguimiento se orientan a los tiempos de ejecución de los proyectos y a la falta de información sobre los PIDAR que se reporte de manera oportuna y/o en condiciones de calidad y posibilidad de verificación.

Tabla N° 13: Relación de alertas por PIDAR

No. Res	No. de alertas abiertas	Observaciones
104	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.

117	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
175	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
192	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
193	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
209	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
210	5	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
228	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
229	7	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
232	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
233	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
243	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
243		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
245	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
246	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los

		lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
246		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
257	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
260	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
291	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
297	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
298	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
299	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
313	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
315	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
316	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
325	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
342	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
343	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.

348	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
351	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
358	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
361	5	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
373	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
374	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
375	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
401	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
402	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
459	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
463	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
501	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
505	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
567	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los

		lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
569	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
575	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
576	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
577	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
578	6	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
614	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
635	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
636	6	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
639	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
793	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
799	5	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
805	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
806	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.

807	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
824	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
827	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
830	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
831	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
832	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
878	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
879	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
880	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
997	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1474	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1556	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1586	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.

Fuente: Elaboración propia

### 3.2 Planes de mejoramiento

Como se puede observar, del total de las alertas acumuladas que continúan abiertas al corte del tercer trimestre de 2022, ciento veintidós fueron tramitadas a partir del 10 de julio de 2020; de estas, el 22% (27 alertas) cuentan con su respectivo plan de mejoramiento, y el 78% restante, equivalente a 95 alertas, no cuentan con un plan de mejoramiento. Es importante resaltar que, para las alertas tramitadas en fechas anteriores al 10 de julio de 2020, se deben entregar soportes de las acciones correctivas que tiendan a subsanar las alertas. Con respecto a este tema, la Dirección de Seguimiento y Control permanentemente remite correos reiterando la solicitud de estos planes de mejoramiento

Tabla N° 14: Avance en el cumplimiento de acciones correctivas para las alertas con plan de mejoramiento

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo al plan de mejoramiento	No. Total de acciones correctivas propuestas	Acciones correctivas cumplidas	Acciones correctivas en proceso	Acciones correctivas no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Muerte de alto % de material vegetal por los largos periodos de verano en la zona.	3	2	1	0	66%	11/05/2022, la directora de la UTT allega plan de mejoramiento el cual se envía al Gestor enlace de la UTT para que emita concepto acerca de la viabilidad del cierre o no de la alerta.
117	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	05/05/2021: se remite correo allegado por la UTT3 con el plan de mejoramiento adjunto el día 08 de abril de 2021 al profesional Adolfo Bedoya para que realice monitoreo al plan de mejoramiento.	1	0	1	0	0%	08/09/2022 La UTT informa que el proyecto pasa a la oficina jurídica para la aplicación de la condición resolutoria.
117	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de otros factores.	En reunión realizada el 29/08/2022 con la Unidad técnica Territorial No 3, se realizó el estudio para el cierre de esta alerta y se determinó que este PIDAR se encuentra en proceso de liquidación y cierre y se determinó que cuando culminara este proceso, se daría la gestión para proceder al cierre total de todas las alertas que dicho proyecto tenga abiertas.	1	0	0	1	0%	15/12/20 Se remite solicitud de evidencias para el seguimiento al plan de mejoramiento 11/12/20 Se remite solicitud de planes de mejoramiento a la UTT #3 de acuerdo a lo estipulado en el instructivo IN-SCP-001
117	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	En reunión realizada el 29/08/2022 con la Unidad técnica Territorial No 3, se realizó el estudio para el cierre de esta alerta y se determinó que este PIDAR se encuentra en proceso de liquidación y cierre y se determinó que cuando culminara este proceso, se daría la gestión para proceder al cierre total de todas las alertas que dicho proyecto tenga abiertas.	1	0	0	1	0%	07/10/2020 Y 08/04/2021 La UTT Allega plan de mejoramiento. 15/12/20 Se remite solicitud de evidencias para el seguimiento al plan de mejoramiento 11/12/20 Se remite solicitud de planes de mejoramiento a la UTT #3 de acuerdo a lo estipulado en el instructivo IN-SCP-001
210	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	27/10/20 Se allega el plan de mejoramiento por parte de la UTT No.	1	0	0	1	0%	18/11/2021. La facilitadora de temas de alertas remite por correo los soportes allegados de la UTT 6, para que los analice y emita concepto sobre la viabilidad


			6 para su respectiva revisión.						de cierre o no de las alertas de esta UTT.
210	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	7/12/20 El profesional Edwin Becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento 27/10/20 Se allega el plan de mejoramiento por parte de la UTT No. 6 para su respectiva revisión.	5	1	0	4	20%	27/10/20 se remite plan de mejoramiento por parte de la UTT, se remite al profesional Edwin Becerra para su validación 19/10/20 se remite correo de solicitud de plan de mejoramiento.
351	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	21/09/20 Se remite correo de solicitud de plan de mejoramiento de alertas a la UTT.	3	3	2	0	50%	21/09/20 Se remite correo de solicitud de plan de mejoramiento de alertas a la UTT.
351	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.		1	0	1	0	0%	30/12/20 Se solicita plan de mejoramiento, solicitud hecha por el profesional Gabriel Salinas e igualmente se solicitó entrega de evidencias sobre la alerta mediante memorando N° 20194200039043 del 6 de septiembre de 2019.
463	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.		2	2	0	0	100%	25/12/20 allegan respuesta al plan de mejoramiento con sus soportes o evidencias. 21/06/20 se envía al profesional encargado del monitoreo y seguimiento para que emita concepto.
636	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión de otros factores.		2	0	0	0	0%	10/11/20 La UTT envía plan de mejoramiento, se reenvía al profesional de seguimiento Sandra Ramírez para revisión y seguimiento. 7/09/20 La UTT envía respuesta a las alertas, se reenvió a la profesional de seguimiento (Sandra Ramírez) para el correspondiente revisión y seguimiento. Representante legal, Sr. Alexander García, manifiesta que dentro del proyecto existen 20 predios los cuales tienen restricciones para establecer sistemas productivos ganaderos
233	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.		1	0	0	0	0%	Allegan de la UTT Plan de Mejoramiento con fecha 05/07/2022, se envía al Gestor Andrés Gutiérrez para que emita concepto favorable o no a cerca del cierre.
233	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.		1	0	0	0	0%	Allegan de la UTT Plan de Mejoramiento con fecha 05/07/2022, se envía al Gestor Andrés Gutiérrez para que emita concepto favorable o no a cerca del cierre.
172	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Actualmente Están pendiente en cumplir acciones encaminadas a subsanar la alerta.	2	0	0	0	0%	10/05/2022, se envía respuesta allegada por la UTT 2 plan de mejoramiento, se envía al gestor encargado de enlace a la territorial. 28/06/2022 Se remite plan de mejoramiento allegado por la UTT2 al Gestor Andrés Felipe Gutiérrez Arango. El 30 de junio Allegan plan de mejoramiento para: 1. Modificar el cronograma de entregas y 2. para realizar nueva convocatoria para completar la adjudicación del 100% de las invitaciones.
172	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	Actualmente están pendiente en cumplir acciones encaminadas a subsanar	2	0	0	0	0%	10/05/2022, la UTT 2 allega plan de mejoramiento y se le envía al Gestor enlace de la UTT 2 para que emita concepto de la viabilidad de cierre o no es procedente el cierre. 28/06/2022 Se remite plan de mejoramiento allegado por la UTT2 al Gestor Andrés Felipe Gutiérrez Arango. El 30 de junio Allegan plan de mejoramiento para: 1. Modificar el cronograma de contratación de la asistencia técnica en acuerdo con la asociación de beneficiarios del proyecto. 2. Realizar nueva convocatoria para completar la

									adjudicación del 100% de las invitaciones.
315	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.		1	0	0	0	0%	21/06/2022, allegan de la UTT plan de mejoramiento y se envía la Gestor Andrés Felipe Gutiérrez para que emita concepto de si procede o no la subsanación.
232	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Se plantearon 3 actividades para cumplir en junio, sin evidencia de su cumplimiento, referente al cierre del proyecto.	7	6	1	0	87%	05/05/2022, allegan de la UTT 10, plan de mejoramiento, el cual esta misma fecha se le envía al Gestor enlace de la UTT, para su conocimiento y fines a los que haya lugar.
361	8- Ibagué Tolima	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.		2	1	1	0	50%	21/09/2022 Se recibió planes de mejoramiento, está en proceso de revisión y validación por parte del profesional.
361	8- Ibagué Tolima	Alerta Gestión de costos del proyecto.		2	2	0	0	100%	21/09/2022 Se recibió planes de mejoramiento, está en proceso de revisión y validación por parte del profesional.
361	8- Ibagué Tolima	Alerta Gestión de la información del proyecto.		1	0	0	1	0%	21/09/2022 Se recibió planes de mejoramiento, está en proceso de revisión y validación por parte del profesional.
361	8- Ibagué Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.		2	2	0	0	100%	21/09/2022 Se recibió planes de mejoramiento, está en proceso de revisión y validación por parte del profesional.
577	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.		5	0	0	0	0%	Allegan de la UTT Planes de Mejoramiento para posible cierre de alertas, se envía a la gestora para lo de su conocimiento y emita concepto 26 de julio de 2022.
577	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.		4	0	0	0	0%	Allegan de la UTT Planes de Mejoramiento para posible cierre de alertas, se envía a la gestora para lo de su conocimiento y emita concepto 26 de julio de 2022.
313	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Se plantearon 2 acciones de mejora para agosto de 2022	4	3	1	0	75%	Allegan Plan de mejoramiento de la UTT, el cual se envía al Gestor encargado de emitir concepto de si subsana o no la alerta, 28 de julio de 2022
245	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión de los recursos del proyecto.		1	0	1	0	0%	Pendiente de que la UTT presente Plan de Mejoramiento 28/10/2022 Allegan plan de mejoramiento
245	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.		1	0	1	0	0%	28/10/2022 Allegan plan de mejoramiento
245	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.		1	0	1	0	0%	28/10/2022 Allegan plan de mejoramiento
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y providencia	Alerta Gestión de otros factores.		5					20/09/2022 Allegan plan de mejoramiento
830	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.		6	0	0	0	0%	04/09/2022 La UTT 5 envía Plan de Mejoramiento

Fuente: elaboración propia

A continuación, se presenta gráficamente el estado de las acciones definidas en los planes mejoramiento reportados a la fecha de corte del presente informe, el 30 de septiembre de 2022.

Gráfica N° 19: Estado de las acciones correctivas de planes de mejoramiento de alertas

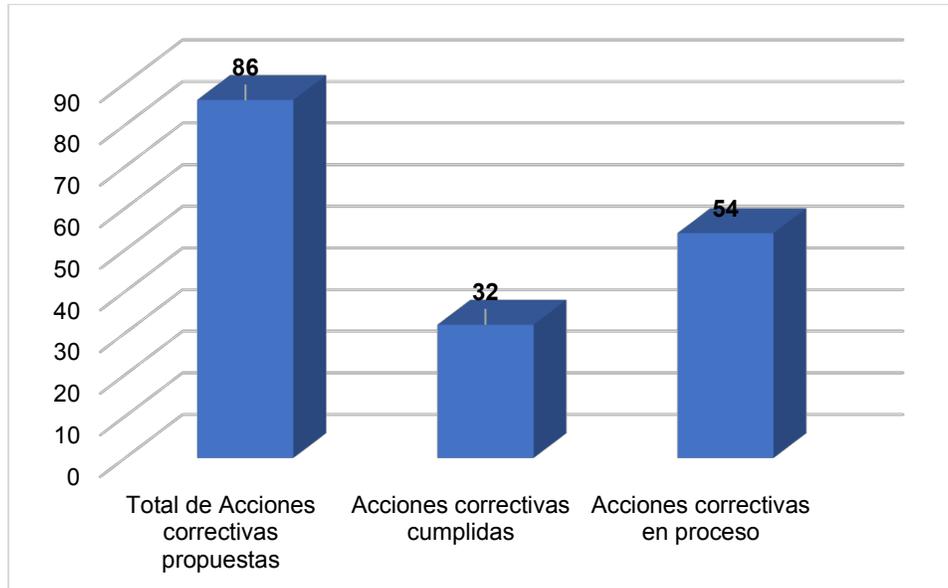

Fuente: elaboración propia

#### 4. Lecciones Aprendidas

De acuerdo con las priorizaciones establecidas para los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, la Dirección de Seguimiento y Control realizó un total de 206 intervenciones distribuidas en 110 monitoreos y 96 visitas en PIDAR a las 13 Unidades Técnicas Territoriales. Para este tercer trimestre se logró identificar un total de 44 lecciones aprendidas

Se presentan con mayor incidencia las lecciones aprendidas en la variable conocimientos tradicionales con el 14 %, por la ausencia de conocimiento técnico evidenciada en las visitas y monitoreos realizadas por la Dirección donde se ve que las comunidades indígenas no presentan detalles de su cultura, costumbres y modelos de producción ajustados a la planeación e implementación de los PIDAR.

En el componente de estructuración se alcanza a identificar que las variables ejecución y seguimiento, seguimiento a la ejecución, especificaciones técnicas y ejecución del proyecto suman el 41% del total de lecciones aprendidas del trimestre; esto como consecuencia de factores como establecer condiciones para el uso de los activos durante y después del Proyecto, también definir muy explícitamente las formaciones técnicas en variables como tiempo, requisitos y recursos.

Temas como distancias entre los predios caracterizados para el desarrollo del seguimiento a la ejecución, estrategias para la implementación del proyecto y la posterior comercialización de los productos se incluyen como lección aprendida debido a que los PIDAR solo se están limitando a la entrega de activos productivos y la formación técnica y termina el acompañamiento sin que

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 111 de 118

sea incluido un capítulo dedicado a temas de comercialización, debido en gran medida a la ausencia de profundización y relevancia en la estructuración de los Proyectos.

Para el componente de Asociatividad sumado a la variable conocimientos tradicionales, se incluyen fortalecimiento organizacional con el 9% del peso porcentual en las lecciones aprendidas como consecuencia de la identificación de ausencia de procesos de fortalecimiento al interior de las Asociaciones en temas administrativos, innovación, inventarios y comercialización.

El componente documental requiere atención desde los niveles de acceso, actualización, seguridad en la información y riesgos en la administración de esta. Con un 7 % de prevalencia en las lecciones aprendidas del tercer trimestre situaciones como la desactualización de la información en las bases tecnológicas, el acceso a información fidedigna en tiempo real y en general los datos del Proyecto son fundamentales para todas las etapas de ejecución de los PIDAR.

Con un 5 % de frecuencias la variable de línea productiva- línea de negocios en la fase de estructuración identificadas en una planeación más explícita a actividades como la formación técnica y los planes de mantenimiento preventivo y correctivo a los activos productivos entregados en la ejecución del Proyecto.

En la variable socialización se identificó que las Asociaciones deben complementar sus actividades con un mayor compromiso al interior de estas y trabajar elementos externamente que fortalezcan sus actividades productivas. También es básica la comunicación en todos los niveles de estructuración e implementación de los proyectos pues ello permite crear sinergia con los responsables.

La articulación interinstitucional forma parte de la ejecución de PIDAR cofinanciados en la Agencia, esto determina factores de éxito en su implementación. Con un 5 % de peso en las lecciones aprendidas, es un factor imprescindible para que todos los niveles puedan interactuar de manera efectiva.

#### 4.1 Total de lecciones aprendidas en el trimestre

Con base en las lecciones aprendidas identificadas, más de un 70% lo conforman las Lecciones Aprendidas identificadas en las categorías de los Procedimientos de estructuración y Asociatividad con una mayor oportunidad de mejora en los PIDAR que cofinancia la Agencia.


Tabla N° 15: Consolidado Lecciones Aprendidas

Vicepresidencia	Procedimiento	Variable	N° repeticiones	
VIP	Estructuración	Ejecución y seguimiento del Proyecto	5	21
		Especificaciones Técnicas	4	
		Documentación del Proyecto	3	
		Línea Productiva- Línea de Negocios	2	
		Socialización	2	
		Gestiones en la Ejecución	1	
		Modelo de desarrollo sostenible	1	
		Necesidades reales	1	
		Producción volúmenes y mercados continuos	1	
		Transferencia tecnológica	1	
VIP-VP	Implementación	Seguimiento a la ejecución	5	9
		Ejecución de los proyectos	4	
	Estructuración y asociatividad	Documentación del Proyecto	1	1
VP	Asociatividad	Conocimientos tradicionales	6	11
		Fortalecimiento organizacional	4	
		Transferencia de conocimiento	1	
	Seguimiento	Articulación institucional	2	2
	<b>Total</b>			<b>44</b>

Fuente: elaboración propia

De igual manera se presentará tabla de resumen de lecciones aprendidas acumulado, con su representación gráfica, con base en la incidencia presentada.

Gráfica N° 20: Lecciones Aprendidas

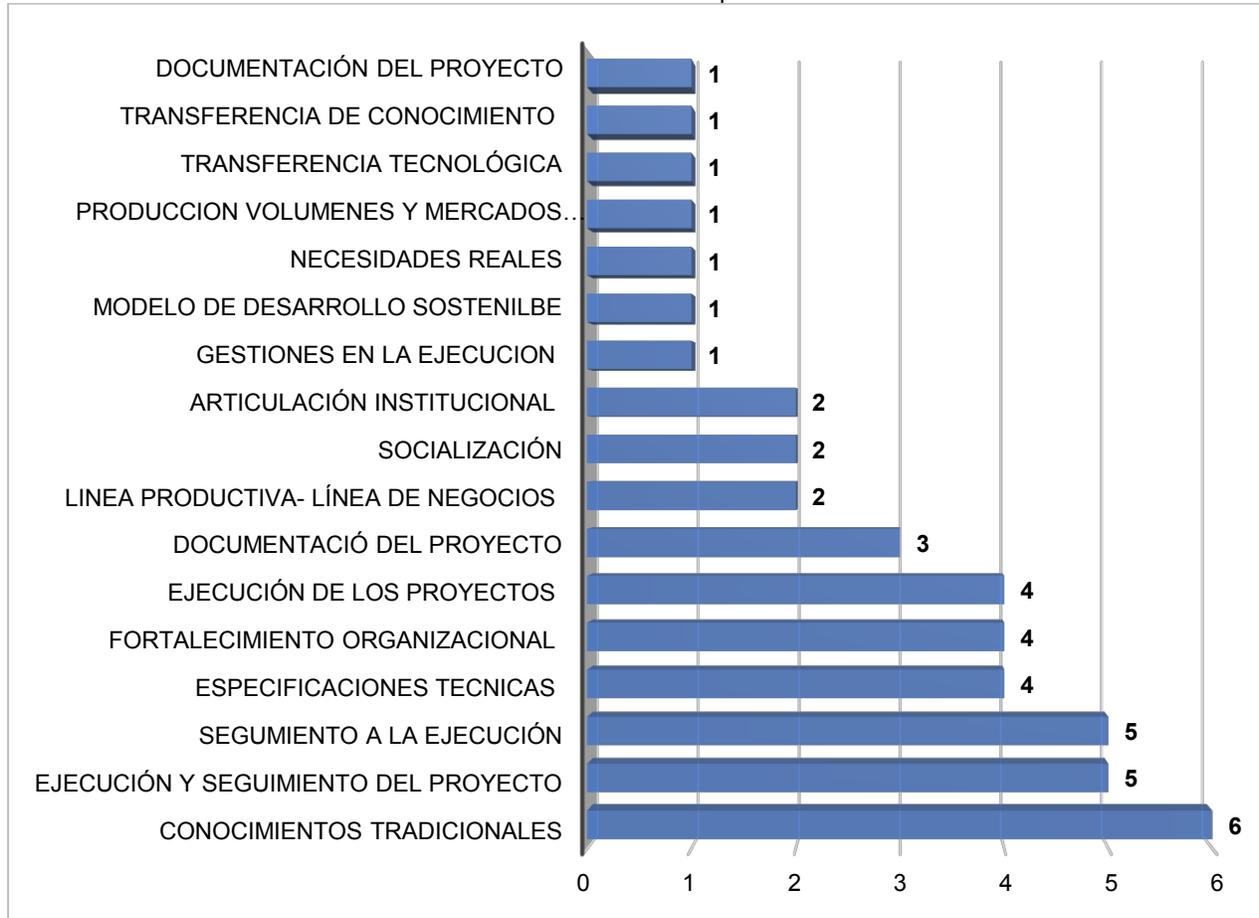

Fuente: elaboración propia

Se concluye que la variable de conocimientos tradicionales es la que presenta mayor frecuencia en el trimestre.

#### 4.2 Lecciones Aprendidas por proyecto

Con base en las lecciones aprendidas identificadas por cada una de las Unidades Técnicas Territoriales, se relaciona una a una dependiendo de la categoría, la variable clasificada y el número de lecciones para cada PIDAR.

Tabla N°16: Listado de Lecciones Aprendidas

UTT	BP	R	Categorización	Procedimiento	No. LA
1	90	359	Estructuración	Línea productiva-línea de negocio	1
1	3217	547	Estructuración	Gestiones en la Ejecución	1
2	3154	315	Estructuración	Línea productiva-línea de negocio	1
2	226	636	Estructuración	Documentación del proyecto	1

2	3156	96	Estructuración	Modelo de Desarrollo Sostenible	1
2	390	724	Estructuración	Especificaciones técnicas	1
2	341	637	Estructuración	Especificaciones técnicas	1
2	2018	997	Estructuración	Ejecución y Seguimiento del proyecto	1
3	2206	834	Implementación	Seguimiento a la Ejecución	1
3	51	117	Asociatividad	Fortalecimiento organizacional	1
3	360	686	Asociatividad	Fortalecimiento organizacional	1
3	2166	795	Estructuración	Ejecución y Seguimiento del proyecto.	1
3	2199	372	Implementación	Seguimiento a la Ejecución	1
3	2206	834	Estructuración	Ejecución y Seguimiento del proyecto	1
3	3218	546	Implementación	Seguimiento a la Ejecución	1
3	3171	568	Implementación	Seguimiento a la Ejecución	1
4	3036	342	Seguimiento	Articulación institucional	1
4	280	464	Implementación	Seguimiento a la Ejecución	1
5	3104	194	Estructuración	Especificaciones técnicas	1
5	740	296	Asociatividad	Conocimientos tradicionales	1
7	152	634	Estructuración	Necesidades Reales	1
7	3138	551	Asociatividad	Fortalecimiento organizacional	1
8	3268	244	Estructuración	Ejecución y Seguimiento del proyecto	1
8	3289	249	Asociatividad	Transferencia de conocimiento	1
8	3261	616	Estructuración	Socialización	1
8	3329	327	Asociatividad	Conocimientos tradicionales	1
9	3119	575	Estructuración	Documentación del proyecto	1
9	171	228	Estructuración y asociatividad	Documentación del proyecto	1
9	8183	346	Estructuración	Documentación del proyecto	1
10	93	496	Asociatividad	Conocimientos tradicionales	1
10	3128	492	Estructuración	Socialización	1
10	3211	472	Asociatividad	Fortalecimiento organizacional	1
11	552	351	Implementación	Ejecución de los proyectos	1
11	3229	476	Asociatividad	Conocimientos tradicionales	1
11	3164	486	Asociatividad	Conocimientos tradicionales	1
11	3165	487	Asociatividad	Conocimientos tradicionales	1
11	799	257	Implementación	Ejecución de los proyectos	1
11	3308	330	Implementación	Ejecución de los proyectos	1
12	29	836	Seguimiento	Articulación interinstitucional	1
12	734	373	Estructuración	Especificaciones técnicas	1
13	3205	188	Implementación	Ejecución de los proyectos	1
13	378	459	Estructuración	Producción, Volúmenes y Mercados continuos	1
13	153	577	Estructuración	Transferencia de Tecnología	1
13	195	877	Estructuración	Ejecución y Seguimiento del proyecto	1

Fuente: elaboración propia

#### 4.3 Descripción ampliada de las lecciones aprendidas

Se relacionan las descripciones de los tipos de variables identificadas como lecciones aprendidas para el presente trimestre:

Tabla N° 17: Descripción de las Lecciones Aprendidas

Ítems	Procedimiento	Variable	Descripción de la Variable
1	Asociatividad	Fortalecimiento organizacional	Todo proyecto deberá contar con asesoramiento y capacitación en los temas de Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Participativo a fin de que como estructuras organizacionales puedan facilitar sus procesos y así mismo desarrollar ejercicios de planificación y emprendimiento rural que repercutan en la calidad de sus productos, la asistencia técnica y sostenibilidad del proyecto.
2	Estructuración	Ejecución y Seguimiento del proyecto.	Todo proyecto debe contar con un plan de actividades y operaciones claves, claras y directas que no permitan dejar ningún componente al azar. Es decir, en la fase de estructuración debe definirse sistemas de entrega, rotación y verificación, con el fin de que todos los beneficiarios de los proyectos no presentes inconformidades y así mismo se vea la transparencia y equidad de los procesos.
3	Seguimiento	Articulación interinstitucional	La ADR debe mejorar su articulación institucional con sus operadores (UNODC) y con sus actores locales a fin de mejorar los procesos y tiempo en que se desarrolla los proyectos.
4	Asociatividad	Conocimientos tradicionales	Respeto de las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas beneficiadas de los proyectos
5	Estructuración	Línea productiva-línea de negocio	Desde la estructuración del proyecto se debe contemplar la integralidad del proyecto (asistencia técnica, comercialización, activos productivos, de enfoque organizacional) en aras de asegurar el éxito del mismo, más aún cuando se plantean proyectos con un enfoque netamente asociativo.
6	Estructuración	Socialización	Es necesario que las organizaciones y/o poblaciones objeto de cofinanciación sean empoderadas y logren obtener mayor conocimiento del proyecto y con ello mayor apropiación del mismo.
7	Estructuración	Documentación del Proyecto versión aprobada	Durante las visitas de la Dirección de Seguimiento y Control se han detectado falencias en las Asociaciones, JAC, Cooperativas, Fundaciones sobre las copias de los soportes del proyecto
9	Implementación	Seguimiento a la Ejecución	Es necesario que exista claridad y cumplimiento sobre los cronogramas de entregas de recursos de los proyectos en aras de facilitar la ejecución y no se presente retrasos, ni se entorpezca la ejecución
10	Estructuración	Modelo de Desarrollo Sostenible	Debe de asegurarse que los proyectos cuenten con los componentes mínimos para su desarrollo y sostenibilidad, dichos factores deben responder a las variables de Comercialización, la Asistencia técnica, Adecuación de tierras, Activos Productivos.
11	Estructuración	Gestiones en la Ejecución	La Agencia debe asegurar desde sus dependencias, contar con la información del proyecto en todas sus fases, en tiempo real en aras de lograr un mejor seguimiento y control a los proyectos, esto se debe dar en el marco del módulo de gestión del VIP.
12	Estructuración	Especificaciones técnicas	Las entregas de activos deben ser claras y concisas, dichas partirán de las especificaciones técnicas detalladas dentro del proyecto mitigando posibles fallas y errores en la ejecución del mismo y cumpliendo de acuerdo a las necesidades de la población objeto.
13	Estructuración	Necesidades Reales	En la fase de estructuración debe asegurarse que lo que se plantee dentro del documento, responda a las necesidades de la población objeto y así mismo se mitigue el riesgo de disponer recursos o elementos que puedan ser subutilizados por la organización, a razón de que ya cuenten con ellos.
14	Implementación	Ejecución de los proyectos	En la estructuración de los proyectos pecuarios deberá contemplarse toda la cadena productiva que permita el cumplimiento de los objetivos del proyecto enmarcados en la regulación normativa de manera que se asegure la inocuidad y calidad del producto, la cadena de frío, garantizando el éxito del proyecto.
15	Estructuración	Transferencia de Tecnología	Las ventajas comparativas de la zona complementadas con el acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias laborales y empresariales en el manejo productivo del cultivo constituyen oportunidad para el incremento de las capacidades productivas y competitivas en el territorio como vía para el Desarrollo Rural.
16	Asociatividad	Transferencia de Conocimiento	La socialización de los proyectos debe involucrar los diferentes actores y asegurar que se lleve a cabo la transferencia de la información con unos procesos estandarizados que garanticen el empoderamiento y faciliten el seguimiento del proyecto.

		<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028		Versión: 1	Página 116 de 118


17	Estructuración	Producción, Volúmenes y Mercados continuos	El manejo cultural del cultivo ofrece la posibilidad de mantener una producción constante, este aspecto debe ser considerado desde la oportunidad para gestionar un mercado permanente para los volúmenes y frecuencias de producción que se presentan en el territorio.
----	----------------	--	--

Fuente: elaboración propia

## 5. Conclusiones

- Actualmente la Dirección de Seguimiento y Control cuenta con 416 proyectos, se encuentran en los siguientes estados: cerrados 186, en ejecución 111, en ejecución esperando cierre 8, socializados 79, notificados 30, suspendidos 2; en 32 departamentos en las 13 Unidades Técnicas Territoriales que comprenden la ADR, de los cuales 124 cuentan con plan de fortalecimiento asociativo; para el tercer trimestre del presente año, la Dirección de Seguimiento y Control, realizó un total de 96 visitas en 26 Departamentos.
- Referente al monitoreo IN HOUSE, la Dirección de Seguimiento y Control realizó en total 110 intervenciones bajo la modalidad de monitoreo IN HOUSE, de los cuales el 73.6% (81 PIDAR), se encuentra en estado de ejecución, el 21% (23 PIDAR), se encuentra en estado de socialización, el 3.6% (4 PIDAR), se encuentran en estado de ejecutado esperando cierre y el 1.8% (2 PIDAR) se encuentra en estado de cerrado. Resultado de estas intervenciones, bajo este mecanismo, se logró contactar a un total de 1080 beneficiarios como acción de control ciudadano.
- Con respecto a la medición de indicadores de los proyectos intervenidos, posterior a la realización de monitoreo IN HOUSE, visitas iniciales, visitas en ejecución y visitas de cierre, se establece que la mayoría de proyectos están en ejecución, seguido de los que se encuentran en estado de cierre, en un alto porcentaje de los proyectos se realizó modificación en el plan de inversión y en los tiempos programados; se realizó una baja medición a de los indicadores de gestión y de producto, con respecto a los indicadores de resultado, medidos para los proyectos con cierre administrativo y financiero, la mayoría de beneficiarios encuestados manifiestan la contribución a mejorar la calidad de vida, satisfacción, mejoramiento de los conocimientos y percepción de acompañamiento por la ADR, siendo este indicador, el de mayor valoración.
- Se puede observar que, de las alertas que continúan abiertas y que fueron identificadas con posterioridad a la fecha de aprobación del Formato Plan de Mejoramiento de alertas FSCP034VF, solamente el 18% cuentan con ese instrumento, lo que dificulta hacer monitoreo al desarrollo y subsanación de estas por parte de la Dirección de Seguimiento y Control, además de ponerse en riesgo el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.
- Es necesario seguir reiterando el diligenciamiento de los planes de mejoramiento faltantes y de las nuevas alertas que se tramiten, sumado esto, es necesario que los actores correspondientes asuman el compromiso de dar cumplimiento al reglamento con respecto al trámite de los planes de mejoramiento en los tiempos estipulados.

- Finalmente, las lecciones aprendidas en el tercer trimestre se orientan en mayor número a la variable de estructuración de los proyectos, lo que acentúa la relevancia de socializar con los responsables estas incidencias para que no se repitan en futuras estructuraciones de PIDAR.

**Elaboró:**

**Leonardo Gómez Fernández**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Componente Seguimiento  
Vicepresidencia de Proyectos



**Soranny Carvajal Rubiano**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Componente Alertas  
Vicepresidencia de Proyectos



**Andrés Felipe Ocampo Zapata**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Componente de Indicadores  
Vicepresidencia de Proyectos



**Andrés Felipe Gutiérrez**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Componente Monitoreo  
Vicepresidencia de Proyectos



**José Antonio Martínez Bohórquez**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Componente Lecciones Aprendidas  
Vicepresidencia de Proyectos

	<b>INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 118 de 118

**Revisó:**



**Sandra Patricia Ramirez Cabanzo**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Vicepresidencia de Proyectos



**Karol Tautiva Roza**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Vicepresidencia de Proyectos

**Aprobó:**



**Julián Osorno Cardona**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Vicepresidencia de Proyectos

